

復興の現状

平成26年5月30日



復興庁

Reconstruction Agency

目次



復興庁

Reconstruction Agency

1 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し

<避難者支援関係>

2 避難者・仮設住宅の状況

<まちづくり関係>

3 災害廃棄物(がれき)処理の状況と課題

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況

5 鉄道の復旧状況

6 住宅再建及び高台移転に向けた取組

7 住まいの復興の見通し

<産業関連>

8 産業の復旧・復興の状況

9 復興特区制度の活用状況

<原子力災害関係>

10 福島県の状況

11 避難指示区域の見直し

12 除染の進捗状況

<人的支援>


13 被災自治体の職員確保等に向けた支援の状況

1 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し①



復興庁

Reconstruction Agency

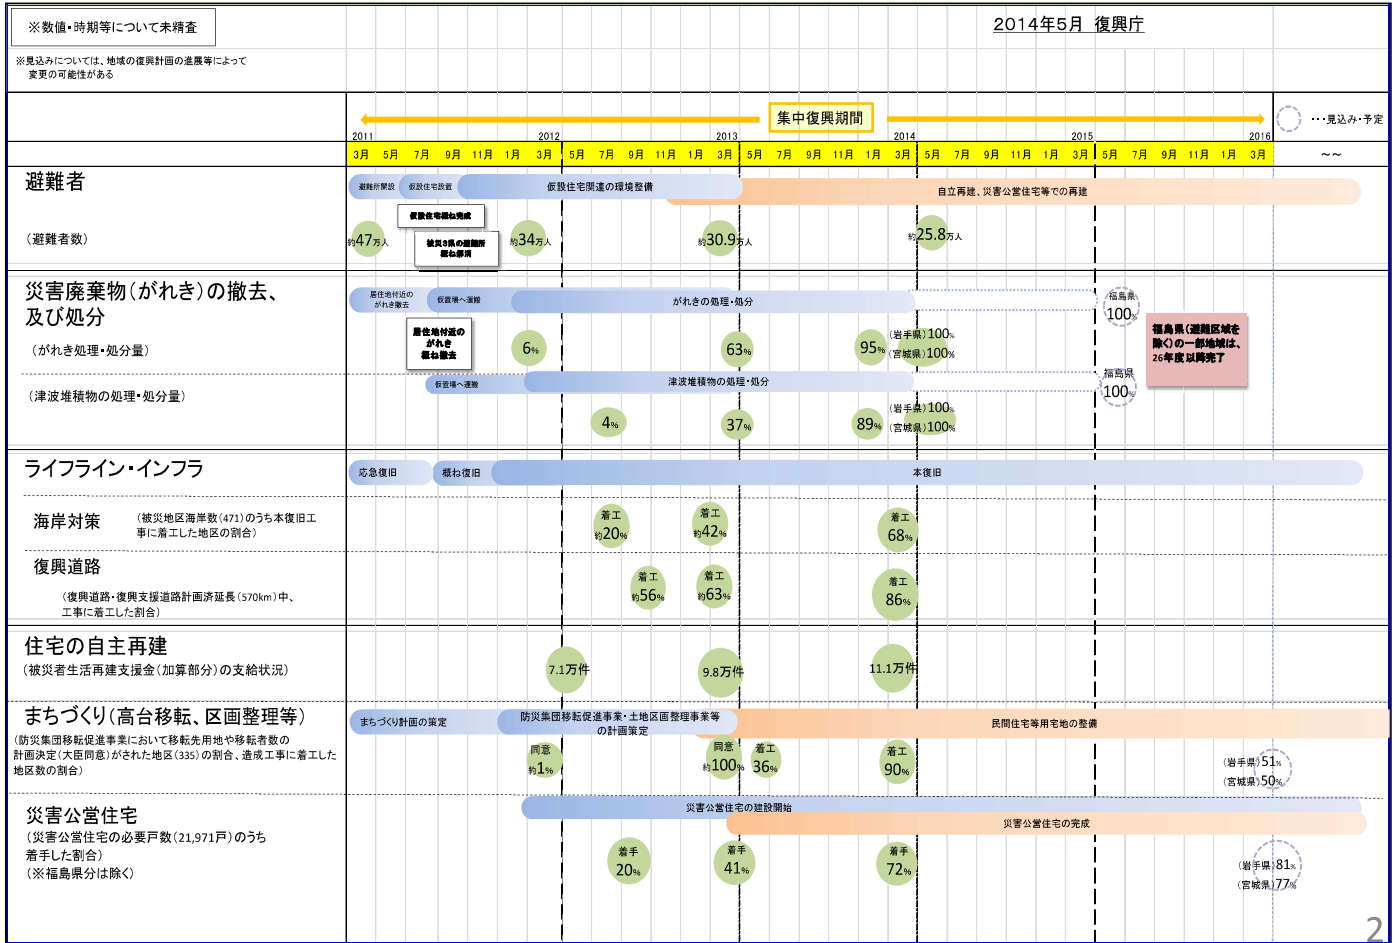


1 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し②



復興庁

Reconstruction Agency

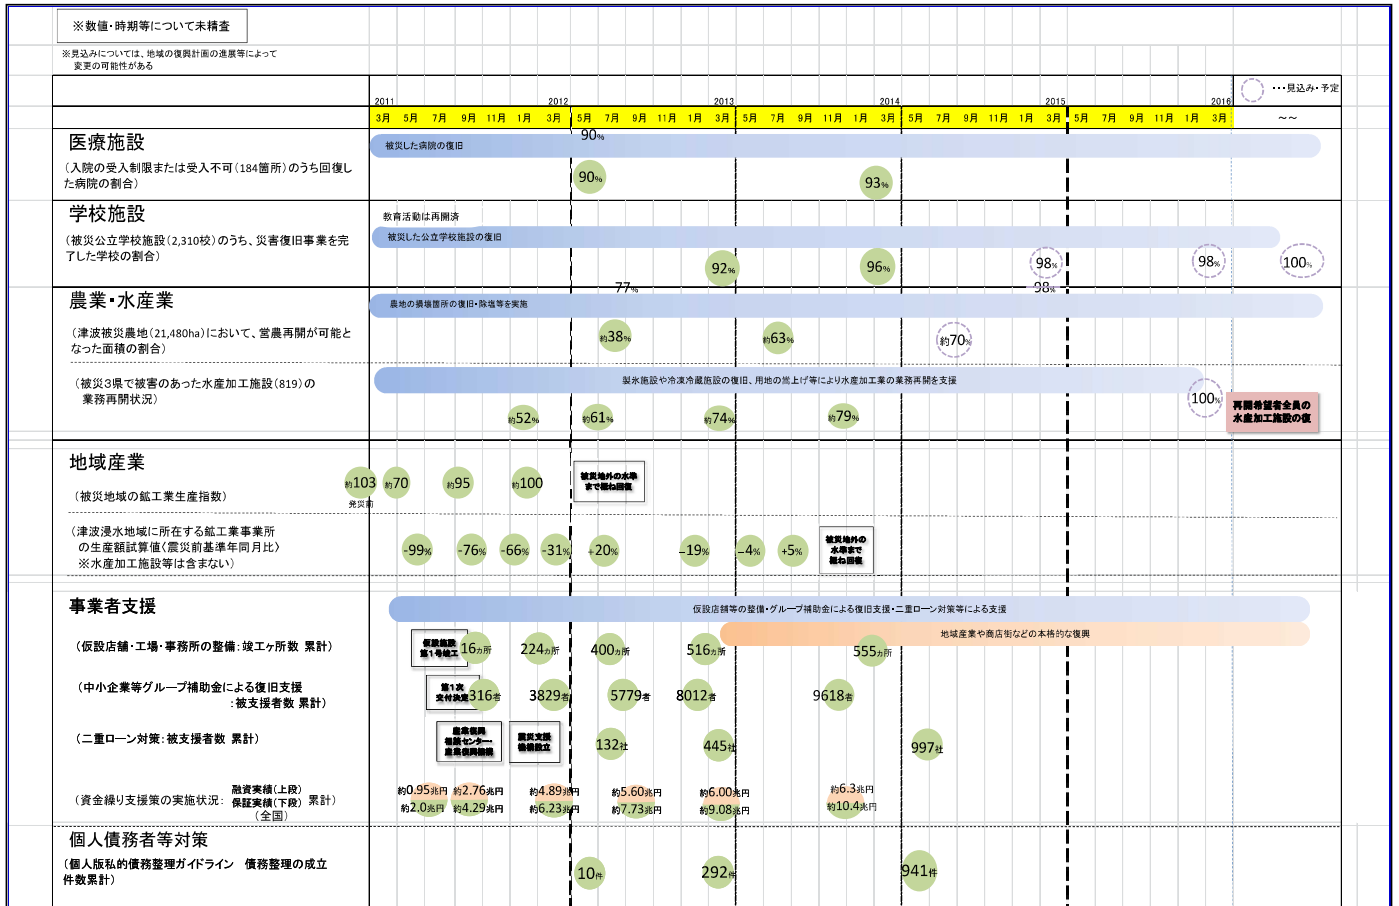


2 避難者・仮設住宅の状況

- 避難者数は1年で、約30万4千人から、約25万8千人に減少。
- 仮設住宅等への入居戸数は減少しはじめており、住まいの再建への動きが進みつつある。

(1) 避難者等の減少

発災3日目 約47万人 (*1)		
全体	避難所にいる者	住宅等にいる者
平成25年5月 (*2)		
303,571人	123人	288,264人
平成26年5月 (*2)		
258,219人	0人	241,288人

*1 緊急災害対策本部 青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木の避難者の合計。
*2 復興庁調べ 全国の避難所(公民館・学校等)、旅館・ホテル、その他(親族・知人宅等)、住宅等(公営・仮設・民間・病院含む)にいる者の合計。

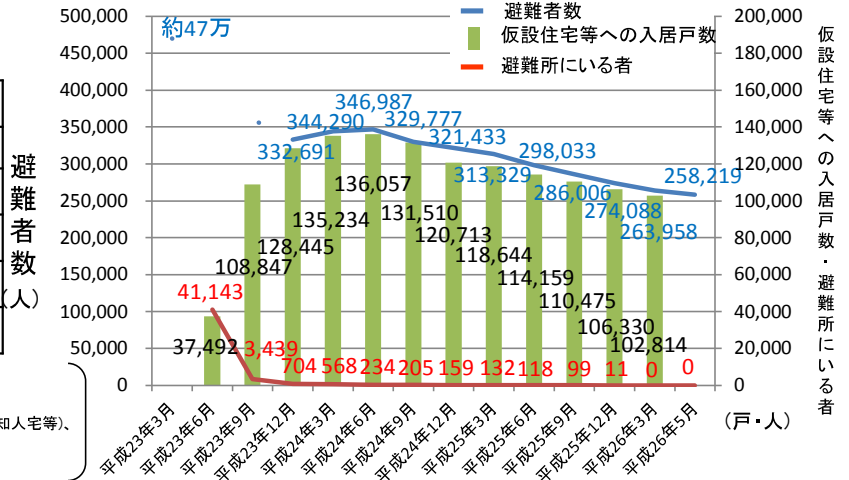

(2) 仮設住宅等への入居状況

〔内閣府調べ〕

25年3月	入居者数	入居戸数	26年3月	入居者数	入居戸数	備考
公営住宅等	29,278人	10,573戸	公営住宅等	23,551人	8,740戸	全国計
民間住宅	151,921人	59,943戸	民間住宅	120,657人	49,863戸	全国計
仮設住宅	111,159人	48,128戸	仮設住宅	97,113人	44,211戸	岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・千葉県・長野県

4



(参考) 被災3県における人口の状況

- 被災3県における人口は、減少傾向にあるもののその度合いは鈍化しており、社会増減率は、沿岸市町村※においても震災前の水準に戻りつつある。

※沿岸市町村…海岸線を有する市町村(岩手県12市町村、宮城県15市町、福島県10市町)



(1) 人口推移 (被災3県の沿岸市町村)

沿岸市町村の人口推移は、減少傾向にあるものの、2012年4月以降、減少の度合いが鈍化している。

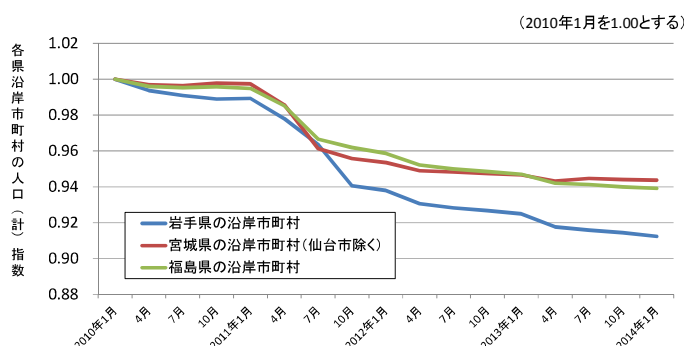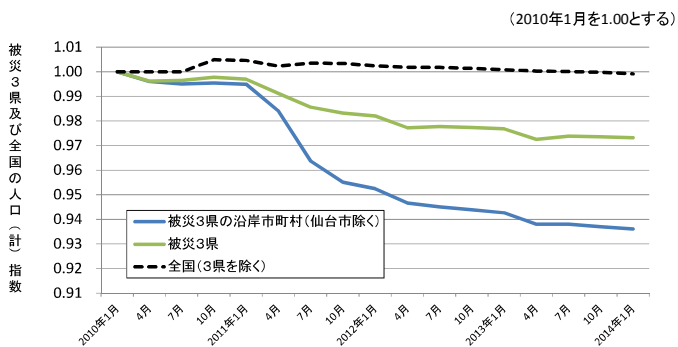

(2) 社会増減率 (被災3県の沿岸市町村)

人口の社会増減率は、被災3県の沿岸市町村及び福島県内陸市町村においても2010年同月の水準に戻りつつある。

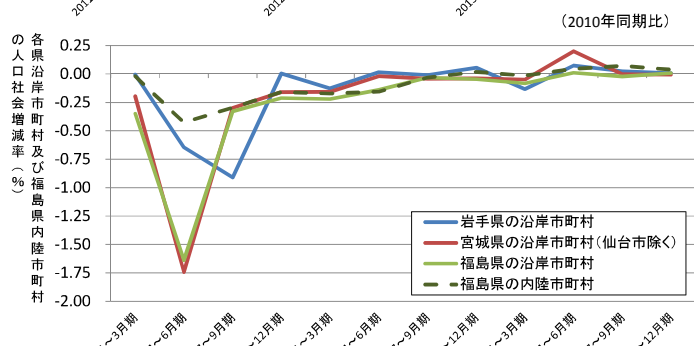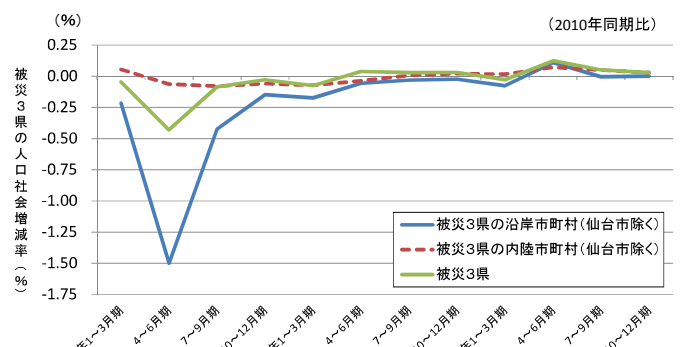

※ 各県公表資料を元に復興庁作成 ・岩手県毎月人口推計 ・宮城県推計人口(月報) ・福島県の推計人口(福島県現住人口調査結果)

※推計人口とは、国勢調査による人口を基礎として、出生・死亡・転入・転出等の届出数を加減して算出した値

3 災害廃棄物（がれき）処理の状況と課題

- 東日本の太平洋沿岸部を中心に13道県で災害廃棄物約2千万トン、津波堆積物約1千万トンが発生。
- 平成26年3月末までに、福島県の一部地域を除き、災害廃棄物及び津波堆積物の処理が完了。
- 災害廃棄物の8割強、津波堆積物のほぼ全量を再生利用。

(1) 災害廃棄物処理の状況（岩手県、宮城県、福島県※の沿岸32市町村）

平成26年3月末現在	推計量 (A)	撤去済み量 (B)	撤去率(B/A)	処理・処分量 (C)	処理・処分割合 (C/A)
災害廃棄物	1,707万t	1,686万t	99%	1,662万t	97%
津波堆積物	1,095万t	1,055万t	96%	1,004万t	92%

処理割合	市町村等
完了	洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼ブロック(気仙沼市、南三陸町)、石巻ブロック(女川町、石巻市、東松島市)、利府町、松島町、宮城東部ブロック(塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市)、仙台市、亶理名取ブロック(名取市、岩沼市、亶理町、山元町分)
9割以上	新地町、相馬市、いわき市
5割以上	広野町
4割未満	南相馬市

※福島県の避難区域を除く

(2) 被災地での取組


- ・ 3県に34基の仮設焼却炉と24箇所の破碎・選別施設を設置。
- ・ 福島県内の仮設焼却炉1基、破碎・選別施設2箇所以外は処理が完了。
- ・ 災害廃棄物の約82%、津波堆積物のほぼ全量を再生利用。
- ・ このうち、公共事業等（堤防復旧、海岸防災林、港湾整備等）において、約1,339万トンを利用。

(3) 広域処理（岩手県・宮城県）

- ・ 1都1府16県で約62万トンを広域処理。
- ・ 可燃物・木くずの約1割、不燃混合物や漁具・漁網の約5割の処理に貢献。

(4) 取組の現状

- ・ 岩手県・宮城県では、災害廃棄物・津波堆積物とも、平成26年3月末までに処理が完了。
- ・ 福島県（避難区域を除く）では、仮置場への搬入は概ね完了。処理が完了していない地域については、国の代行処理を進めるとともに、市町と連携してできるだけ早期の処理完了を目指す。

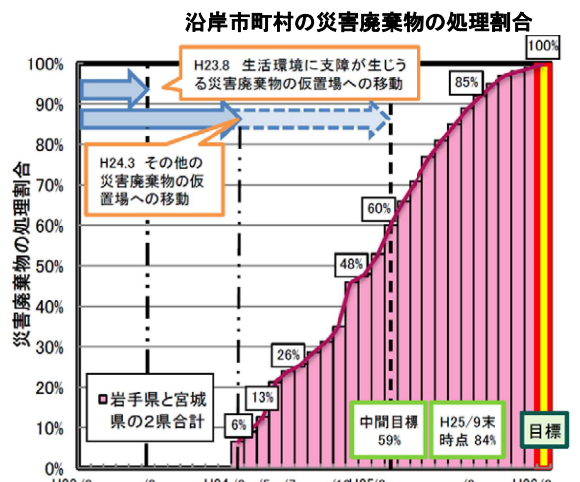

岩手県・宮城県沿岸市町村の災害廃棄物の処理目標と実績 6

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況①

項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 / 被害の状況	項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 / 被害の状況
完了 着工 海岸対策 本復旧工事を着工・完了した地区海岸の割合 ※太字: H26. 3末時点 細字: H24. 12末時点	68% (着工) 18% (完了)	本復旧工事に着工した地区海岸数 318地区 本復旧工事が完了した地区海岸数 86地区 被災した地区海岸数 471地区 ※国施工区間(代行区間含む)約41kmのうち、復興・復旧を支える上で不可欠な仙台空港及び下水処理場の前面の区間等約26kmについては、施工を完了している。	完了 水道施設 本格復旧が完了した水道事業数の割合 ※太字: H26. 3末時点 細字: H24. 12末時点	91%	本格復旧事業のための災害査定の対象工事がすべて完了した水道事業数 167事業 災害査定を実施した、あるいは実施を予定している水道事業数 184事業
完了 着工 海岸防災林の再生 復旧工事に着手・完了した海岸防災林の割合 ※太字: H26. 3末時点 細字: H24. 11末時点	66% (着手) 16% (完了)	海岸防災林の復旧事業の工事着手延長 約92km 海岸防災林の復旧事業の工事完了延長 約23km 海岸防災林の被災延長(青森県～千葉県) 約140km※ ※避難指示区域を含む	完了 下水道 通常処理に移行した下水処理場※の割合 ※「通常処理に移行した処理場」とは、被災前と同程度の放流水質まで処理が実施可能となった処理場である。これらの中には、一部の水処理施設や汚泥処理施設は未だ本復旧工事中のものもある。 ※太字: H26. 3末時点 細字: H24. 11末時点	99%	通常処理に移行した処理場数 72箇所 災害査定を実施した処理場数 73箇所
完了 河川対策 本復旧工事が完了した河川堤防(直轄管理区間)の割合 ※太字: H26. 3末時点 細字: H24. 11末時点	99%	本復旧工事が完了した箇所数 2,113箇所 被災した河川管理施設の箇所数 2,115箇所	完了 災害廃棄物の処理 災害廃棄物の処理が完了した割合 ※太字: H26. 3末時点 細字: H24. 11末時点 (一部H24. 9末時点)	97%	国の事業計画及び工程表の対象市町村における災害廃棄物処理量計 1,714万t※ 国の事業計画及び工程表の対象市町村における災害廃棄物推計量 1,759万t※ ※市街地復興パターン検討調査を実施した43市町村分に限る。

注)①福島県の避難指示区域については、原則除いている。②各指標の母数については、事業の進捗に応じて変更されているものもあります。

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況②


項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 着工 復興住宅 (災害公営住宅の整備に着手した割合) ※太字:H26.3末時点 細字:H24.11末時点	72% (用地確保済み) 27% 10%(完了) 0% 50% 100%	用地確保済み戸数 15,782戸 災害公営住宅の整備が完了した戸数 2,241戸 各県が公表している必要災害公営住宅の戸数※ 21,858戸 ※全体計画未定のため福島県分はいずれも除外	完了 着工 復興まちづくり (漁業集落防災強化) 漁業集落防災機能強化事業の実施地区数の割合 ※太字:H26.3末時点 細字:H24.11末時点	100% (事業費措置) 85% 51%(着工) 6% 27%(完了) 0% 50% 100%	復興交付金の事業費措置地区数 37地区 造成工事に着手した地区数 19地区 造成工事が完了した地区数 10地区 当事業により住宅用地の整備を行う地区数 37地区
完了 着工 復興まちづくり (防災集団移転) (事業計画の同意地区数、造成工事の着手地区数、造成工事の完了地区数の割合) ※太字:H26.3末時点 細字:H24.12末時点	100%(同意) 81% 90%(着工) 12% 15%(完了) 0% 50% 100%	事業計画について国土交通大臣の同意を得た地区数 339地区 造成工事に着手した地区数 304地区 造成工事が完了した地区数 50地区 住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う地区数(337地区)+茨城県(2地区)	完了 復興まちづくり (医療施設) (入院の受入制限等から回復した病院の割合) ※太字:H26.3末時点 細字:H24.11末時点	93% 90% 0% 50% 100%	入院の受入制限又は受入不可から回復した病院数 171箇所 被災直後に入院の受入制限又は受入不可を行った病院数 184箇所
完了 着工 復興まちづくり (土地区画整理) (事業化の段階に達している地区数、造成工事の着手地区数、造成工事の完了地区数の割合) ※太字:H26.3末時点 細字:H24.12末時点	100%(事業化) 27% 73%(着工) 12% 0%(完了) 0% 50% 100%	事業化の段階に達している地区数※ 51地区 造成工事に着手した地区数 37地区 造成工事が完了した地区数 0地区 ※事業認可済、事業認可手続き中、緊急防災空地整備事業着手済の地区を計上 住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う地区数 51地区	完了 復興まちづくり (学校施設等) (復旧が完了した公立学校施設の割合) ※太字:H26.3末時点 細字:H24.11末時点	96% 81% 0% 50% 100%	復旧事業が完了した学校数 2,210校 公立学校施設災害復旧事業に申請した若しくは申請予定の学校数 2,308校 (応急仮設校舎や間借り等により、全ての学校で教育活動は再開済み)

注)①福島県の避難指示区域については、原則除いている。②各指標の母数については、事業の進捗に応じて変更されているものもあります。③漁業集落防災機能強化事業については、上記以外に住宅用地の整備は行わず水産関係用地や公共施設の整備を行う地区が予定されている。④防災集団移転促進事業における造成工事の完了地区数の割合は、災害公営住宅のみを整備する地区を除いた地区数(328地区)のうち、造成が完了した地区の割合。

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況③

項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 着工 交通網 (復興道路・復興支援道路) (復興道路・復興支援道路の着手率、復興道路・復興支援道路の整備率) ※太字:H26.3末時点 細字:H24.11末時点	86%(着手) 58% 39%(完了) 35% 0% 50% 100%	工事着手済延長※ 489km 供用済延長 223km 計画済延長(事業中+供用済) 570 km ※工事着手したIC間延長	完了 農地 (津波被災農地面積に対する営農再開可能面積の割合) ※太字:H26.1末時点 細字:H24.12末時点	63% 38% 0% 50% 100%	営農再開が可能な農地面積約13,470 ha 津波被災農地面積(青森県~千葉県) 21,480 ha※ ※避難指示区域を含む
完了 交通網 (鉄道) (運行を再開した鉄道路線延長の割合) ※太字:H26.4.6末時点 細字:H24.12末時点	90% 88% 0% 50% 100%	下のうち鉄道運行を再開した路線の延長 2,105.2 km 岩手、宮城、福島県内の旅客鉄道のうち被災した路線の総延長 2,330.1 km	完了 漁港 (陸揚げ岸壁の機能が全て回復した漁港の割合) ※太字:H26.3末時点 細字:H24.11末時点	54% 36% 0% 50% 100%	陸揚げ岸壁の機能が全て回復した漁港数 172 漁港 被災した漁港数 319 漁港※ ※避難指示区域を含む
完了 着工 交通網 (港湾) (本格復旧に着手した復旧工程計画に定められた港湾施設の割合) ※太字:H26.3末時点 細字:H24.12末時点	100%(着工) 96% 92%(完了) 44% 0% 50% 100%	本格復旧工事に着手した箇所数 131箇所 本格復旧工事完了箇所数 120箇所 被災した港湾のうち、復旧工程計画に定められた港湾施設の箇所数 131 箇所	完了 養殖施設 (養殖施設の復旧の割合) ※太字:H25.12末時点 細字:H24.12末時点	82% 77% 0% 50% 100%	復旧した養殖施設数(岩手・宮城) 62,851 施設 養殖業再開希望者の施設数(岩手・宮城) 76,193 施設

注)①福島県の避難指示区域については、原則除いている。②各指標の母数については、事業の進捗に応じて変更されているものもあります。

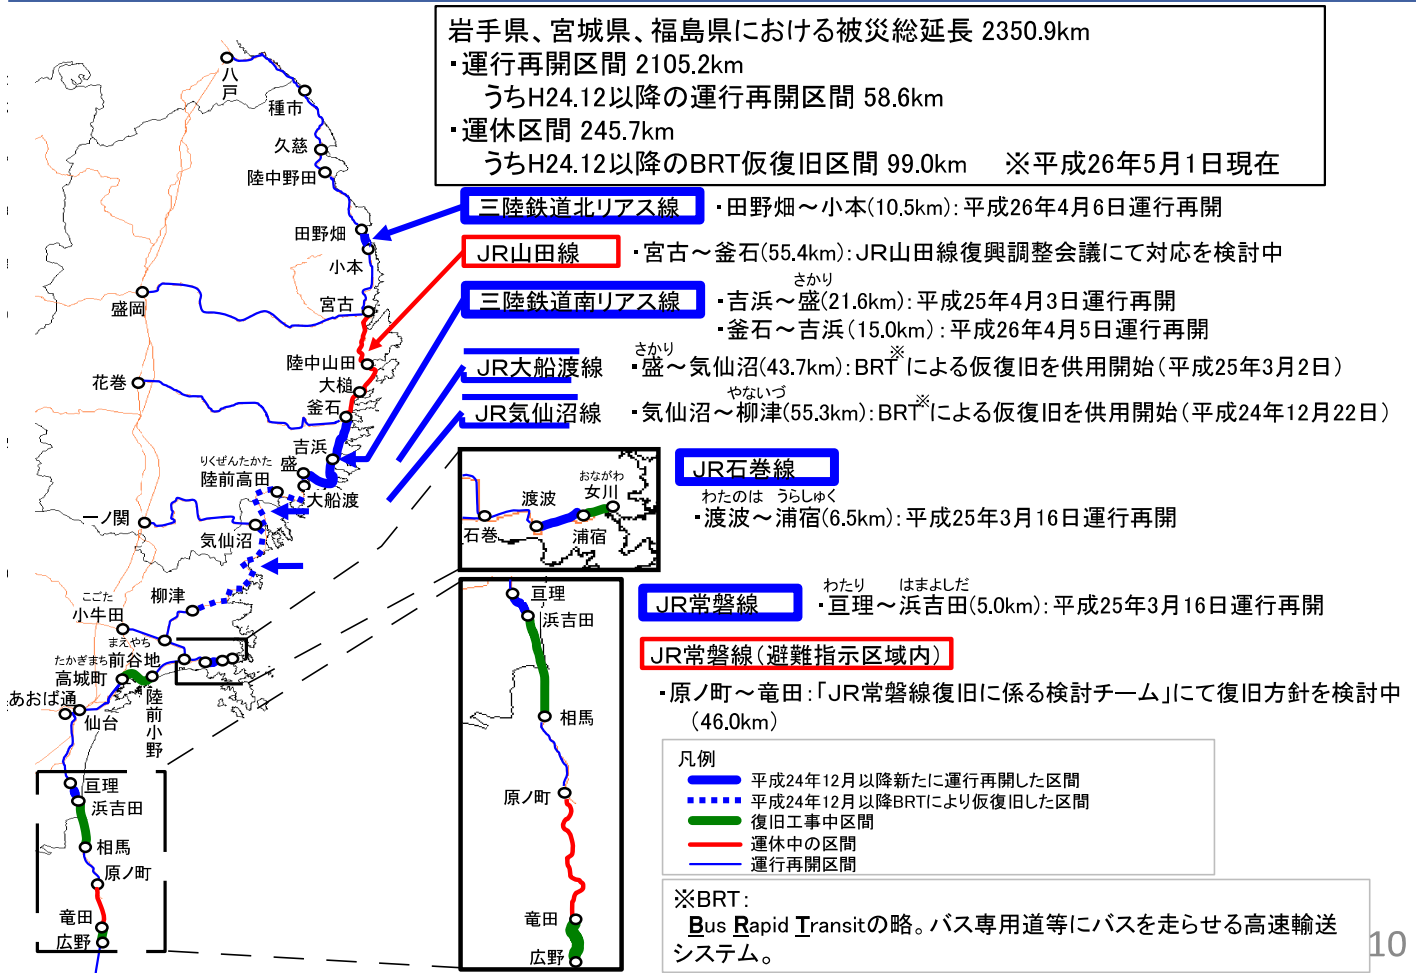

6 住宅再建及び高台移転に向けた取組

- 住宅再建や復興まちづくりに当たっては、スピードアップを図るため、市町村における地域住民との調整や事業実施を円滑に進めていくことが最大の課題であり、国としても、復興交付金による支援、まちづくりの専門職員の派遣の促進、円滑な施工確保の支援等を実施。
- 住民の定着を促進する住宅再建支援のため、震災復興特別交付税を増額(平成24年度補正:1,047億円)。


復興まちづくりの進捗状況(平成26年3月末時点)

- ・防災集団移転促進事業について、事業着手の法定手続きである大臣同意が済んだ地区数は339地区。(平成24年12月末時点273地区)
- ・土地区画整理事業について、事業化の段階に達している地区数は51地区。(平成24年12月末時点14地区)
- ・工事に着手した地区数は防災集団移転促進事業で304地区(平成24年12月末時点40地区)、土地区画整理事業で37地区(平成24年12月末時点6地区)、災害公営住宅整備事業で9,081戸(平成24年12月末時点1,743戸)。
- ・防災集団移転促進事業実施25市町村(被災3県)の用地取得率は、49%(平成25年9月末)から76%(平成26年3月末)に上昇。

	防災集団移転促進事業 ^{注1)}	土地区画整理事業	災害公営住宅整備事業
想定	339地区	51地区	(2万戸以上) ^{注2)}
法定手続き済等	339地区 (大臣同意)	51地区 ^{注3)}	
工事着手	304地区	37地区	9,081戸 [19,055戸 ^{注4)}]

注1) 住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う地区数(337地区)+茨城県(2地区)
 注2) 主な内訳は、岩手県約6千戸、宮城県約1万5千戸、(福島県は未定)
 注3) 事業認可済、事業認可手続き中、緊急防災空地整備事業着手済み地区数
 注4) 用地確保した戸数

【例】防災集団移転促進事業の進捗状況(工事着手地区数)

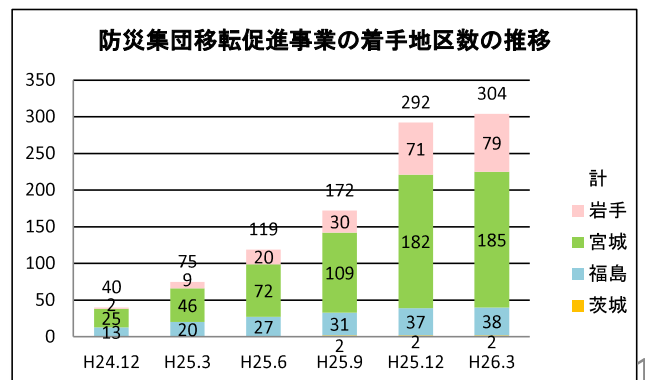

【住まいの復興の見通し(平成26年3月末時点)】

①災害公営住宅の整備に係る進捗見込み(戸数)

	26年度まで 累計	27年度まで 累計
岩手県 (進捗率)	概ね2,000戸 (概ね3割)	概ね4,800戸 (概ね8割)
宮城県 (進捗率)	概ね6,800戸 (概ね4割)	概ね11,800戸 (概ね8割)注)
福島県	概ね2,300戸 ・うち津波・地震向け: 概ね1,600戸 ・うち原発避難者向け: 概ね700戸	概ね3,600戸 ・うち津波・地震向け: 概ね2,500戸 ・うち原発避難者向け: 概ね1,100戸

②民間住宅等用地の整備に係る進捗見込み(宅地数)

	27年度まで 累計	28年度以降も 含めた累計
	概ね4,200戸 (概ね5割)	概ね8,300戸 (10割)
	概ね5,800戸 (5割)	概ね11,600戸 (10割)
	概ね1,000戸	概ね2,200戸

注)宮城県の全体計画戸数(概ね15,500戸)のうち、概ね3,600戸については、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期を調整中である。

※福島県については、原子力災害により面整備事業の計画が未着手・未策定の旧警戒区域の市町村があり、現時点ではこれらを除いて、計画の同意・認可を得た地区の戸数を掲載している。


※福島県における原発避難者向け災害公営住宅の整備戸数は、全体で概ね4,900戸を予定(平成25年12月時点)。

8 産業の復旧・復興の状況①


- グループ補助金交付先アンケートでは、現在の売上げ状況が震災直前の水準以上まで回復していると回答した企業の割合は、36.6%。
- 業種別に見ると、震災直前水準以上に売上げが回復しているという割合が最も高いのは建設業(66.0%)、次いで運送業(42.3%)。最も低いのは、水産・食品加工業(14.0%)、次いで卸小売・サービス業(30.6%)
- 平成25年度(1~12月期)の被災3県の工場立地件数は、前年度より23件増(+25%)の116件。

グループ補助金交付先アンケート調査

上から順にH24年2月、H24年9月、H25年6月の調査結果

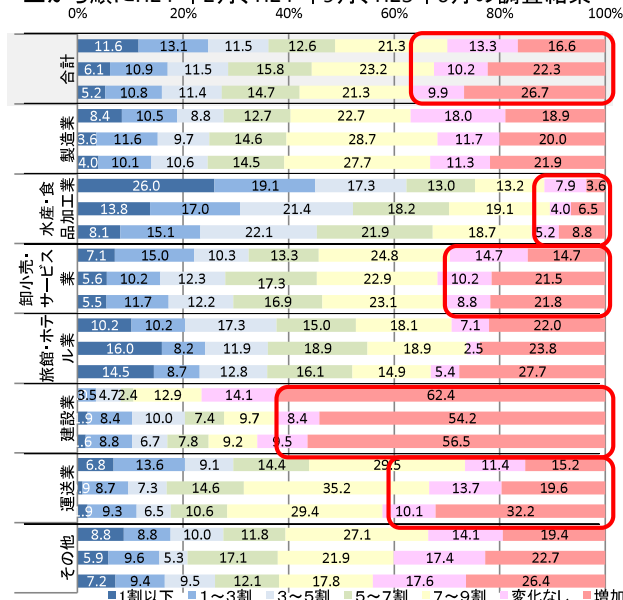

3県の工場立地件数の推移

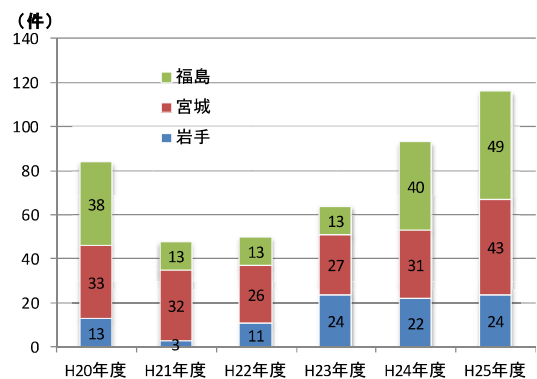

	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
岩手	13	3	11	24	22	24
宮城	33	32	26	27	31	43
福島	38	13	13	13	40	49
合計	84	48	50	64	93	116
前年比	90%	57%	104%	128%	145%	125%

(資料: 経済産業省 工場立地動向調査)

8 産業の復旧・復興の状況②

○ 津波被災農地の営農再開に向けて農地復旧や除塩等を進めており、農地復旧と一体的に農地の大区画化や利用集積を進めるなど、全国のモデルとなるような取組を推進。

① 農林水産業における農地の復旧状況


- 6県(青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉)の津波被災農地21,480haのうち、13,470haで営農再開が可能となった。
- 平成26年度作付期までには、約7割の農地で営農再開が可能になる見込み。

② 農地の大区画化の状況

○ 岩手県、宮城県、福島県においては、復興交付金等を活用し、面的な集積による経営規模拡大や土地利用の整序化を図る農地の大区画化等を約9,700haで実施中。

農地の大区画化等の 県別取り組み状況 (ha)	
岩手県	170
宮城県	7,760
福島県	1,750
計	9,680

※法手続き中の地区も含む。(平成25年12月末現在)

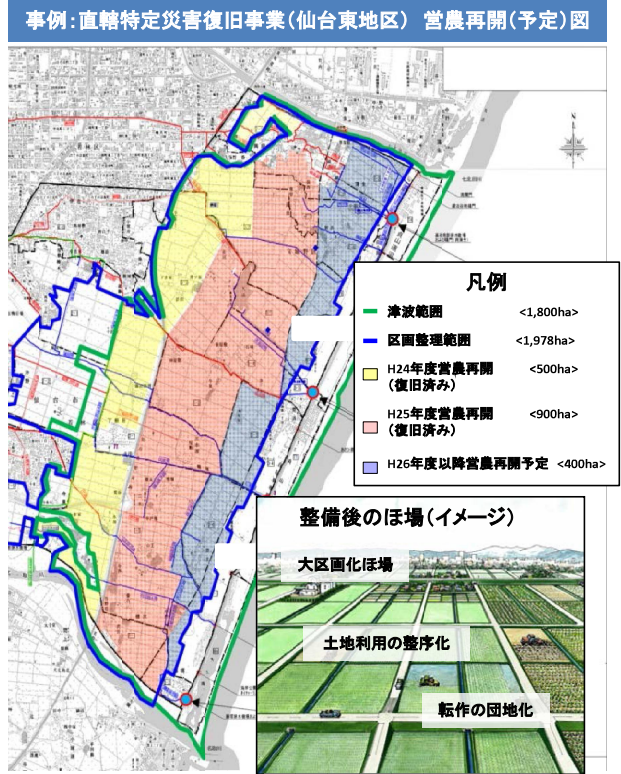


14


8 産業の復旧・復興の状況③

- 被災した漁港の約5割で陸揚げ岸壁の機能が全て回復しており、約9割で陸揚げが可能。また、水揚げ量は約7割まで回復するなど、一定程度復旧。
- 一方で、水産加工施設は約8割で業務再開しているものの、震災により失われた販路確保等の問題もあり、岩手県、宮城県、福島県の3県全体では、震災直前水準以上に売上げが回復した水産加工業者は8%、売上が8割以上回復した水産加工業者は28%であり、売上の回復が遅れている。
- 引き続き、漁港の本格復旧を実施するとともに高度衛生管理に対応した荷捌き所の整備や水産加工施設の再建、新商品の開発、販路・販売の回復等の取組を一体的に推進。

水産業

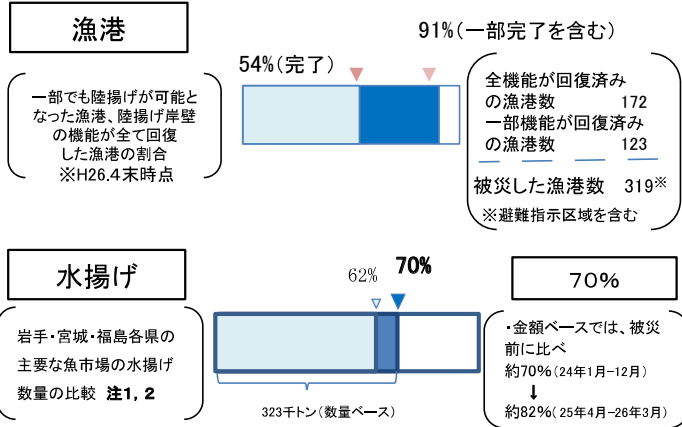

注1: 久慈(岩手)、宮古(岩手)、釜石(岩手)、大船渡(岩手)、気仙沼(宮城)、女川(宮城)、石巻(宮城)、塩釜(宮城)、小名浜(福島)における1年間(太字:25年4月~26年3月 細字:24年1月~12月)の合計の水揚げ数量の被災前1年間(22年3月~23年2月)の合計に対する比率を示したものの。
注2: 小名浜での水揚げは全て県外で漁獲されたもの。

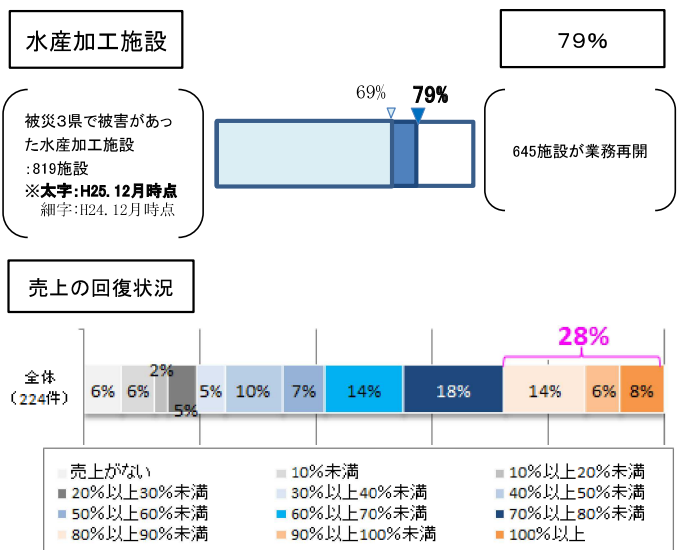

資料: 平成26年4月 水産庁・全国水産加工業協同組合連合会「水産加工業者における東日本大震災からの復興状況アンケート」

15


8 産業の復旧・復興の状況④

○ 観光業も改善が見られるが、本格的な復興が今後の課題。

観光業 ■ 観光客中心の宿泊施設の延べ宿泊者数(同月比の推移)

観光客中心の宿泊施設は、平成25年においても平成22年値との比較において、全国・東北6県・東北3県いずれもマイナスとなっている。

(%は平成22年値との比較)

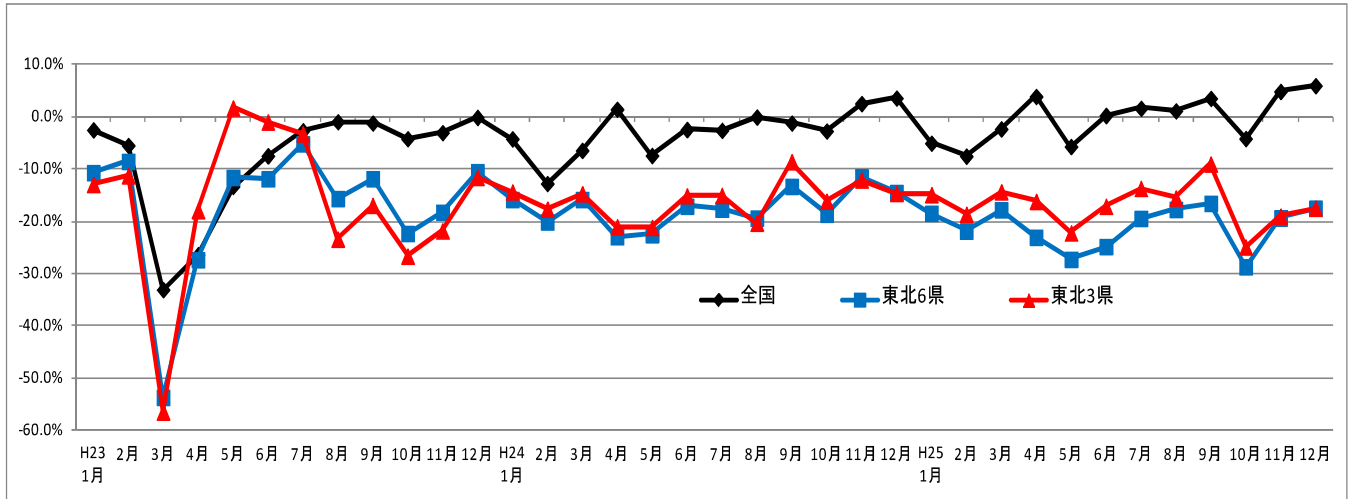

※【観光客中心の宿泊施設】とは、宿泊者のうち観光目的の宿泊者が全体の50%以上と回答した施設。

【参考】
なお、ビジネス客中心の宿泊施設(宿泊者のうち観光目的の宿泊者が全体の50%未満であると回答した施設)においては、震災直後から東北6県・東北3県でいずれも平成22年値との比較ではプラスで推移している。


注:平成22年4-6月期調査より従業者数9人以下を含む全宿泊施設に調査対象を拡充している。
(H23.1-3月、H24.1-3月、H25.1-3月の平成22年値との比較は従業者数10人以上の宿泊施設の数値のみで作成。H25.1-3月は暫定値。)

出典:宿泊旅行統計調査

16

8 産業の復旧・復興の状況⑤

- 被災企業の復興に向けた進捗状況は地域格差が顕著に。
- 「事業所数」及び「従業者数」が半減以下のままの自治体も存在。

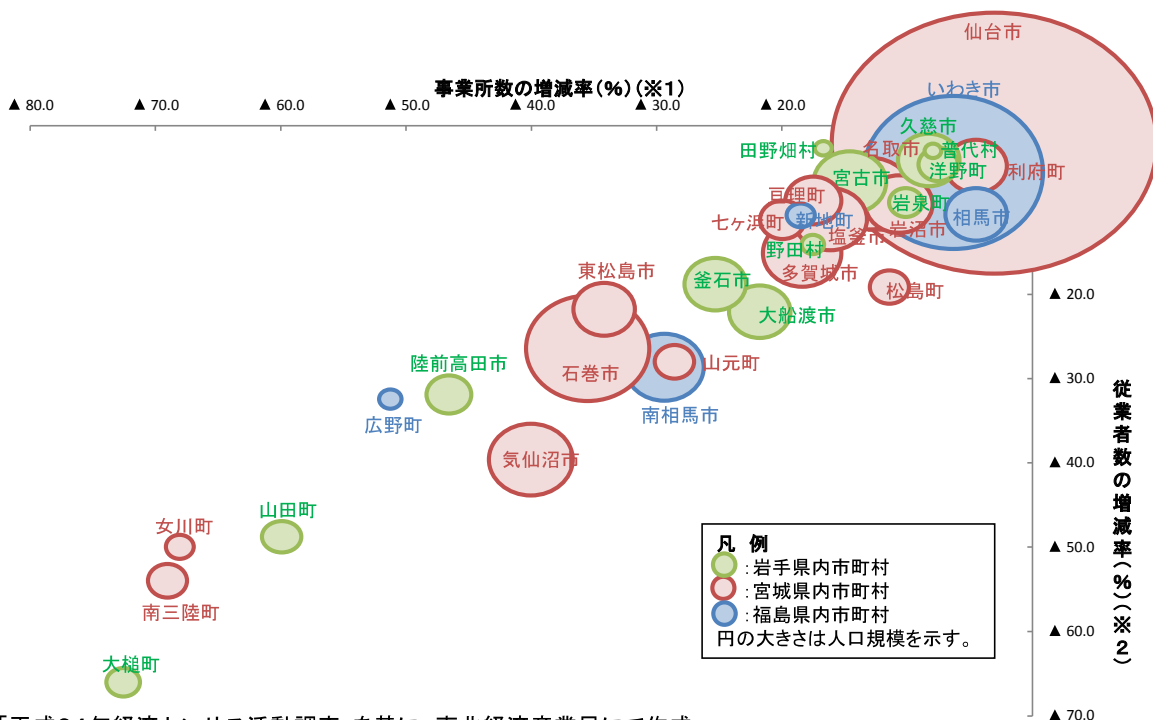

(作成)「平成24年経済センサス活動調査」を基に、東北経済産業局にて作成

(※1)横軸:各地域に所在する事業所数の増減率(平成24年時点の事業所数/平成21年時点の事業所数)

(※2)縦軸:各地域に所在する企業の従業者数の増減率(平成24年時点の従業者数/平成21年時点の従業者数)

なお、福島県南相馬市(一部)、檜葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町は上記調査の対象外。

17



税制上の特例の適用を受けることができる指定事業者（被災5県）による投資見込額は約1兆2,000億円、雇用予定数は約87,700人。

また、指定事業者等の数（被災5県）は、対前年比プラス780。

	青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	合計
投資見込額(億円)	393	1,008	3,317	2,619	4,656	11,993
雇用予定数(人)	4,680	5,650	23,850	28,250	25,270	87,700

(注)投資見込額及び雇用予定数は平成25年12月31日時点。

	平成25年3月	平成26年3月	増加数
指定事業者等の数	1,352	2,132	780

利子補給の認定計画に基づく推薦事業者（被災5県）への融資予定額は、対前年比プラス586億円、投資見込額は対前年比プラス1,592億円、新規雇用予定数は対前年比プラス1,756人。

	平成25年3月	平成26年3月	増加数
融資予定額(億円)	739	1,325	586
投資見込額(億円)	2,576	4,168	1,592
新規雇用予定数(人)	1,896	3,652	1,756

(注)利子補給の適用に関しては、平成26年度第1回目の公募(4/21~5/23)を実施。

10 福島県の状況（避難の状況）



避難指示区域等からの避難者数 ※1、※2 約10.2万人

※1 平成22年国勢調査及び各市町村からの聞き取りを基に、原子力被災者生活支援チームで集計(平成26年3月10日時点)
 ※2 旧緊急時避難準備区域からの避難者も含む

- ・避難指示解除準備区域 約3.3万人
- ・旧緊急時避難準備区域 約2.1万人
- ・居住制限区域 約2.3万人
- ・帰還困難区域 約2.5万人

福島県全体の避難者数

約13.1万人

(区域からの避難者も含む)

出典:「福島県公表「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報(第1188報)」(平成26年5月15日)」

(1) 福島県内への避難者数

約8.4万人


- 仮設住宅(民間借上げを含む) 約7.7万人
- 雇用促進住宅等 約0.4万人
- 親戚・知人宅等 約0.3万人

(2) 福島県外への避難者数

約4.7万人


- 東京都 約6.5千人
- 山形県 約5.3千人
- 新潟県 約4.3千人
- 茨城県 約3.6千人
- 千葉県 約3.3千人

避難指示区域の概念図

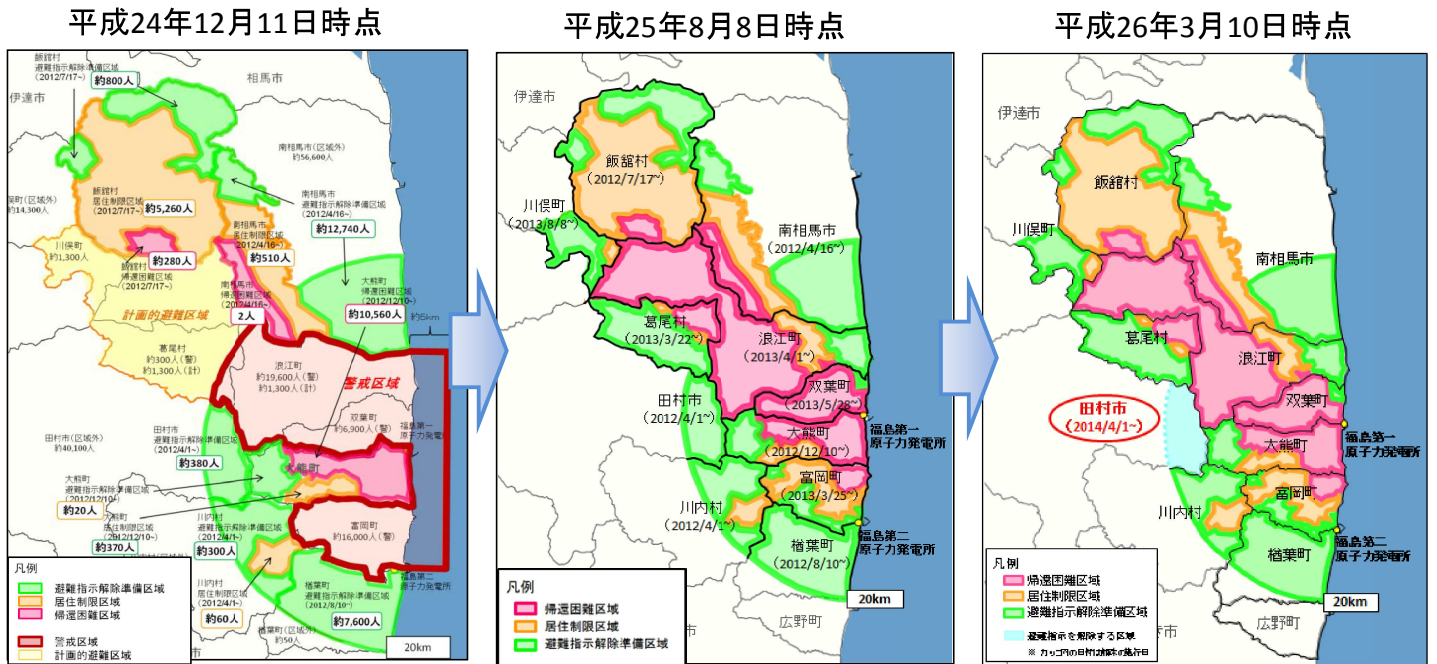

12 除染の進捗状況① (国直轄除染地域)

対象11市町村のうち、10市町村で除染計画を策定、全域又は一部地域において除染の作業中。
田村市、檜葉町、川内村、大熊町で除染計画に基づく除染が終了。

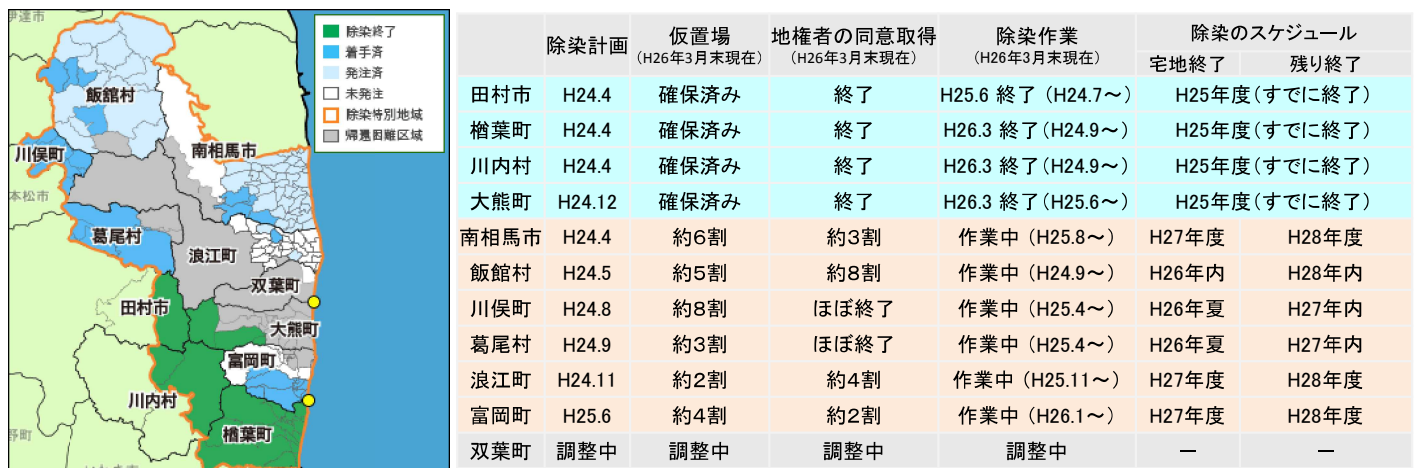

国直轄地域における進捗状況の推移 (基準時:平成26年3月31日)

	田村市	檜葉町	川内村	飯館村	川俣町	葛尾村	大熊町	南相馬市	富岡町	浪江町
宅地	100% (93%)	100% (4%)	100% (78%)	9% (0.8%)	17% (—)	59% (—)	100% (—)	— (—)	0.1% (—)	0.6% (—)
農地	100% (99%)	100% (10%)	100% (0%)	4% (0%)	5% (—)	0.1% (—)	100% (—)	0.4% (—)	0.2% (—)	0.7% (—)
森林(生活圏)	100% (81%)	100% (14%)	100% (25%)	5% (0.1%)	14% (—)	99% (—)	100% (—)	1% (—)	0.1% (—)	4% (—)
道路	100% (97%)	100% (2%)	100% (19%)	0.9% (0%)	0.3% (—)	1% (—)	100% (—)	0.3% (—)	17% (—)	— (—)

※ 上段の数値は、平成26年3月31日時点の実施率(平成26年3月31日時点の実績数/平成26年3月31日時点の計画数)を表す。
下段の数値は、平成24年12月末時点の実施率(平成24年12月末時点の実績数/平成24年12月末時点の計画数)を表す。
※ 実績数・計画数は、いずれも今後の精査によって変わります。

12 除染の進捗状況② (市町村除染地域)

94市町村において、放射性物質汚染対処特措法に基づく除染実施計画の協議を終了。特に子ども空間や公共施設において、除染が進捗し、予定した除染の終了に近づきつつあるが、全体が終了するまでには、更に数年はかかる見込み。




※ カッコ内は市町村数。
※ 下線は、除染措置が完了した市町村。

- 岩手県(3): 一関市、奥州市、平泉町
宮城県(8): 白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町、山元町、亶理町
福島県(36): 福島市、郡山市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、会津坂下町、湯川村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、鮫川村、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、小野町、広野町、新地町、田村市、川俣町、川内村、白河市、石川町、三春町、南相馬市、いわき市
茨城県(19): 日立市、土浦市、龍ヶ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町、利根町
栃木県(8): 佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町
群馬県(9): 桐生市、沼田市、渋川市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町、川場村
埼玉県(2): 三郷市、吉川市
千葉県(9): 松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市


市町村除染地域における除染の進捗状況の推移

○ 福島県外(平成26年3月末時点)

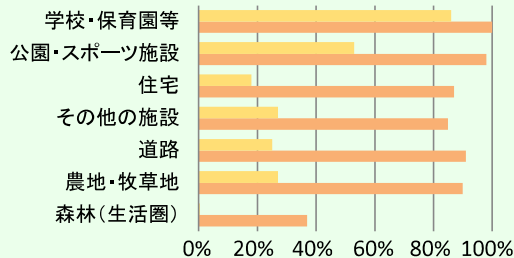

※ 予定数は、平成25年8月末時点で具体的に予定のある数を含めた累計であり、今後増加する可能性もある。

○ 福島県内(平成26年3月末時点)



※ 計画数は、25年度末までの累計。全体数は各市町村により、調整中や未定となっており、今後増加する可能性もある。

13 被災自治体の職員確保等に向けた支援の状況

- 被災自治体の職員確保のため、全国の自治体からの職員派遣の更なる強化に加え、公務員OB、民間実務経験者、青年海外協力隊帰国隊員等を活用するとともに、都市再生機構(UR)の現地の人員体制の強化などの対応を推進。
- 併せて、被災自治体の事務負担を軽減するために、発注方法の工夫(CM方式の導入等)や、事務のアウトソーシング(土地買収関連業務の補償コンサルタントへの委託等)など、事業実施に必要な職員やその労力を減らす取組を推進。

全国の自治体からの職員派遣

【24.10.1時点】 → 【25.5.14時点】 → 【25.10.1時点】
1,682人 → 2,056人 → 2,084人

被災自治体による任期付職員の採用

- ・任期付職員採用に必要な条例の制定、被災市町村における採用の助言
- ・県による採用・県下市町村への派遣についての助言 (被災自治体の任期付職員の状況)

【平成24年度まで】 → 【25.10.1時点】

627人(採用数) → 1,135人(在職数)※
※被災県採用被災市町村派遣職員は上記派遣人数にも計上されている。

全国の市区町村職員OBの活用

- ・被災地で働く意欲のある市区町村の職員OB等の情報をリスト化して被災市町村へ提供(OB情報システム)

【25.2.12時点(運用当初)】 → 【26.3.1時点】

25年度 登録 182人、採用 0人 → 登録 204人、採用 45人

【26.2.14時点】 → 【26.4.1時点】

26年度 登録 29人、採用 1人 → 登録 36人、採用 11人

被災自治体における民間企業等の人材の活用

- ・民間企業や自治体の第三セクター等の従業員を在籍したまま被災自治体が受け入れる仕組みを整備、これに伴う財政措置の周知の実施(25.3.1)

【25.10.1時点で地方公務員として派遣されていた民間企業等の従業員数】

27人

復興庁による市町村業務支援

- ・国(復興庁)の職員として、青年海外協力隊帰国隊員、国家公務員OB、民間実務経験者等を採用し、市町村に駐在させる取組を実施(25.1~)

【25.4.1時点】 → 【26.3.1時点】

24人 → 134人(他に常勤職員4人が駐在)

URの復興支援体制

【24.4.1時点】 → 【25.4.1時点】 → 【26.3.1時点】
172人 → 303人 → 332人²³

(参考)

復興の取組と関連諸制度

平成26年5月30日



復興庁

Reconstruction Agency



復興庁

Reconstruction Agency

目次

1 復興庁の体制2

- 1-1 東日本大震災の概要
- 1-2 復興庁の体制
- 1-3 福島対応体制の強化について
- 1-4 避難区域等に対する政府の対応体制

2 復興の取組7

2-1 最近の復興加速への取組

<被災者支援関係>

- 2-2-1 健康・生活支援に関する施策パッケージ
- 2-2-2 被災者の孤立防止と心のケアに関する取組
- 2-2-3 義援金、災害弔慰金、被災者生活再建支援金の実績

<まちづくり関係>

- 2-3-1 復興施策に関する国の事業計画及び工程表
- 2-3-2 住宅再建・復興まちづくりの加速化措置
- 2-3-3 住まいの復興給付金の創設

<産業・雇用関係>

- 2-4-1 産業の復興に向けた取組
- 2-4-2 被災事業者に対する資金繰り対策
- 2-4-3 中小企業者等の二重ローン問題への対応
- 2-4-4 雇用確保に向けた取組

<広報関連>

- 2-5 復旧・復興の進捗情報の「見える化」

<多様な担い手による連携>

- 2-6-1 被災地での人材不足対策
- 2-6-2 企業連携の推進
- 2-6-3 ボランティア・公益的民間連携
- 2-6-4 「新しい東北」の創造に向けて

<原子力災害関係>

- 2-7-1 福島復興に向けた制度対応等
- 2-7-2 個別課題への対応

3 復興関連諸制度等50

- 3-1 復興関係予算
- 3-2 福島関係予算
- 3-3 復旧・復興事業における財政的支援
- 3-4 復興特区制度
- 3-5 復興交付金
- 3-6 取崩し型復興基金について
- 3-7 福島復興に向けた制度
- 3-8 これまでの主な動き

1-1 東日本大震災の概要

※我が国の観測史上最大規模の地震、世界的にも1900年以降4番目の規模の地震

項目	データ
発生日時	平成23年3月11日 14時46分
震源および規模(推定)	三陸沖(北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の東南東130km付近) 深さ24km、モーメントマグニチュード Mw9.0
震源域	長さ約450km、幅約200km
断層のすべり量	最大20~30m程度
震源直上の海底の移動量	東南東に約24m移動、約3m隆起
	震度7 宮城県北部
	震度6強 宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、茨城県北部・南部、栃木県北部・南部
	震度6弱 岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、群馬県南部、埼玉県南部、千葉県西北部
	震度5強 青森県三八上北・下北、岩手県沿岸北部、秋田県沿岸南部・内陸南部、山形県村山・置賜、群馬県北部、埼玉県北部、千葉県北東部・南部、東京都23区、新島、神奈川県東部・西部、山梨県中部・西部、山梨県東部・富士五湖

(気象庁資料・海上保安庁資料による)

被害状況等

(平成26年5月9日現在 出典:警察庁、復興庁等)

(1) 人的被害

ア 死者	15,886名
イ 行方不明	2,620名
ウ 負傷者	6,148名
エ 震災関連死(※2)	3,089名

(2) 建築物被害

ア 全壊	127,382戸
イ 半壊	273,019戸
ウ 一部破損	742,206戸


※ 未確認情報を含む。

※ 平成23年4月7日に発生した宮城県沖を震源とする地震等の被害を含む。

※2 「震災関連死の死者」とは、「東日本大震災による負傷の悪化等により亡くなられた方で、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、当該災害弔慰金の支給対象となった方」と定義(実際には支給されていない方も含む。)。復興庁等調べ(平成26年5月27日現在)。

2

1-2 復興庁の体制

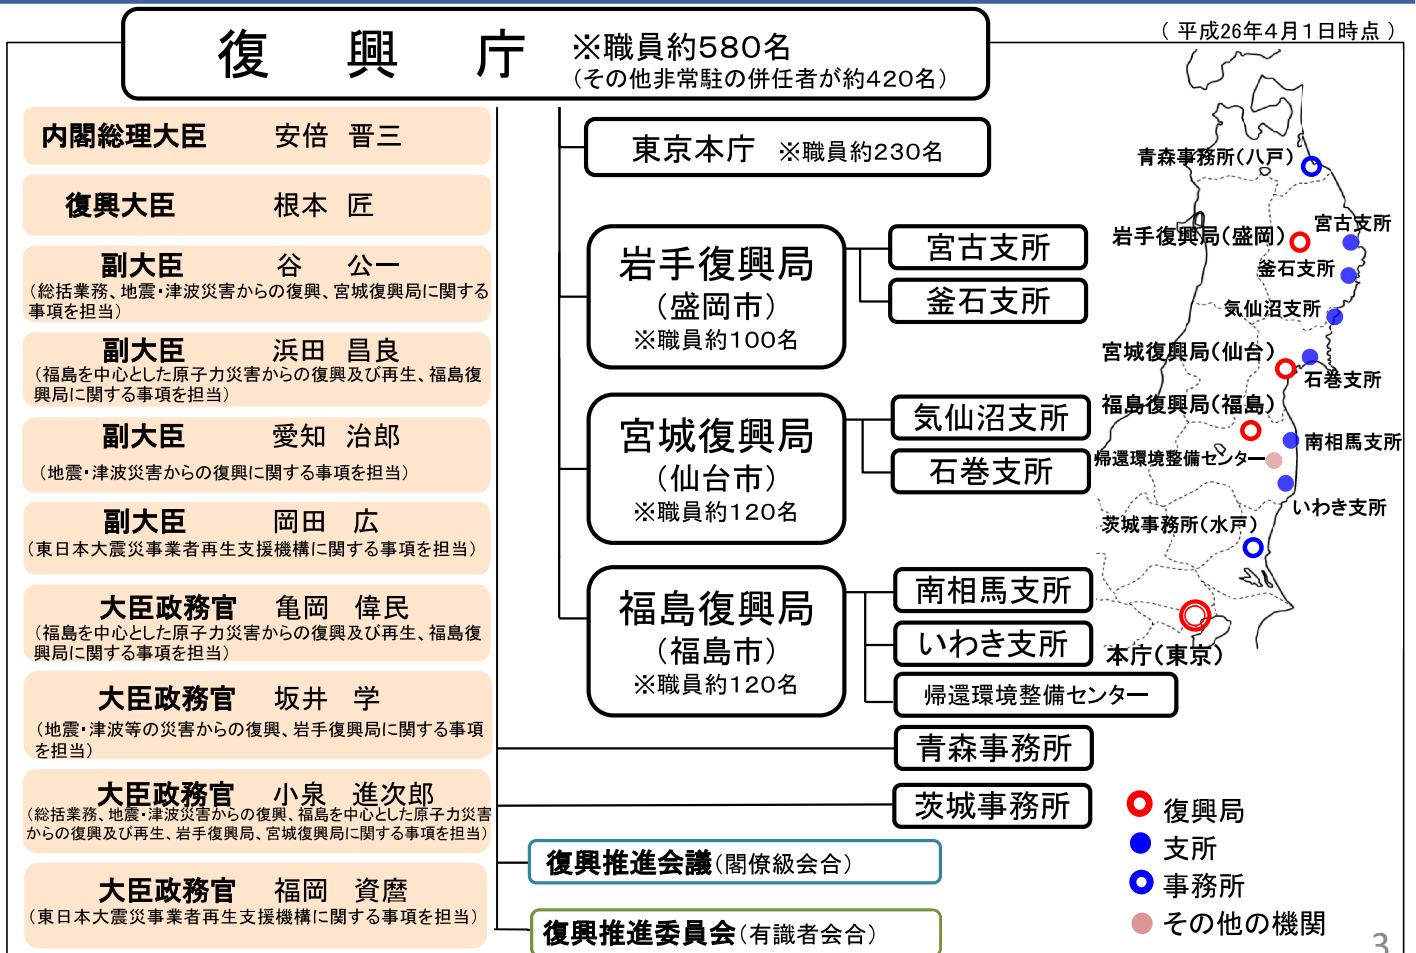

3

1-3 福島対応体制の強化について①

復興庁の司令塔機能を強化しつつ、復興大臣トップの、いわゆる『福島・東京2本社体制』とする。

福島

1. 「福島復興再生総局」を設置(平成25年2月1日)

- 復興大臣をトップとする現地関係政務の体制を整備。
- その下に、事務局として、内閣官房参与のほか、復興庁事務次官、環境省、経産省の現地トップ等を配置。
- 除染をはじめ、体制を一元化することにより、復興大臣自ら機動的に統括・指揮し、現地で即断即決。

2. 本庁幹部職員等の福島常駐

内閣官房参与、次官、統括官等トップクラスによる福島常駐。

3. 現地組織の一体運用

福島復興局に、環境再生事務所及び原子力災害現地対策本部の関係職員を集め、復興局に駐在。

福島復興再生総局

総局長 根本 復興大臣(福島原発事故再生総括担当大臣)
 【構成員】 浜田 復興副大臣
 亀岡 復興大臣政務官
 赤羽 原子力災害現地対策本部長(経済産業副大臣)
 井上 環境副大臣

事務局

内閣官房参与(事務局長)
 復興庁事務次官
 復興庁統括官、福島復興局長
 原子力災害現地対策本部副本部長(経済産業省)
 福島環境再生事務所長(環境省)等

福島復興局

福島環境再生事務所

(除染、廃棄物対策)

原子力災害現地対策本部

(区域運用、見直し等)

東京

1. 「福島復興再生総括本部」を設置(平成25年2月1日)

- 復興大臣直轄により政府中枢機能を強化。
- 大臣が、関係省庁の局長クラスを直接指揮。

2. 福島対応体制の強化

- 福島担当統括官の新設。
- 内閣府原子力被災者生活支援チーム(避難指示区域の運用・見直しを担当)を復興庁内に移し、福島対応体制を強化。

福島復興再生総括本部

本部長 根本 復興大臣(福島原発事故再生総括担当大臣)

関係省庁(局長クラス)


復興庁、警察庁、内閣府原子力被災者生活支援チーム
 消費者庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省
 経済産業省、国土交通省、環境省、原子力規制庁 等

4

1-3 福島対応体制の強化について②

復興庁内自治体担当体制を強化するとともに、関係省庁、現地事務所との連携チームを編成し、県と共に個別の市町村の復興計画の具体化・充実を支援

連携チーム

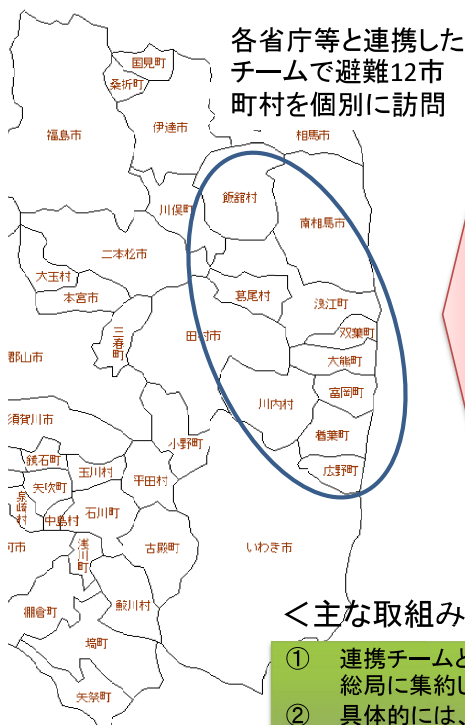

現地事務所

福島復興局
 原子力災害現地対策本部
 環境再生事務所


関係府省等

- 内閣府原子力被災者生活支援チーム
- 警察庁
- 文部科学省
- 農林水産省
- 国土交通省
- 総務省
- 厚生労働省
- 経済産業省
- 環境省

<主な取組み>

- 連携チームと県の市町村担当者が、各市町村に出向いて現場の状況把握及び協議を進め、福島復興再生総局に集約し、個別課題の解決、復興の道筋を検討。
- 具体的には、市町村が策定した復興ビジョン、復興計画、インフラ工程表等をベースとして、「ランドデザイン」(12市町村共通)も踏まえつつ、市町村ごとの条件に沿った事業の具体化、段取りを検討。
- 協働体制の中で精査された事業については、「避難解除等区域復興再生計画」や各省庁の事業に反映。

5



主要課題	(1) 放射線物質汚染に関する安心・安全の確保 (健康リスクに係るリスク コミュニケーションを含む)	(2) モニタリング	(3) 区域見直し等	(4) 賠償 (円滑な賠償の実施等) ・賠償指針、ADR等	(5) 除染(含む中間貯蔵施設)	(6) 廃棄物対策	(7) 長期避難者対策 (含む町外コミュニティ 住民意向調査)	(8) インフラ、 公共サービス復旧	(9) 農林水産業の再開	(10) 産業振興 雇用対策
全体取り まとめ省庁	環境省	環境省	原燃T	文科省 経産省	環境省	環境省	復興庁	復興庁	農水省	厚労省 経産省
主たる 関係省庁	文科省 厚労省	農水省 厚労省	警察庁 消防庁			国交省 農水省	国交省 厚労省 総務省 文科省	国交省 文科省 厚労省		
		原燃T 文科省*				厚労省	原燃T 経産省 環境省	原燃T 環境省 農水省		

※原燃T:内閣府原子力被災者生活支援チーム

2-1 最近の復興加速への取組

1. 復興庁の司令塔機能の強化と現場主義の徹底(速やかに対応)

【主な対応】

- 【福島関係】
 - 福島における「福島復興再生総局」の設置(H25.2.1)と復興庁幹部の常駐。
 - 東京における「福島復興再生総括本部」の設置(H25.2.1)による政府中枢機能の強化。
 - 「除染・復興加速のためのタスクフォース」の開始(H25.1.11~)。
 - 「風評被害タスクフォース」の開始(H25.3.21~)。
- 【被災地全般関係】
 - 復興庁職員の意識改革。
 - 「住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース」(2/22~)において施策パッケージ(3/7)をとりまとめ。
 - 復興大臣の裁量で、事業費追加や新ニーズに機動的に対応するとともに、諸制度の隙間を埋めて復興の調査企画等を実施するための予算制度の創設(H25予算)

2. 復興財源フレームの見直し等

【主な対応】

- 平成25年度予算編成とあわせて復興財源フレームを見直し(5年間19兆円程度を25兆円程度に見直し)、必要な財源を確保。(H25.1.29)
- 迅速かつ柔軟な執行、復興関連予算の用途の厳格化。

3. 復興の加速策の具体化・推進(H24補正、H25予算等)

(1) 住宅再建・まちづくり、なりわいの確保等

【主な対応】

- 住宅・宅地の戸数の年度別目標である「住まいの復興工程表」を公表。また、工程表の実現のための加速化措置を第5弾まで策定・公表。
- 津波被災地域において、住民の定着を促進する住宅再建支援のための取崩し型復興基金の増額。(H24補正)
- 公務員OB・民間実務経験者・海外青年協力隊帰国隊員等の活用、URの現地体制拡充、マンパワー対策の強化や被災自治体の事務負担の軽減。
- 津波・原子力災害被災地域における雇用創出のための企業立地に係る新たな支援制度の創設やグループ補助金の事業対象に共同店舗の新設や街区の再配置等を追加し、被災地域の商業復興を促進。(H25予算)
- 復興交付金について、対象拡大やほかの支援制度による対応等、更なる柔軟化を実施。

(2) 福島の復興・再生の加速化

【主な対応】

- 補正予算での福島復興・再生に向けた対策の盛り込み。
- これまで対処できなかった課題に対する新たな支援制度の創設。
 - ・地域の希望復活応援事業(H24補正・H25予算)
 - ・コミュニティ復活交付金の創設(H25予算)
 - ・子ども元気復活交付金の創設(子育て環境の整備等)(H25予算)
 - ・福島再生加速化交付金の創設・強化(H25補正)
- ※個別に実施していた「長期避難者への支援から早期帰還への対応まで」を一括化
- 福島県に基金を造成し、営農再開を目的として行う一連の取組を、農地の除染や住民帰還の進捗に応じて切れ目なく支援。
- 「早期帰還・定住プラン」をとりまとめ(H25.3.7)。4市町村において本プランに基づく工程表を策定・公表済。
- 「原子力災害による風評被害を含む影響への対策パッケージ」の公表(H25.4.2)
- 避難解除区域等における雇用機会の確保のための迅速な企業立地の促進に資する措置(税制)など福島復興再生特別措置法の改正。(H25.5.10公布)
- 「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」の閣議決定・国会報告。(H25.10.11)

- 被災者の避難の長期化が見込まれる中、被災者の健康面を中心とした影響、また、災害公営住宅等へ入居した被災者においても、そこでの生活の定着には様々な不自由等が懸念される。
- 復興大臣のもとに関係府省局長級からなるタスクフォースを立ち上げ（平成25年11月13日）、現場から寄せられた現状と具体的な課題を総合的に把握するとともに、避難の長期化や地域によって異なる実情といった現場主義の視点に立脚し検討。
- 各府省の既存施策を横断的に点検し直し、平成26年度予算措置や今後の運用改善の方向性などを施策パッケージとして取りまとめた（平成25年12月13日）。

I 仮設住宅入居者等の避難者に対する健康支援

- ・被災地健康支援事業【厚生労働省】
→ 避難の長期化に伴った健康状態の悪化を防ぐ継続的な保健活動（巡回保健指導や専門人材の確保等）を維持するため、基金の積増し及び実施期限の延長を平成26年度予算措置に向けて検討（※政府予算案へ反映）
- ・地域支え合い体制づくり事業／被災者の心のケア支援事業／寄り添い型相談支援事業【厚生労働省】
- ・復興支援員【総務省】
- ・東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業【内閣府】等

II 子どもに対する支援の強化

- ・被災の影響を受けている子どもに対する支援【厚生労働省】
→ 様々な形で被災の影響を受けている子どもに対する支援を強化するため、平成26年度予算措置に向けて検討
(※政府予算案へ反映)
①心のケアに加え、体のケアに関する相談・援助も行うよう対象を拡大／②安心して過ごすことができる環境づくり事業の創設／③遊具の設置、子育てイベントの開催について、対象範囲を福島県から被災3県に拡大／④子育て世帯に対して心身の健康に関する相談・支援を行う新たな訪問事業の創設
- ・学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業／緊急スクールカウンセラー等派遣事業【文部科学省】等

III 医療・介護人材の確保

- ・地域医療再生基金／地域医療支援センター／被災者健康支援連絡協議会【厚生労働省】
- ・被災地における福祉・介護人材確保事業【厚生労働省】等
→ 特に福祉・介護人材の確保が困難となっている福島県相双地域等における支援の強化を図るため、「被災地における福祉・介護人材確保事業」を平成26年度予算措置に向けて検討（※政府予算案へ反映）

IV 恒久住宅の整備と仮設住宅等からの移転に伴う課題への対応

- ・地域コミュニティ復興支援事業【厚生労働省】
- ・地域公共交通確保維持改善事業【国土交通省】等
→ より的確に被災地のニーズに対応するため、地域内輸送については、仮設住宅等の箇所数に応じた補助上限額の設定や特例措置の期間の延長を平成26年度予算措置に向けて検討（※政府予算案へ反映）

V 市町村の業務負担に対する支援の強化

- ・被災自治体への人的支援【総務省】【復興庁】
- ・復興人材プラットフォーム構築事業【復興庁】
- ・市町村職員への効果的な情報提供のため、事業一覧、担当府省・部局、要綱、先進・好事例等の関係情報についてホームページ整備等を検討【復興庁】等

<その他> ・「新しい東北」先導モデル事業【復興庁】等

8

2-2-2 被災者の孤立防止と心のケアに関する取組

- 被災者の多くが、避難所から仮設住宅等に移行。コミュニティの弱体化や、被災者の孤立が問題。
- このため、①見守り活動、②心のケア、③生きがいつくり等を行う。
- 福島の原子力災害地域を始め、子どもたちの心のケアの状況等について、調査を実施中。

(1) 孤立防止の主な取組

- ①「介護等のサポート拠点」を被災3県で合計115箇所設置し（H26年1月末現在）、仮設住宅における高齢者等の総合相談、居宅介護サービス、生活支援サービス、地域交流などを実施。

地域支え合い体制づくり事業

（平成23年度1次補正予算70億円、3次補正予算90億円、平成25年度予算23億円、平成26年度予算案15億円）

- ② 高齢者、障害者や離職を余儀なくされた若年層などが地域とのつながりを持ち続けることができるよう、市町村、社会福祉協議会、NPO等と連携、ボランティア等による孤立防止のための見守り活動等を実施。

地域コミュニティ復興支援事業

（平成23年度3次補正予算40億円、平成24年度予備費30億円、平成25年度補正予算30億円）



(2) 心のケアの主な取組

- ① 岩手・宮城・福島各県に「心のケアセンター」を設置するなど、専門職による訪問支援等を実施。

被災者の心のケア支援事業

（平成23年度3次補正予算28億円、平成25年度予算18億円、平成26年度予算案18億円）

- ② 被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケア等のため、スクールカウンセラー等の緊急派遣を実施。

緊急スクールカウンセラー等派遣事業

（平成23年度1次補正予算30億円、3次補正予算4億円、平成24年度予算47億円、平成25年度予算39億円、平成26年度予算案37億円）

- ③ 心血管疾患やPTSD等に関する長期間追跡調査を実施。

（平成24年度は、宮城県及び岩手県の約13,000名を対象に調査を行い、前年度と比較して睡眠障害が疑われる者の割合の改善がみられた。（特に、宮城県での44歳以下の者（特に男性）における改善が顕著）平成25年度も同様の調査を行っている。）

- ④ 子どもの心の健康状態を把握するための調査を実施。

（H24.5月調査実施、H25.7月に報告書作成。12月東京都で教職員等を対象にシンポジウムを開催。）

- ⑤ 子どもの発育状況やストレス状況等の調査研究を実施中。

（平成24～26年度の3年計画で調査を実施。）

- ⑥ 子どもを支援する専門職の研修や巡回相談等、被災した子どもの心のケアに関する自治体の取組を支援。

（平成26年度予算案にて、心のケアに加え、体のケアに関する相談・援助も行うよう対象を拡大。）

9

- 日本赤十字社等に寄せられた義援金3,726億円の約9割を被災者に配布済(平成26年3月31日現在)。
- 災害弔慰金の支給済件数は、19,742件(平成26年3月31日現在)。
- 被災者生活再建支援金の支給世帯数は189,869世帯(平成26年3月31日現在)。

(1) 義援金の配布状況(内閣府調べ、平成26年3月31日現在)

募金総額	配分			配付件数
	都道府県への送金額	うち市町村への送金額	うち被災者への配付額	
3,726億円	3,678億円	3,640億円	3,582億円	1,745,154件
	98.7%	99.0%	98.4%	

※日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会、NHK厚生文化事業団の4団体に寄せられた義援金を集計したものです。

(2) 災害弔慰金の支給状況(内閣府調べ、平成26年3月31日現在)

	支給済件数	うち被災3県	支給済額	うち被災3県
災害弔慰金	19,742件	19,535件	587億4,750万円	580億6,250万円
災害障害見舞金	88件	84件	1億5,000万円	1億4,000万円

※災害弔慰金: 災害により死亡された方のご遺族に対して支給するもの。

災害障害見舞金: 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給するもの。

(3) 被災者生活再建支援金の支給状況(内閣府調べ、平成26年3月31日現在)

	世帯数	うち被災3県	支給額	うち被災3県
基礎支援金	189,869世帯	172,694世帯	1,515億円	1,387億円
加算支援金	111,216世帯	97,881世帯	1,380億円	1,202億円

※被災者生活再建支援金: 災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給するもの。

東日本大震災財特法の一部改正により、東日本大震災に限った措置として国の補助率を50%から80%に引き上げ。

また、地方負担(20%)のための基金積み増し分について、平成23年度第2次補正予算で増額される特別交付税により全額手当。

10

2-3-1 復興施策に関する国の事業計画及び工程表の見直しと進捗確認 ①

- 平成25年度予算成立を機に、平成25年度の目標を含めた事業計画及び工程表見直しを実施。
- 平成24年度の目標の達成状況について進捗確認を実施。

【事業計画及び工程表の概要】

- ・復興施策について事業計画と工程表を取りまとめた公表。
- ・公共インフラ全体版及び公共インフラ地域版(市街地復興パターンの検討調査実施した43市町村を中心)を作成。
- ・今後も、節目節目において事業計画及び工程表の見直しを行い、取りまとめの上、公表していく予定。

■ 作成内容

○ 事業計画

対象事業ごとに、復旧・復興に向けた基本的考え方、成果、目標などを記載。


○ 工程表

上記の事業計画に即して、対象事業ごとに復旧・復興の目標をバーチャートで表示。

■ 対象事業

海岸、河川、下水道、交通網(道路、鉄道、空港、港湾)、農地・農業用施設、海岸防災林の再生、漁港・漁場・養殖施設・大型定置網、復興住宅(災害公営住宅)、復興まちづくり(防災集団移転・区画整理等、医療施設等、学校施設等)、土砂災害対策、地盤沈下・液状化対策、災害廃棄物の処理

■ 公共インフラ地域版: 工程表の例(宮城県石巻市の海岸対策・河川対策)

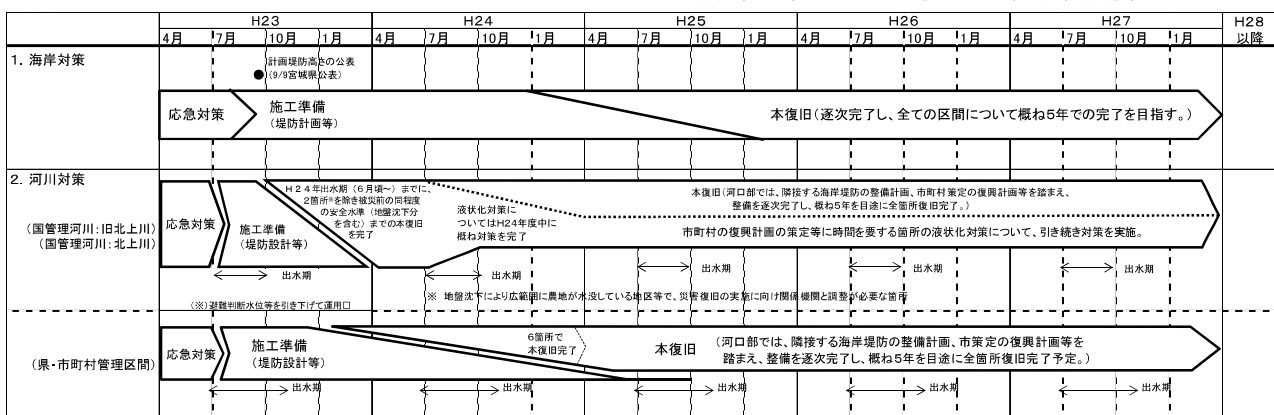

11

2-3-1 復興施策に関する国の事業計画及び 工程表の見直しと進捗確認②

- 公共インフラ(全体版)の対象18事業について、所管省庁による工程の進捗確認を実施。
- その結果、11事業は「概ね平成24年度に目標達成」もしくは「平成24年度に目標達成」、海岸対策など3事業及び災害廃棄物の処理など4事業の一部が「平成25年度に目標達成がずれ込む」となっている。
- 平成25年度に目標達成がずれ込む理由は、復興まちづくり計画や他事業との調整、用地取得等の合意形成、港湾岸壁の復旧より利用の優先、不発弾発見等の周辺状況の変化等により、時間を要したことである。
- このため、復興事業の円滑な推進及び加速化に向けて、復興庁にタスクフォースを設置し、25年3月、4月、10月、26年1月、5月と住宅再建・復興まちづくりの加速化措置を第5弾まで立て続けに打ち出すとともに、フォローアップを行い、柔軟かつきめ細かな対応を実施。

事業名	平成24年度成果の進捗分析【評価】※	事業名	平成24年度成果の進捗分析【評価】※
1. 海岸対策	平成25年度に目標達成がずれ込む	10. 漁港・漁場・養殖施設・定置網	【漁港】平成24年度に目標達成 【漁場】平成25年度に目標達成がずれ込む 【養殖施設】平成24年度に目標達成 【定置網】平成25年度に目標達成がずれ込む
2. 河川対策	【国管理区間】概ね平成24年度に目標達成 【県・市町村管理区間】平成25年度に目標達成がずれ込む	11. 復興住宅(災害公営住宅等)	平成24年度に目標達成
3. 下水道	平成24年度に目標達成	12. 復興まちづくり(防災集団移転促進事業、土地区画整理事業等)	平成24年度に目標達成
4. 交通網(道路)	平成24年度に目標達成	13. 復興まちづくり(被災した造成宅地)	平成24年度に目標達成
5. 交通網(鉄道)	【旅客鉄道】平成24年度に目標達成 【貨物鉄道】平成24年度に目標達成	14. 復興まちづくり(医療施設等)	概ね平成24年度に目標達成
6. 交通網(空港)	平成25年度に目標達成がずれ込む	15. 復興まちづくり(学校施設等)	概ね平成24年度に目標達成
7. 交通網(港湾)	【産業・物流上、特に重要な港湾施設】平成25年度に目標達成がずれ込む 【復旧に期間を要する施設(防波堤)】平成24年度に目標達成	16. 土砂災害対策	平成25年度に目標達成がずれ込む
8. 農地・農業用施設	概ね平成24年度に目標達成	17. 地盤沈下・液状化対策	平成24年度に目標達成
9. 海岸防災林の再生	平成24年度に目標達成	18. 災害廃棄物の処理	【災害廃棄物の仮置場への移動】平成25年度に目標達成がずれ込む 【中間処理・最終処分】概ね平成24年度に目標達成(ただし、福島県の一部を除く)

※ 目標とは、平成24年度の成果目標を指す。

12

2-3-2 住宅再建・復興まちづくりの加速化措置

- 復興大臣の下に関係省庁の局長クラスで構成するタスクフォースを設置し、加速化措置を矢継ぎ早にとりまとめた。
- 住宅再建や復興まちづくりが進む中、高台移転の宅地造成が完成した地区で、被災者の皆様が速やかに住宅を再建できるよう、民間住宅の自立再建の支援を中心とした施策パッケージを策定した。
- さらに復興の各ステージでより効率的に事業を進めることができるよう新たな措置講じた。

H25.3.7 住宅再建・復興まちづくりの「加速化措置第1弾」 (住宅再建・復興まちづくりの加速化に向けた施策パッケージ)

- ① 住まいの復興工程表の公表
- ② 実現および加速化のための主な措置
 - ・ 用地取得の迅速化
 - ・ 埋蔵文化財発掘調査の簡素化・迅速化
 - ・ 資材不足、人員不足、入札不調への対応

H25.4.9 住宅再建・復興まちづくりの「加速化措置第2弾」

- 用地取得の困難な場合の課題に速やかに対応できるよう手続きの簡素化
- ・ 防災集団移転促進事業における事業計画変更の簡素化(土地取得困難地の回避等)
 - ・ 土地収用手続きの効率化
 - ・ 財産管理制度の円滑な活用(不在者財産等への対応)
 - ・ 所有者不明土地に係る手続きの円滑化

H25.10.19 住宅再建・復興まちづくりの「加速化措置第3弾」

- ① 「用地取得加速化プログラム」の策定
 - ・ 財産管理制度や土地収用制度、自治体の用地事務支援に関する加速化措置を拡充し、総合的に体系化
 - ・ 財産管理制度と土地収用制度の手続きの簡素化・迅速化など復興事業に限った「被災地スペシャル」の対策を講じ、用地取得の手続きを画的に短縮
- ② 住宅再建の加速化
 - ・ 災害公営住宅分野の人材不足・資材不足・入札不調等への対応
 - ・ 防災集団移転促進事業の円滑な推進や跡地利用への対応
- ③ 加速状況の見える化
 - ・ 「つちおと情報館」見える化のワンストップ
 - ・ 施工確保対策の地方公共団体への周知

H26.1.9 住宅再建・復興まちづくりの「加速化措置第4弾」

- ① 「商業集積・商店街再生加速化パッケージ」の策定
 - ・ 「被災地まちなか商業集積・商店街再生加速化指針」の策定
 - ・ 商業施設等復興整備事業による支援
 - ・ 暮らし・にぎわい再生事業の活用
 - ・ 仮設施設の有効活用
 - ・ 津波復興拠点整備事業における宅地の賃貸等の周知・活用
 - ・ 震災復興支援アドバイザーの活用
 - ・ 市町村まちづくり担当者に対する研修の実施
- ② 住宅再建の加速化
 - ・ 東北六県における各発注機関の発注見通しを統合して公表
 - ・ 福島県の避難指示のあった市町村に関する農地法の規制緩和
 - ・ 被災市町村からの人材確保要望を取りまとめ全国の市区町村に職員派遣等を要請

H26.5.27 住宅再建・復興まちづくりの「加速化措置第5弾」

- ① 「民間住宅の早期自立再建支援パッケージ」の策定
 - ・ 防集団地の登記処理と住宅建設の並行実施が可能な旨を周知
 - ・ 法務局と地方公共団体との間で登記囑託を計画的に処理できるよう仕組みを構築
 - ・ 被災者が住宅を円滑に再建するための支援施策を展開
- ② 「被災地特化型用地取得加速化パッケージ」の策定
 - ・ 地方公共団体の用地事務の更なる負担軽減を図るための取組を強化
 - ・ 土地収用法の運用の明確化による土地収用手続きの迅速化
 - ・ 不明裁決の申請に係る権利者調査のガイドラインの作成・周知
- ③ 円滑な施工確保対策の更なる強化
 - ・ 公共工事設計労務単価の更なる引上げや単品スライド条項に基づく変更手続きの簡素化等、実勢価格を契約価格へ適切に反映

これまでの加速化措置のフォローアップ（概要）

● 住宅再建・復興まちづくりについて、計画策定、用地取得、施工確保など復興ステージに応じた課題に対して、加速化措置により解決

復興のステージ		主な加速化措置の効果	
計画策定		「住まいの復興工程表」を策定し、被災者の方に対し、 住宅再建の見通しを提示	
用地取得	「用地取得加速化プログラム」を策定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地取得率(被災3県)が上昇 48.1%(H25.9)⇒ 68.5%(H25.12) ・ 釜石市防潮堤事業(モデル事業)では、用地取得完了を2~3年前倒しへ ・ 「用地加速化支援隊」により、市町村と一体となって課題を解決を目指す 	
	財産管理制度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 裁判所の審理期間の短縮(※申立時に必要書類が揃っているなどが前提) ・ 全体で半年以上と懸念 ⇒ 裁判所の審理は、最短3週間程度でも可能に 	
	土地収用手続	<ul style="list-style-type: none"> ・ モデル事業の活用による迅速化 ・ 申請書概成 約1~2年と懸念 ⇒ 約4か月(釜石)、約1か月(宮古)に短縮 ・ 事業認定手続 通常3か月 ⇒ 約50日(釜石)、約55日(宮古)に短縮 	
	用地取得事務	補償コンサルタント等への外注(21市町村 で実施 (H26.1))	
計画変更		<ul style="list-style-type: none"> ・ 取得困難地での計画変更手続の簡素化(249件変更 (H26.1)) ・ 東松島市矢本西地区 区域変更により約2か月短縮 	
埋蔵文化財発掘調査		<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査手法の工夫、全国から専門職員派遣等により迅速化 ・ 山田町 田の浜地区(防集) 18か月 ⇒ 5か月 	
発注者支援	被災自治体の発注者支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国の自治体からの職員派遣の更なる強化、青年海外協力隊帰国隊員や民間実務経験者の活用 ・ 被災市町村の不足人員を (H25.2) 805人 ⇒ (H26.3) 159人に改善 	
	URIによるCM方式の導入	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設計・施工契約手続の一括化、人員・資機材の早期調達 ・ 東松島市野蒜地区で、最大1年半の工期短縮(見込み) 	
施工体制の確保 (技術者・技能者不足、資材不足への対応)		<ul style="list-style-type: none"> ・ 復興JVによる落札(累積64件(H26.2)) ・ 主任技術者の兼任要件の緩和、発注ロットの大型化 ・ 労務単価の引上げ(被災3県 対H24年度比 約30%増) ・ 民間、公共による生コンプラントの設置 	

14

2-3-3 住まいの復興給付金の創設 【平成25年度補正予算 250億円】

<目的>

被災者について、復興まちづくりに係る区域指定や宅地造成の時期など外的な要因により被災者間で生じる負担の不均衡を避けるため、住宅再取得等に係る標準的な消費税の負担増加に対応し得る措置として、給付措置を行う。

<内容>

建築・購入

給付対象者

以下の要件を全てみたす者が給付対象者（原則）

- ①被災住宅^{※1}を所有していた者
- ②再取得住宅^{※2}を所有している者
- ③再取得住宅に居住している者

※1: 防災証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」又は「一部損壊」の認定を受けた住宅又は原子力災害による避難指示区域等内にある住宅のことをいう。
 ※2: 被災住宅に代わり、新たに建築・購入した住宅。

給付額

再取得住宅の床面積^{※1}

×

給付単価
 税率8%時: 5,130円
 税率10%時: 8,550円

×

再取得住宅の持分割合

※1: 区分所有の場合は、専有部分の床面積。
 ※2: 登記上、用途が「居宅」以外を含む場合、居宅部分の床面積。
 ※3: 給付する床面積の上限は、175㎡。175㎡以上の場合は、175㎡分を給付。

対象住宅

消費税率8%又は10%の適用を受けている期間に、建築・購入された新築住宅又は宅建業者が販売した中古住宅で、その床面積が以下の要件を満たす住宅。

- 建築の場合: 13㎡以上
- 購入の場合: 50㎡以上（地上3階以上の共同住宅の場合: 30㎡以上）

補修

給付対象者

以下の要件を全てみたす者が給付対象者（原則）

- ①被災住宅を所有している者
- ②被災住宅の補修工事を発注した者
- ③補修した被災住宅に居住している者

給付額

被災住宅の床面積に、被災状況に応じた給付単価をかけた額(①)と実際に支払った補修工事費(税抜)に増税分の消費税に相当する額のどちらか少ない方を給付

【被災状況に応じた給付単価を掛けた額(①)】

$$\text{給付額} = \text{被災住宅の床面積}(\text{※1}) \times \text{給付単価}(\text{※2})$$

(※1)区分所有の場合は、専有部分の床面積。登記上、用途が「居宅」以外を含む場合、居宅部分の床面積
 (※2)給付単価は、以下のとおり。

	8%時	10%時
全壊(流出)・原災	1,680円	2,800円
大規模半壊	1,650円	2,750円
半壊(床上浸水)	1,380円	2,300円
一部損壊(床下浸水)	840円	1,400円

対象住宅

消費税率8%又は10%の適用を受けている期間に補修工事を行った被災住宅。

<問合せ先>

コールセンター
TEL:0570-200-246(有料)9:00~17:00(土・日・祝日を含む)

ホームページ
アドレス: <http://fukko-kyufu.jp>



地域経済の核となる中小企業等グループの施設・設備の復旧を支援(グループ補助金3/4補助)。なお、中小零細企業の個社支援は、各県が1/2補助を実施。

～グループの要件～

- ①経済取引の広がりから、地域の基幹である産業・クラスター、②雇用・経済の規模の大きさから重要な企業群、③我が国経済のサプライチェーン上、重要な企業群、④地域コミュニティに不可欠な商店街等

グループ補助金の実績 (26年3月7日現在)

これまで573グループに対し、国費2,897億円(県費とあわせて4,347億円)を支援。

	グループ	補助金 交付者数	補助総額 (国県)	うち国費
北海道	6グループ	36事業者	10億円	6億円
青森県	10グループ	208事業者	86億円	57億円
岩手県	107グループ	1,244事業者	782億円	521億円
宮城県	175グループ	3,721事業者	2,318億円	1,545億円
福島県	208グループ	3,134事業者	923億円	615億円
茨城県	58グループ	1,432事業者	195億円	130億円
栃木県	1グループ	14事業者	5億円	3億円
千葉県	8グループ	154事業者	28億円	19億円
計	573グループ	9,943事業者	4,347億円	2,897億円

県が計画認定、国1/2と県1/4補助。国費は、H23補正1503億円、H24・500億円、H24予備費801億円、H25・250億円、H25補正・204億円、H26・221億円。

復旧事例

高徳海産(石巻市)
23年11月下旬、工場再開。



太平洋セメント(大船渡市)
23年11月、セメント製造再開。大船渡市及び陸前高田市のガレキ等の処理も実施。




16

2-4-1 産業の復旧に向けた取組② (仮設店舗等)

(独)中小企業基盤整備機構が自治体からの要望を受け、仮設施設を整備し、自治体に無償貸与、その後1年以内に自治体に無償譲渡。現在、仮設商店街、仮設工場等に利用。

仮設店舗・工場等の整備実績 (26年5月16日)
(H23補正計273.6億円、H24・50億円、H25・30億円)

	要望箇所数	うち基本契約締結箇所数		
		うち基本契約締結箇所数	うち着工箇所数	うち完成箇所数
青森県	18	18	18	18
岩手県	351	351	350	349
宮城県	140	138	138	138
福島県	65	63	63	62
茨城県	1	1	1	1
長野県	1	1	1	1
合計	576	572	571	569

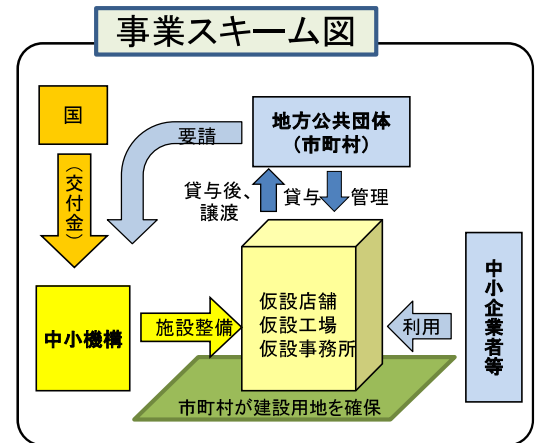

南町業市場(気仙沼市)
津波被害を受けた南町商店街等の被災事業者を対象に整備した、最大規模の仮設商店街。(23年12月オープン)



浜風商店街(いわき市)
津波被害が激しい市北部の久之浜地区の被災事業者等を対象に整備した、初の仮設商店街。(23年9月オープン)



いわき四倉中核工業団地(いわき市)
72社分の仮設工場等が事業再開。23年11月以降、順次完成。



福幸きり商店街(大槌町)
23年12月、40店舗が同商店街で営業再開。



17

- 被災地の企業立地を促進し産業の復興を加速するため、福島県向け、その周辺地域向け、津波・原子力災害被災地向けの企業立地補助金を創設。
- 平成26年4月時点で、累計約760件、補助予定額約3,200億円の案件を支援。

ふくしま産業復興企業立地支援事業

平成23年度3次補正予算：1,700億円、平成24年度予備費：402億

- ・対象地域：福島県
- ・採択件数：405件
- ・補助予定額：1,961億円

原子力災害周辺地域産業復興企業立地補助金

平成24年度予算：140億円

- ・対象地域：宮城県、栃木県、茨城県
- ・採択件数：66件
- ・補助予定額：115億円

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金

平成25年度予算：1,100億円、平成25年度補正予算330億円、平成26年度予算300億円

- ・対象地域：原子力災害被災地域、津波浸水地域
- ・採択件数：286件
- ・補助予定額：1,123億円

ふくしま産業復興企業立地支援事業の活用事例



共同印刷株式会社(郡山市)
・平成25年6月に工場を郡山市に新設し、印刷業に係る新しい機械設備を導入。

工場の外観



タニコー株式会社(郡山市)
・小高工場内に、業務用厨房機器製造に係る新規事業を行うための機械設備を導入。

製造現場

18

- 被害を受けた漁業者等に対し、漁船や定置網などの漁具の導入費や冷凍冷蔵施設などの整備費を補助するほか、経営再建に必要な経費を助成。
- 共同利用漁船・共同利用施設の新規導入を契機とする協業化や加工・流通業との連携等を促進するとともに、省エネ・省コスト設備の導入等による安定的な水産物生産体制の構築を目指す。

漁船などに被害を受けた漁業者のために、漁業協同組合などが漁船、定置網などの漁具を導入する場合に、国は、事業費の1/3を補助し、あわせて都道府県が事業費の1/3以上を補助。

＜共同利用漁船等復旧支援対策事業＞

(平成23年度補正予算387億円、平成24年度当初予算39億円、平成25年度当初予算29億円、平成26年度当初予算案17億円)

被災した漁業者等の共同利用施設(荷さばき施設、加工処理施設、製氷貯氷施設、養殖施設、放流用種苗生産施設等)や漁港環境の復旧に必要な施設を整備する場合、国が事業費の2/3、又は半額を補助。

＜水産業共同利用施設復旧整備事業＞

(平成23年度補正予算731億円、平成24年度当初予算100億円、平成25年度当初予算82億円、平成25年度補正予算21億円、平成26年度当初予算案78億円)

地域の漁業者、養殖業者などが、新しい操業形態の導入や養殖業の共同化など、安定的な水産物の生産体制を構築する場合、必要な経費(人件費、燃油費、販売費など)について、水揚げ金額では賄えない部分の9/10、2/3、又は半額を国が支援。

＜がんばる漁業・養殖業復興支援事業＞

(平成23年度補正予算805億円、平成24年度当初予算103億円)

共同利用漁船等復旧支援対策事業の実績

	漁船	定置網
○北海道	22隻	
○青森県	82隻	9ヶ統
○岩手県	6,324隻	193ヶ統
○宮城県	2,722隻	48ヶ統
○福島県	162隻	
○茨城県	2隻	1ヶ統
○富山県	7隻	
○三重県		6ヶ統

※H26年3月末時点復旧数
※「ヶ統」とは、定置網を数える単位

活用事例



採介漁漁船(岩手県宮古市)

平成23年7月、漁協から漁業者に引渡し。

※船上からヤス等を用いて貝類や海藻を採捕するための漁船

水産業共同利用施設復旧整備事業の交付実績

○北海道	3件	5億円
○岩手県	285件	326億円
○宮城県	238件	315億円
○福島県	5件	2億円
○茨城県	1件	5億円
○千葉県	3件	0.3億円

※H26年3月末時点
※件数は事業計画の数

活用事例



製氷・貯氷施設(宮城県気仙沼市)

平成24年3月交付決定。
平成24年10月中旬から稼働開始。

がんばる漁業支援事業の実績

○北海道	9業者	○茨城県	4業者
○青森県	3業者	○千葉県	3業者
○岩手県	10業者		
○宮城県	47業者		
○福島県	3業者		

※H26年4月末時点

活用事例



さんま権受網漁船(岩手県大船渡市)

平成23年12月、計画認定。平成24年10月から事業開始。

19

- 観光は、東日本大震災から復旧・復興していく上で、大変重要な役割を担っており、観光需要の回復に向け、太平洋沿岸エリアへの送客強化や観光地域づくりの基盤を整備する「東北地域観光復興対策事業」、東北・北関東を訪問することにより復興を応援する「東北・北関東への訪問運動」を実施。
- 福島県における早期の観光復興を最大限に促進するため、同県が実施する風評被害対策及び震災復興に資する観光関連事業を支援するための補助金の交付を実施。
- 訪日外国人向けに、海外での観光イベントの開催、海外メディアや旅行会社の招請等の取組を実施。

東北地域観光復興対策事業

- ・東北は依然として観光需要の厳しい地域であることから、東北地方の太平洋沿岸エリアへの送客強化や観光地域づくりの基盤整備を実施。

福島県における観光関連復興支援事業

- ・福島県が実施する風評被害対策等に資する観光関連事業を支援するため、平成26年4月に観光関連復興支援事業費補助金の交付を決定。

東北・北関東への訪問運動

- ・東北、北関東の訪問につながる政府関連事業や民間イベント等による復興支援運動を実施。

ビジットジャパン事業による風評被害対策

- ・正確で海外消費者の目線に立った情報の発信。
- ・東北・北関東への訪日外国人旅行を促進するため、メディア招請や旅行会社との共同広告などを効果的に実施。

これまでの取組

東北地域太平洋沿岸エリア

情報発信ポータルサイト「東北物語」

- ・東北地域の太平洋沿岸エリアにおける復興に向けた最新の取組や旬の話題等について、観光関係者主体ではなく、地域住民が主体となって情報発信。



モニターツアーによる送客支援

- ・「旅の市場」ファイルサーバを設置し、サーバ内に地域関係者が滞在コンテンツ情報を登録し、ツアーを造成する旅行会社等へ提供できる仕組みを構築。

東北観光がんばります！！

～東日本大震災から3年～シンポジウムの開催

- ・東日本大震災から3年という節目を迎えるにあたり、国・東北6県知事・官民の観光関係者によるシンポジウムを平成26年3月2日に仙台市で開催。

ビジットジャパン事業による風評被害対策

- ・韓国ソウル及び周辺3大都市（仁川・大田・水原）で東北観光PRイベントを開催。東北・北関東の食品の安全性をPRするとともに、元気な東北・北関東を知ってもらうために東北の夏祭り等も紹介。




20

2-4-2 被災事業者に対する資金繰り対策

中小・小規模事業者向けの融資・保証として、東日本大震災復興特別貸付266,052件、東日本大震災復興緊急保証104,824件(H23年5月23日～H26年3月末日)。農林漁業者向けの融資については7,329件貸付決定、保証については2,472件(H23年5月2日～H26年2月末日)。

中小・小規模事業者向け融資


東日本大震災復興特別貸付	H23年5月23日～H26年3月末日
災害復旧貸付	H23年3月14日～H23年5月22日
セーフティネット貸付	H23年3月14日～H23年5月22日

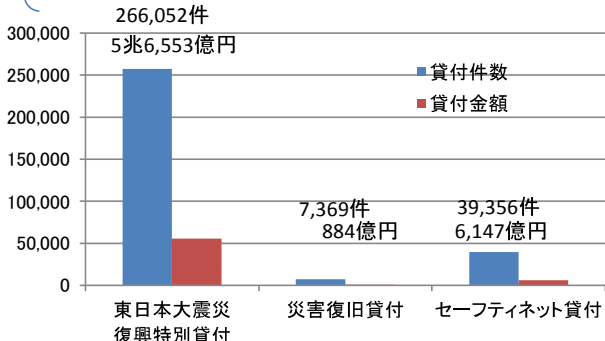


出典：中小企業庁HP「東日本大震災後の資金繰り支援策の実施状況」(<http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/earthquake2011/index.htm>)

中小・小規模事業者向け保証


東日本大震災復興緊急保証	H23年5月23日～H26年3月末日
災害関係保証	H23年3月14日～H26年3月末日
セーフティネット保証5号	H23年3月14日～H26年3月末日

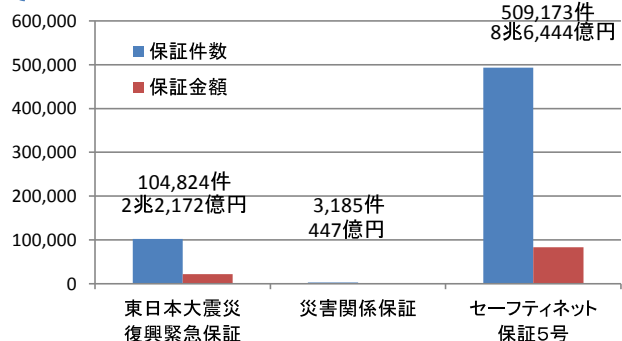

農林漁業者向け融資(貸付決定済)(H23年5月2日～H26年2月28日)

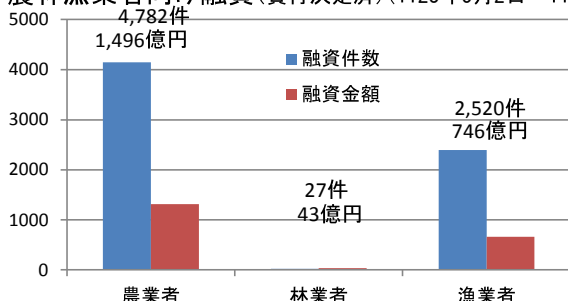

農林漁業者向け保証(H23年5月2日～H26年2月28日)

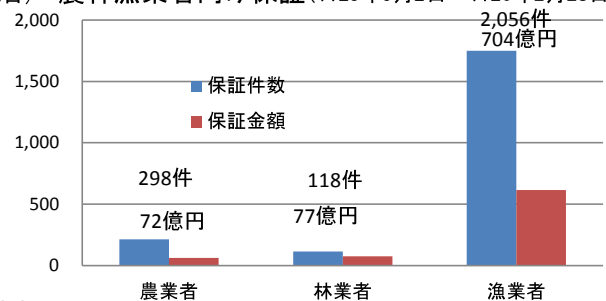

21

○ 中小企業者等の二重ローン問題については、震災支援機構及び産業復興機構が連携して対応。

被災事業者（震災により過大な債務を負っている事業者）

各県の産業復興相談センター/産業復興機構

○支援対象
中小企業者等
・被災各県に設置され、各県の
実情に応じた対応を実施

（出資金※）

- 岩手産業復興機構（23年11月11日設立）：100億円
 - 宮城産業復興機構（23年12月27日設立）：100億円
 - 福島産業復興機構（23年12月28日設立）：100億円
 - 茨城産業復興機構（23年11月30日設立）：50億円
 - 千葉産業復興機構（24年3月28日設立）：20億円
- ※出資約束金額総額ベース

連携/案件の引継ぎ

東日本大震災
事業者再生支援機構
（震災支援機構）

○支援対象
産業復興機構による支援の
対象とすることが困難なもの
・小規模事業者、農林水産事業者、
医療福祉事業者を重点的な対象とする

資本金：200億円
債権買取資金：5,000億円（政府保証枠）
対象地域：岩手、宮城、福島各全県その他、北海道、
青森、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野、
群馬、東京、静岡の各都道府県の一部市町村
（14都道府県、351市町村）

【両機構の実績】

○産業復興相談センター・機構（5月16日現在）

	岩手県	宮城県	福島県	その他	合計
相談件数	509	991	796	771	3,067
震災支援機構への引継	46	98	23	11	178
金融機関等による金融 支援の合意	135	176	74	171	556
うち買取決定数	94	99	33	28	254

○震災支援機構（5月16日現在）


	岩手県	宮城県	福島県	その他	合計
相談件数	376	841	247	331	1,795
最終調整中	30	75	35	35	175
支援決定数	112	204	34	75	425

22

（参考）東日本大震災事業者再生支援機構及び
産業復興相談センター・産業復興機構の概要


○東日本大震災事業者再生支援機構

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設立され、平成24年3月5日より業務開始。金融機関等からの債権買取や被災事業者に対する出資、事業再生の専門家の派遣等を通じて、震災により被害を受けた中小企業等の再生を支援。
対象地域は、14都道府県321市町村。

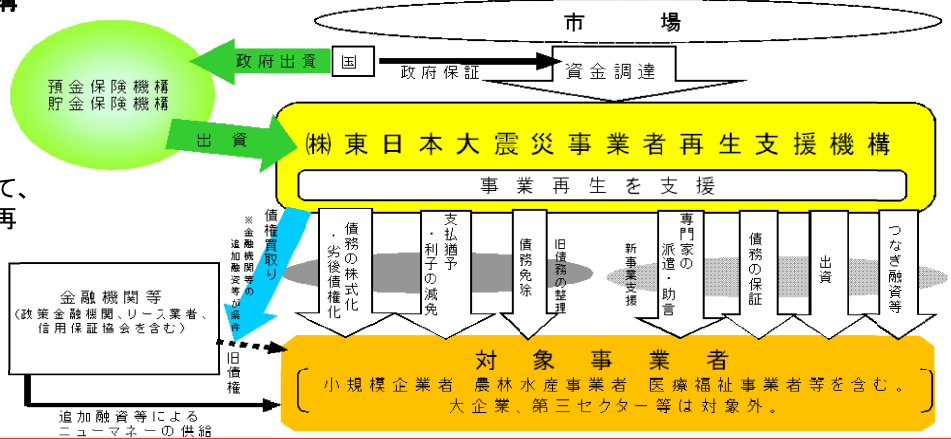

○産業復興相談センター/
産業復興機構

被災県（岩手・宮城・福島・青森・茨城・千葉）において、二重ローン問題に関する相談窓口となる産業復興相談センターを設置するとともに、債権買取等を行う産業復興機構（岩手・宮城・福島・茨城・千葉）を設立し、被災事業者の事業再生を支援。

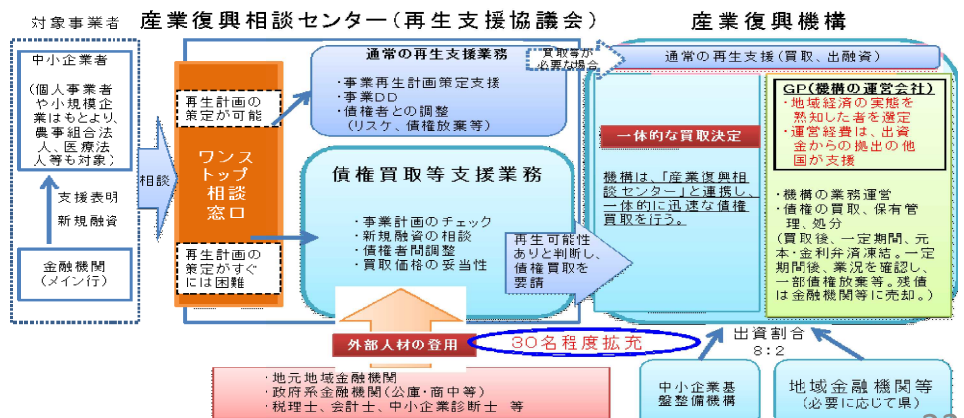

23

- 被災3県の雇用情勢は、全体として落ち着いてきているものの、沿岸部については人口減少等により震災前の水準まで回復していない地域もある。
- ミスマッチ(職種や産業などの求人と求職がかみあわない状況)の解消、産業政策と一体となった雇用創出により、被災3県の被災者の就職支援を推進。

・雇用のミスマッチ解消のため、きめ細かな就職支援や職業訓練を実施。

《ハローワークの就職支援》

産業政策や復興・復興需要で生じる求人をハローワークで開拓・確保するとともに、担当者制等により、個々の求職者に応じたきめ細かな職業相談の実施や、職業訓練への誘導を行う。

また、水産加工業の求人の充足については、工場見学会を実施するなどして、人材の充足につなげている。


【実績】23年4月～25年12月 **39万人以上の就職支援**

《職業訓練の機動的拡充・実施》

介護、情報通信等の職業訓練コースの他、建設機械の運転技能を習得する特別訓練コースを設定する。

【実績】24年度開講コースの受講者数 **11,421人**、特別訓練コースの受講者数 **468人**

○課題=ミスマッチ等
震災前と比較して建設業求人が増えているが、未経験者が就職困難。

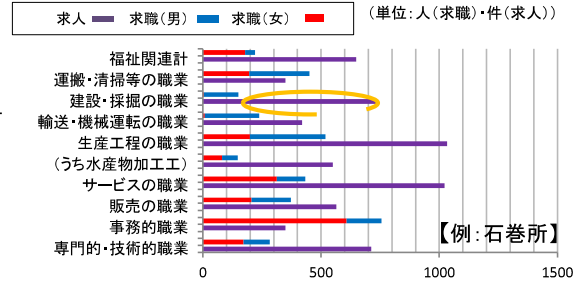

特別訓練コースの実施
(岩手県宮古市)

【平成25年12月末現在】
有効求人倍率：岩手1.11倍、宮城1.33倍、福島1.30倍
有効求人数：約12.9万件
有効求職者数：約10.2万人(※23年3月約12.5万人)
新規求人数：依然高水準(約4.9万件)
新規求職者数：減少傾向(約2.7万人)

・地域経済の再生復興のための産業政策と一体となって、本格的な安定雇用の創出に向け、雇用創出基金などを活用した雇用支援を推進。

(平成25年度補正予算で基金積み増し：448億円)

・事業復興型雇用創出事業により、**約1.4万人**(平成24年度実績)の雇用創出

2-5 復旧・復興の進捗情報の「見える化」

- 復興の加速化に向けて、復旧・復興の進捗状況を、被災者のニーズにあわせて分かり易くまとめ、情報共有を進め、見通しを明らかにしました。
- 関係機関を含めた情報ポータルサイトを作成。災害公営住宅等については地域毎に詳細情報を提供、随時更新。関係機関のHPも共通(復)「まるふくマーク」で分かり易くしました。

(1) 見える化のワンストップ(復興庁HP)

・復旧・復興の進捗状況に係る国、県、市町村等の情報をワンストップで見られるポータルページを提供。

【復興庁トップページ】


(2) 「つちおと情報館」の提供

・住宅・公共インフラに係る事業概要、定点観測写真、工程表、地図情報等の詳細情報を、お住まいの地域毎にまとめ、視覚的に分かり易く掲載、随時更新。
(14事業265箇所【平成26年5月現在】)

(3) (復)「まるふくマーク」の共通利用

・復興庁HPでは、復旧・復興の進捗情報を探し易く、分かり易くするため、(復)「まるふくマーク」を掲載。
・被災3県の県・市町村や、国の関係機関等のHPにおける共通利用を推進。
(賛同71機関【平成26年5月現在】)





※画面はイメージです。

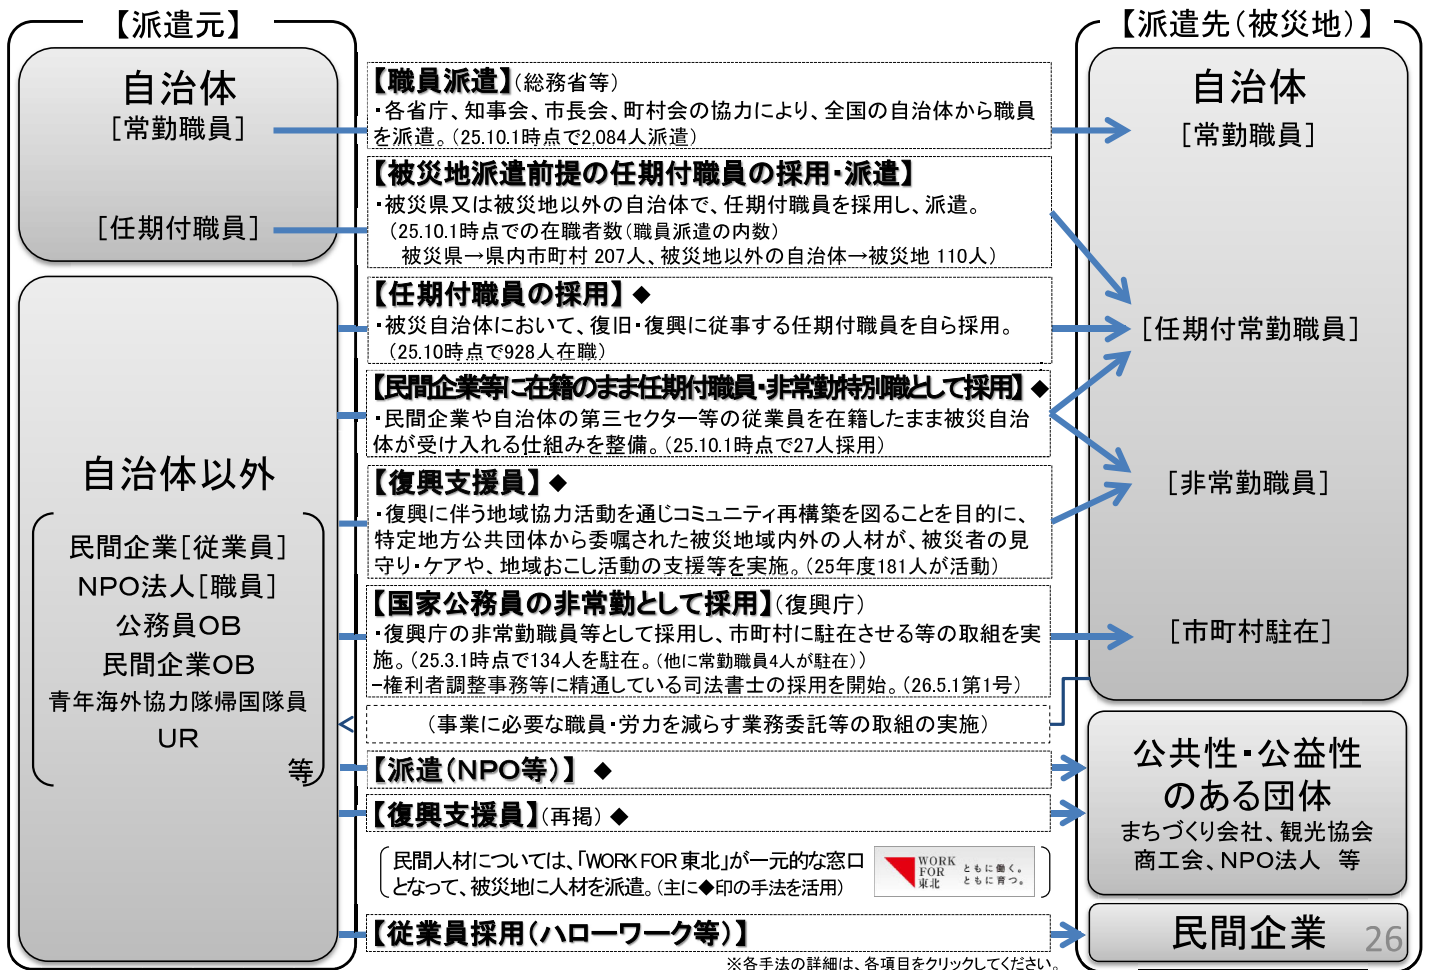

2-6-2 企業連携の推進

被災地の産業復興を後押しするため、復興庁では、民間企業と被災自治体、被災地企業と外部企業などが連携して展開する事業(企業連携事業)を次のような取組により支援している。

- 企業単体または企業間で連携して展開する事業のご相談を随時受け付け。
 例) 地元経済団体、金融機関などと連携して、商品・サービスの販売先や技術提携先などを紹介。
- 企業間の連携を生み出す対話の場を提供。
- 官民連携、企業間連携等により実施される事業のハンズオン支援を実施。
- 復興に関する事例集やメールマガジンの配信などの情報提供を実施。
- インターネットを活用したマッチング支援や復旧・復興に関する施策情報のデータベースを提供。

<p>企業連携プロジェクト支援事業</p> <p>国・被災自治体・民間事業者等が参加するプロジェクトの事業化(新商品開発や事業パートナー探し)を支援。</p>  <p>【支援実績】 平成25年度は7件のプロジェクトを支援。(平成24年度:7件支援)</p>	<p>地域復興マッチング「結の場」</p> <p>被災企業の抱える課題を解決するため、大手企業等の経営資源とのマッチングを行う「結の場」を開催。</p>  <p>【開催実績】 平成24年11月28日石巻市 平成25年 2月13日気仙沼市 平成25年11月 7日南三陸町 平成25年12月 4日亘理町・山元町 平成26年 1月29日宮古市 平成26年2月6日福島市</p>
<p>復興事業事例その他の情報発信</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 企業による復興事業事例集を作成・公表。 ➢ メールマガジンを発行し、定期的な情報提供。 ➢ 国内外で復興の現状に係る企業向け説明会等を実施。  <p>平成24年7月に開催された復興支援・対日投資フォーラム(米国)の様子</p> <p>「被災地での55の挑戦 -企業による復興事業事例集-」平成25年4月</p>	<p>インターネットを活用した事業者支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ (財)全国中小企業取引振興協会が運営するビジネスマッチングサイトと連携して、被災事業者の販路開拓等のマッチングを支援。 ➢ 復興庁が運営する「復旧・復興支援制度データベース」により、事業者が活用可能な各省庁及び自治体の支援制度の情報を提供。  <p>復旧・復興支援制度データベース URL:http://www.r-assistance.go.jp/</p>

- NPO等のボランティア活動に対する被災地のニーズが多様化している中、ボランティア活動のニーズとその果たしている役割は依然として大きい。
- 多様なニーズに柔軟に対応するため、行政・民間それぞれの多様な担い手が連携して取り組む必要がある。
- このため、NPO、ボランティア団体等が活動を円滑に進めるために必要な情報の提供や連絡調整、震災ボランティアの啓発・普及等を行っている。




1. 体制

○ NPO等に精通した民間出身の非常勤職員の知見を活用するとともに、岩手・宮城・福島の各復興局に「ボランティア・NPO等担当」を配置。

2. 役割

- 政府の取組に関し、NPO等への情報提供。
- 復興に当たって行政・民間それぞれの多様な担い手の連携促進と、連携事例の収集・情報提供。
- ボランティア活動全般の促進。
- NPO等の活動に係る制度・手続きに関し、関係府省との相談・調整。

3. 主な取組内容

情報提供	多様な担い手の連携促進	ボランティア活動全般の促進
<p>○ NPO等が息の長い支援活動を行えるよう、活用可能な政府の財政支援策を取りまとめ、被災3県での説明会や全国のNPO等が集まる会議等で周知。</p>  <p>平成25年2月に開催された説明会（いわて連携復興センター主催）</p>	<p>○ 行政・民間それぞれの多様な担い手が連携して復興にあたるために参考となる「ロードマップ」を作成し、NPO等やその中間支援組織に説明。</p> <p>○ また、「多様な担い手による連携事例」を公表・周知。</p>  <p>「ロードマップ」及び「連携事例（第2版）」</p>	<p>○ ボランティア活動に携わる方々に、被災された方に寄り添う気持ちを持ち続け、被災地で更に活躍してもらうため、学生等に向けたキャンペーンやNPO等に向けたメッセージを発信。</p>  <p>「東北に行っただよ。～この夏も、ボランティアに行こう！～」キャンペーン</p>

● 社会福祉協議会が運営する災害ボランティアセンターに登録し活動したボランティア総数（被災3県）

岩手県	宮城県	福島県	3県計
約49万人	約68万人	約18万人	約135万人

平成23年3月11日～平成26年3月30日までの累計
 ・その他、NPO等の団体を通じ独自に活動しているボランティアも多数。
 ・発災当初は泥やガレキの撤去、避難所における炊き出し等が活動の中心だったが、その後は地元NPO等を中心に、心のケアやコミュニティづくり支援、さらには復興に向けたまちづくり支援など息の長い取組を展開。

2-6-4 「新しい東北」の創造に向けて①

- 被災地は、人口減少や高齢化等、今の日本が抱える課題が顕著。
- このため、単に従前の状態に復旧するのではなく、復興を契機にこれらの課題を解決し、我が国や世界のモデルとなる「創造と可能性の地」としての「新しい東北」を創造。

検討経過

- 昨年3月から、復興推進委員会で、5つの柱を中心に、地域社会の将来像について検討。6月5日に「『新しい東北』の創造に向けて（中間とりまとめ）」を公表。平成26年4月18日に「『新しい東北』の創造に向けて（提言）」を取りまとめ。
- ①元気で健やかな**子どもの成長**を見守る安心な社会
- ②「高齢者標準」による**活力ある超高齢**社会
- ③持続可能なエネルギー社会（**自律・分散型エネルギー**社会）
- ④頑健で高い回復力を持った**社会基盤（システム）の導入**で先進する社会
- ⑤高い発信力を持った**地域資源**を活用する社会

具体的な取組（平成25年度は復興推進調整費で対応。平成26年度予算には約16億円を計上。）

- 「新しい東北」先導モデル事業
幅広い担い手（企業、大学、NPO等）による**先駆的な取組を加速**するための取組。（平成25年度は66件の事業を選定・支援）
【例】次世代型地域包括ケア、地域課題に応じた津波防災訓練の開発、「旅館」ブランドの再構築、三陸ジオパークの観光資源化 等
- 「WORK FOR 東北」（日本財団・復興庁の共同事業）
被災地が必要とする**人材を、企業等から現地に派遣**するための取組。被災地（派遣先）と被災地外（派遣元）の双方のニーズをマッチング。企業向け説明会や個人向けイベントの開催、情報を共有・発信するウェブサイトの構築。
- 起業家への投資促進のためのプラットフォーム構築事業
被災地の**振興を進める事業参加を促進**するための取組。ビジネスコンテストの過程で、専門家による事業化に向けたアドバイスを実施。入選した事業提案の展示会を開催し、事業パートナーの発掘等を側面的に支援。
- 「新しい東北」官民連携推進協議会【会員数 約700法人・団体（平成26年4月現在）】
復興に携わる**多様な主体（企業、大学、NPO等）の連携を推進**するため、ウェブサイトや会員交流会等により、**効果的に情報の共有・交換**を行い、支援のマッチング、様々な主体間の連携、先進的な取組の横展開等のきっかけづくりの場を提供。

※ この他、地域の課題を解決する「工夫」や、地域の魅力を引き出す「こだわり」を持った災害公営住宅の設計を事例集としてまとめ、横展開を推進。

被災地で既に芽生えている先進事例を育て、横展開を進め、東北、ひいては日本のモデルとしていくため、様々な取組を包括的に支援。

※ H25年度（調整費）：9億円 H26年度予算案：15億円

＜復興庁＞
復興推進委員等の意見を踏まえ、対象プロジェクトを評価・選定

プロジェクト立ち上がり段階において必要なソフト面の取組を包括的に支援

＜被災地＞
・NPO等の法人
・事業者の組織する団体
・地方公共団体を構成員に含む協議会

平成25年度モデル事業 選定案件例


<p>子どもの成長を育む地域の遊び場づくり 地域のプレーリーダーによる遊び場づくりのモデル化と、公園等の身近な遊び場のあり方を検証。</p>	<p>「次世代型地域包括ケア」の推進 24時間対応の在宅医療・看護・介護等を目指し、自治体・NPO等が協働し、多職種連携システムを構築。</p>	<p>温泉熱を活かした六次化産業創出 植物工場や養殖施設において、温泉熱のエネルギーを活用した、新たなビジネスモデルを構築。</p>
<p>地域課題に応じた防災訓練モデル化 地域の危機管理能力向上を目指し、地域課題に応じた住民参加による避難訓練手法等のモデルを構築。</p>	<p>中山間地域における植物工場の活用 中山間地域の農業の所得向上を目指し、路地栽培では大規模化ができないところ、従来の品種に加え、植物工場を活用し、品種の拡大を検証。</p>	<p>「旅館」のブランド価値向上 グローバル市場における旅館の価値向上を目指し、海外からの予約が可能な旅館専用の予約サイトや、海外の旅行会社等との商流を活性化させる在庫管理システムを導入。</p>
<p>伝統技能と先端技術の融合によるなりわい再生 地域のものづくりの発展を目指し、伝統技能と先端技術を融合させ、新製品を開発。その際、障害者や高齢者の社会参画を促進。</p>	<p>「三陸ジオパーク」の観光資源化 三陸沿岸という広域の地質・地形に新たな付加価値を見出し、水産業や自然景観等の既存の資源と併せ、新たな観光資源化。</p>	<p>地域を支える起業家の育成・支援 地域を支える起業・創業の支援に向け、地域資源を活用したマッチングやベンチャーファンドといった仕組みを構築。</p>

他地域への横展開を進め、東北、ひいては日本のモデルとしていく

30

2-6-4 「新しい東北」の創造に向けて③
（「WORK FOR 東北」（復興人材プラットフォーム））

被災地が必要とする人材を、企業等から現地に派遣することを目的とした取組。（マッチングの実施、関係情報の共有・発信）



この他、情報を共有して連携を図る場（復興人材支援協議会※）を設置。
※主な構成員：経済団体、被災自治体、日本財団、NPO等、関係省庁（復興庁、総務省）

31

ビジネスコンテストを通じて、**広く被災地における事業提案を募集するとともに、専門家のアドバイスや金融機関等との連携により、事業化に向けた支援を実施。**

＜ビジネスコンテストの実施＞

被災地内外から
広く事業提案を募集

選考過程での専門家等からの
アドバイス、金融機関等との連携により、
事業化に向けた支援

被災地における
・起業促進
・民間投資促進

平成25年度表彰案件

【大賞】＜デジタルブックプリント株式会社＞
水産版カンバン方式魚介類の高鮮度維持輸送システム

高熱性を有する輸送器具による物流システムを構築。輸送コスト低減とともに、被災地の地域資源を高付加価値化し、被災地の水産業の復興を図る。



【大賞】＜一般社団法人WATALIS＞
中古着物生地によるリメイク雑貨製造販売事業

着物中心とした古着を活用して、被災者がリメイク・製品化を行うことにより、雇用の場の確保とともに、コミュニティの再構築を図る。



【審査員応援賞】
＜一般社団法人リプラス＞
人口2万人の町でも成立する「高齢者の生活機能回復促進事業」+「交流促進事業」

東北沿岸部の過疎地域をターゲットに、介護サービス事業の展開とともに、介護予防トレーニングやその効果的な運用のための人材育成、地域交流を図る。

【審査員応援賞】
＜一般社団法人天然住宅＞
地域資源を活用することで地域経済復興にも資する、エコな「復興まちづくり」普及事業

被災地外企業と被災地の気仙大工組合が連携の上、被災地の地元木材・伝統技法を活用し、比較的安価な住宅建設の促進を目指す。

【審査員応援賞】
＜いわきおてんとSUN企業組合＞
いわきおてんとSUNプロジェクト

- ①コットンの有機栽培、コットン商品の開発・販売
- ②市民参加型の太陽光発電事業（コミュニティ電力）
- ③復興スタディーツアーの実施

32


被災地で事業展開されている多様な主体（企業・大学・NPO等）による取組について、情報の共有・交換を進め、様々な連携を推進

設立発起人

- 経済団体
経団連会長、同友会代表幹事、日商会頭
- 金融機関
政投銀社長、3メガ(みずほ、BTMU、SMBC)の頭取等、
信金中金理事長、全信組連理事長、
地銀(岩手、七十七、東邦)の頭取
- 自治体
岩手県知事、宮城県知事、福島県知事
- 大学
岩手大学長、東北大総長、福島大学長
- 連携復興センター
いわて連復、みやぎ連復、ふくしま連復の代表等

「新しい東北」官民連携推進協議会

- 代表：経団連会長、同友会代表幹事、日商会頭
副代表：その他の設立発起人団体のトップ等
会員：約700の団体・法人の役員等（平成26年4月時点）
・経済団体（商工会議所、商工会等） ・各種協同組合（信金、信組等）
・民間企業（経済団体所属の企業） ・NPO法人（連復の推薦法人）
・公益社団・財団法人 ・独立行政法人、大学等 ・地方自治体 ・関係省庁
- 事務局：復興庁（一部、みずほ総合研究所株式会社に委託）
活動内容：専用ウェブサイトでの情報共有・交換（1月21日に公開）
会員交流会の開催（3月16日に開催）等



■ 人口減少・高齢化などの地域の課題を解決する「工夫」や、地域の魅力を引き出す「こだわり」を持った災害公営住宅の設計を事例集としてまとめ、展開。

[主な設計事例]

(1)コミュニティ形成への配慮

(新しい東北「高齢者標準(低下した高齢者の身体・認知機能を標準とする)による活力ある超高齢社会」)


- 各住戸南側に縁側を設置し、歩行者と居住者の日常的な交流を生み出す。[岩手県大槌町大ケロ地区]



(2)子育て・見守り

(新しい東北「元気で健やかな子どもの成長を見守る社会」)

- 2階レベルの回廊に、幼児が安心して遊べるミニモン空間(こどもひろば)を設置。[岩手県陸前高田市下和野地区]



(3)自然再生エネルギーの採用(エコタウン)

(新しい東北「持続可能なエネルギー社会(自律・分散型エネルギー社会)」)


- 太陽光パネルによる発電電力を共用部へ供給。LED照明を採用し、環境負荷を低減。停電時も利用可能。[宮城県女川町陸上競技場跡地地区]



(4)防災、安心・安全

(新しい東北「頑健で高い回復力を持った社会基盤(システム)の導入で先進する社会」)

- 安全性に配慮し2階以上に住宅を配置。屋上には避難スペース、防災倉庫を整備し、周辺にお住まいの方も一時避難が可能な地域の防災拠点。[宮城県多賀城市桜木地区]




(5)地域の魅力を支援

(新しい東北「高い発進力を持った地域資源を活用する社会」)

- 漁業での作業用合羽や胴長靴を掛けるための土間兼掛下げ場を設置。また、仕事着のまま移動できる動線を確保し利便性を向上。[宮城県女川町離半島部地区]



2-7-1 福島復興に向けた制度対応等① (復興施策体系)

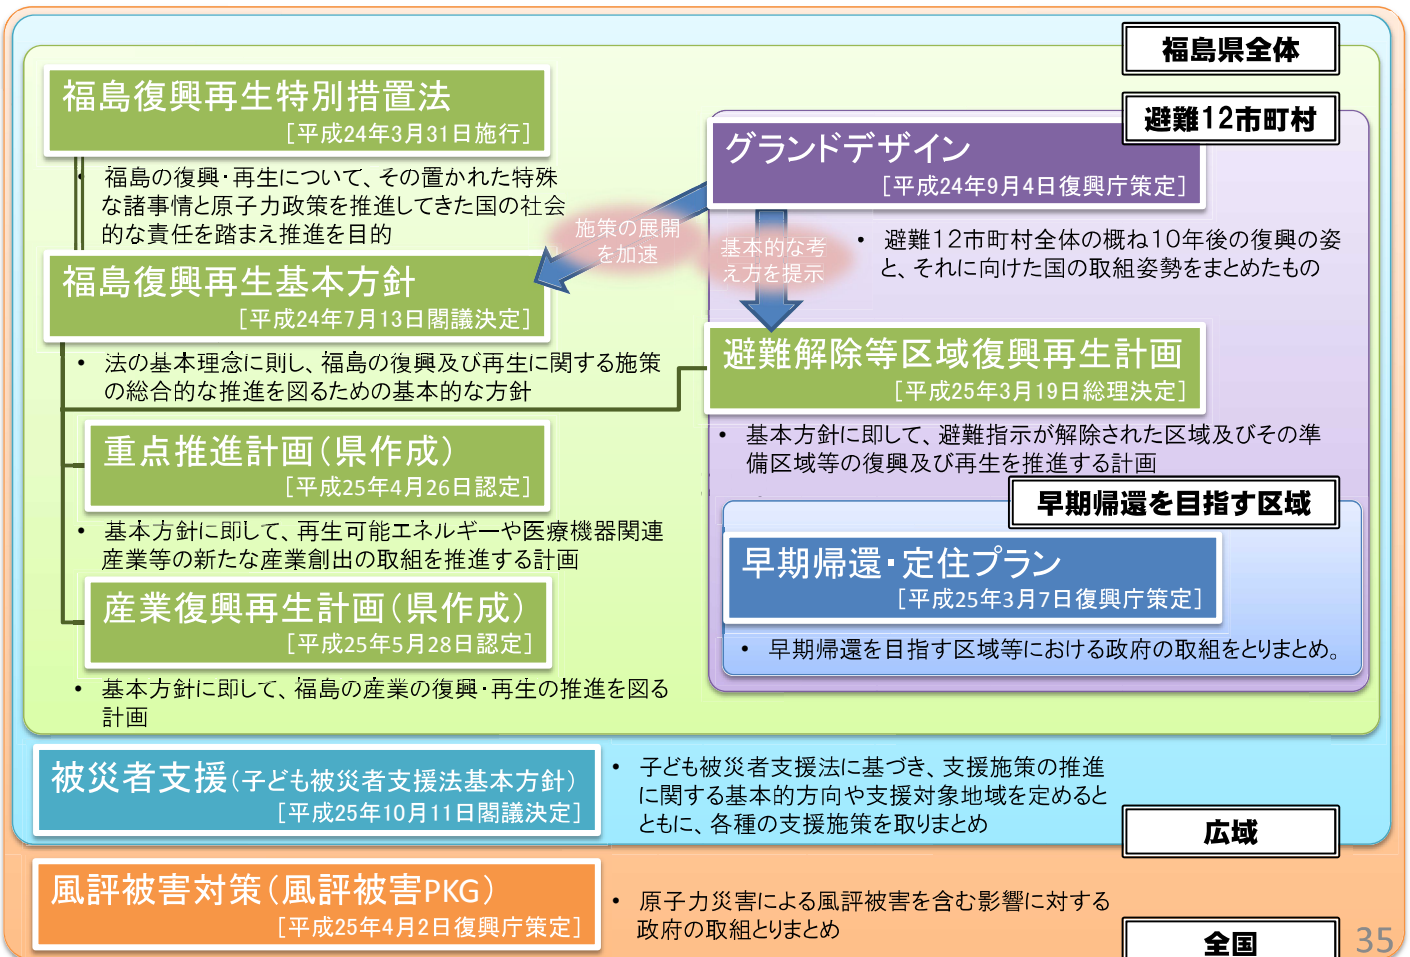

（平成25年3月7日公表）

- 国は避難指示解除を待つことなく、前面に立って以下の施策を速やかに実行に移す。
- これにより、今後1、2年で帰還を目指すことが可能となる区域等において、避難住民の早期帰還・定住を実現する。



<プランの内容>

①生活環境の整備

- ・医療・福祉体制の確保
- ・商業施設の再開
- ・その他、地元ニーズに対応したきめ細やかな対応（避難住民の再会、コミュニティバス運行等）

②産業振興・雇用の確保

- ・立地補助金や税制優遇措置による企業の誘致・再開
- ・廃炉等の研究開発拠点の整備等

③農林水産業の再開

- ・復旧を迅速に進めるための技術職員の派遣
- ・営農再開に向けた農地の保全管理の取組等

住民の生活再開にあたって取り組むべき3つの重点分野

①インフラの早期復旧

- ・工程表に基づく復旧／福島特措法の改正 等

②災害廃棄物等の処理の着実な実施

- ・避難指示解除準備区域を優先的に実施 等

③除染・中間貯蔵施設の着実な進展

- ・除染の着実な実施／除染と復興関連目的の同時達成に向けた取組／中間貯蔵施設についての丁寧な説明 等

④安全・安心に向けた取組

- ・福島第一の安全性確保／廃炉の確実な実施／リスクコミュニケーション／きめ細かな放射線モニタリング 等

⑤十分な予算の確保と柔軟な執行：福島復興再生総局による即断即決／技術的な専門人材の派遣 等

⑥賠償の丁寧かつ迅速な対応：住民の生活再建が一日も早く進むよう、円滑な賠償を実施 等

今後の流れ

○ 今後1、2年のうちに住民の帰還のために必要な環境整備を行うべき区域を擁する自治体について、順次、早期帰還に向けた具体的な筋道を示す工程表を策定し、時間軸を示しながら取組を進める。

2-7-1 福島復興に向けた制度対応等③
（「「早期帰還・定住プラン」に基づく工程表」のポイント）

- 原子力災害被災自治体の置かれている状況が異なることを踏まえ、住民の帰還・定住を加速するための取組を自治体毎に整理し提示（平成25年12月までに 広野町、楡葉町、川内村、田村市について公表）。
- 国、県、市町村等の関係者が時間軸の下で全体の工程を共有。
- 住民の方々にとって帰還のために必要な環境の整備の進捗状況、今後の見通しを具体的に提示。

・ 川内村の例
新たに整備している特別養護老人ホームについて、平成26年度中に入居を開始する旨記載

整備すべき生活環境	環境整備の目標及び主な実施内容	平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度以降	村担当課	
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
医療・福祉 福祉・介護	【目標】 ・村内で必要な福祉・介護サービスが受けられるようにする。															
	【主な実施内容】 ① 「ゆふね」内のデイサービスを回復する。 《平成24年4月から実施中》					ゆふねのデイサービスの回復、提供									→	
	② 訪問介護体制を充実・強化する。（登録ヘルパー数 2名→5名）《平成26年度から実施予定》									訪問介護体制の充実・強化					→	
	③ 新たに特別養護老人ホーム（80床）を開設する《平成26年度中入居開始》					特別養護老人ホーム設計・造成								→	建設	入居開始

※実際の工程表とレイアウトは若干異なる。


事業概要・目的

- 福島は、区域見直しが全域で完了し、今後は避難指示解除を経て、住民帰還、更には新規転入も含めて、復興の新たな段階を迎える。
- 復興の動きを加速するために、町内復興拠点整備、放射線不安を払拭する生活環境の向上、健康管理、産業再開に向けた環境整備等の新たな施策と、現行では個別に実施していた長期避難者支援から早期帰還までの対応策を一括し、「福島再生加速化交付金」を、福島復興の柱として新たに創設する。
- 既存の交付金と併せて大括り化し、事業メニューを多様化することで、使い勝手が良く、より広きめ細かなニーズに対応可能となる。他の事業とも連携させつつ、福島再生加速化の原動力として活用する。

事業イメージ・具体例

- (1) 対象区域: 避難指示を受けた12市町村等(各事業に応じて対象地域を設定)
 - (2) 対象事業
 - 【既存交付金等】
 - 長期避難者の生活拠点の形成
 - ・災害公営住宅の整備 等
 - 福島定住対策
 - ・子どもの運動機会確保(全天候型運動施設の整備)等
 - 地域の希望復活応援事業(帰還加速事業)の一部
 - 【新たに追加する施策】
 - 町内復興拠点等、生活拠点の確保(公的賃貸住宅整備等)
 - 放射線不安を払拭する生活環境の向上
 - 放射線への健康不安・健康管理対策
 - 社会福祉施設の整備
 - 営農再開等に向けた環境整備(農地・農業用施設の整備等)
 - 商工業再開に向けた環境整備(産業団地整備等)
- 一括化

資金の流れ



期待される効果

- 長期避難者の生活拠点整備、福島への定住支援、帰還加速のための生活環境向上や生活拠点整備等を一括して支援することにより、今春以降、一部地域から避難指示解除が始まることが期待される福島被災地の復興・再生を加速することが期待できる。

○は既存交付金、◎は新規事業

生活拠点の確保

- 町外コミュニティ(復興公営住宅)の整備
(既存予算(コミュニティ復活交付金)の継続)
 - ◎ 町内復興拠点の形成
(帰還者、新規転入者のための公的賃貸住宅の整備)
- 【町内外の復興拠点整備、コミュニティ形成】



健康管理・健康不安対策、社会福祉施設整備

- ◎ 個人線量計の配布、線量のデータ収集・分析
- ◎ 放射線・健康・生活に係る相談員の配置
- ◎ 介護福祉施設、児童福祉施設等の整備



【相談員配置】



【個人線量計配布】



【介護福祉施設整備】

生活環境の向上

- ◎ 線量低減効果のある、又は放射線不安を払拭するきめ細かな生活環境向上(花壇、道路側溝有蓋化、遮蔽板等)
- ◎ 安心できる生活用水の確保(簡易水道整備、井戸掘削等)
- 全天候型運動施設の整備
(既存予算(子ども元気復活交付金)の継続)

【花壇設置(線量遮蔽)】



【全天候型運動施設整備】



【生活用水確保】



農林水産業、商工業再開に向けた環境整備

- ◎ 農地・農業用施設等の生産基盤及び生活環境の整備
- ◎ 産業団地等の整備、事業所等の整備

【農地整備】



【産業団地等の整備】





長期避難者等のための生活拠点の検討に当たって

1. 復興計画の策定

各町において、長期避難者対策等を策定
飯舘村(H24.8),大熊町(H24.9),富岡町(H24.9),
浪江町(H24.10),葛尾村(H24.12),双葉町(H25.6)

2. 住民意向調査の実施

国、県、避難元市町村において、長期避難者に対する支援策の具体化等のため、今後の生活再建に向けた意向等を把握

3. 長期避難者等の生活拠点の検討のための協議会

国、県、受入市町村、避難元市町村において、生活拠点整備のための諸課題等を検討

- 長期避難者等の生活拠点を確保するため、移転期間、移転規模、整備方法、制度的課題等について検討・調整 他

交付金制度の創設

「コミュニティ復活交付金」

平成25年度当初予算 503億円※1
平成25年度補正予算 512億円の内数※2
平成26年度当初予算 1,088億円の内数※2

※1 旧長期避難者生活拠点形成交付金
※2 福島再生加速化交付金の内数

復興公営住宅の整備

原発避難者向けの復興公営住宅を整備

基盤整備等の推進

避難者の増加に対応する道路改良や
学校施設整備などの実施

新たな
生活拠点
への移転

- 復興公営住宅の整備を中心に、受入市町村の基盤整備等を推進
- コミュニティ維持などの避難者支援のためのソフト施策を一体的に実施


ソフト施策の実施
上記と一体でコミュニティ維持や健康管理などのソフト施策を実施

40




長期避難者の生活拠点の検討のための協議会

- ◆ 設置趣旨 避難期間が長期に及び避難者等のための生活拠点の確保、整備等に向けた検討を促進するため、国、福島県、避難指示区域が設定されている、または、かつて設定されていた市町村（避難元市町村）及び避難元市町村からの避難者を受け入れている市町村（受入市町村）からなる協議会を設置する。
- ◆ 協議事項 長期避難者等の生活拠点を確保するため、移転期間、移転規模、整備方法、制度的課題等について検討・調整 他
- ◆ 構成

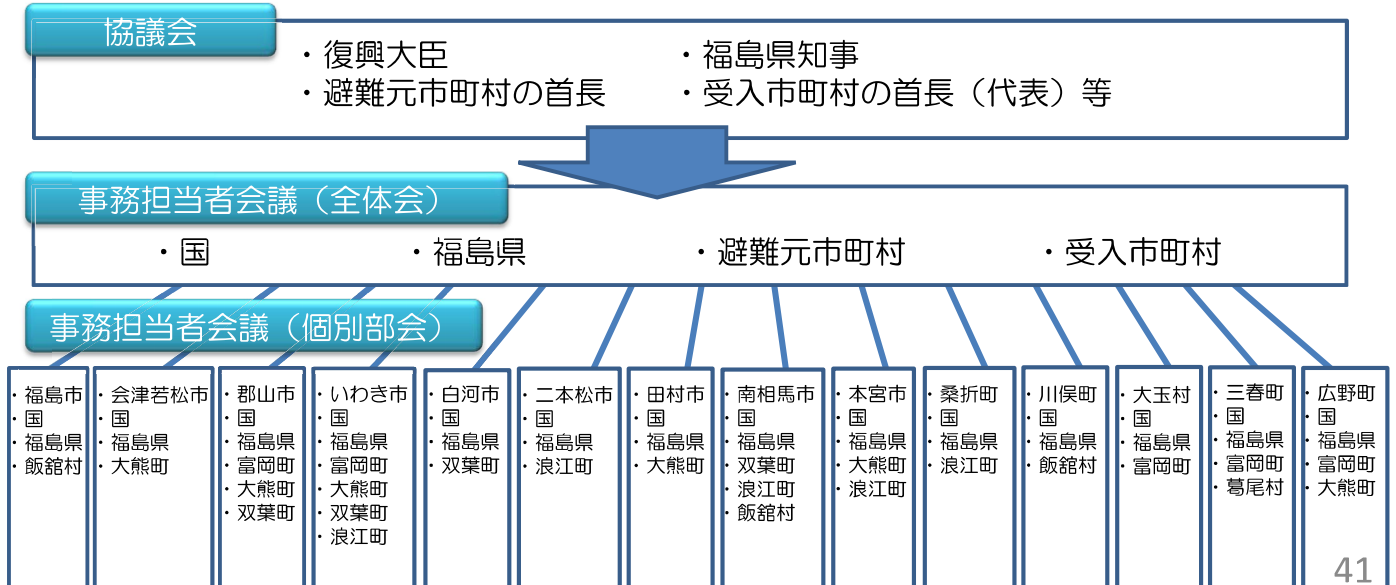

41

スケジュール

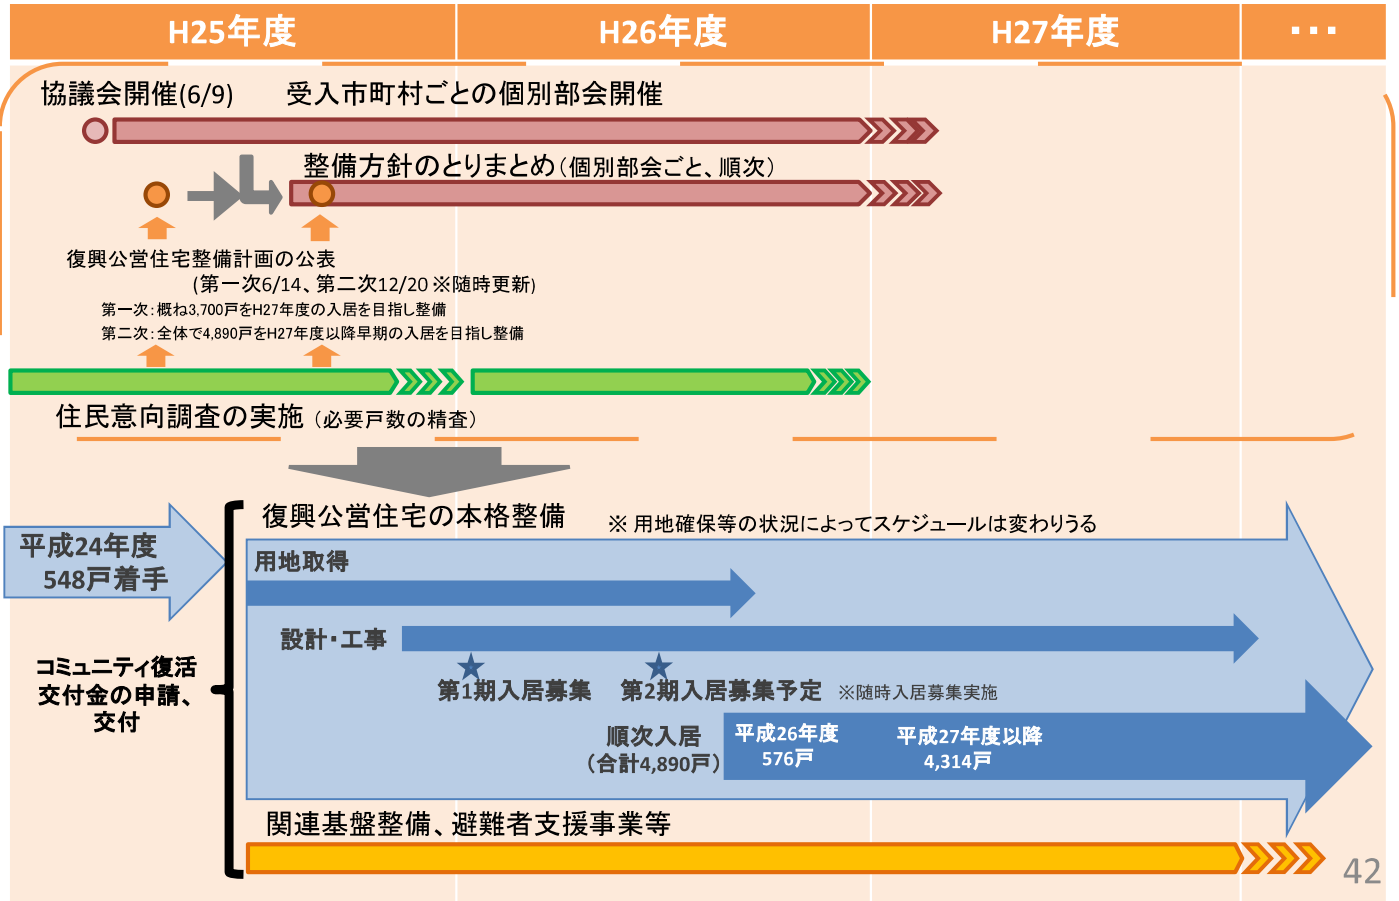

復興公営住宅の整備計画

これまでに実施した住民意向調査の結果を基に、復興公営住宅の概ねの整備戸数を算出。今後の住民意向調査の結果等により、適宜見直しを実施。(※平成25年12月20日付けで整備戸数の見直しを実施。)

整備戸数:全体で**4,890戸**

福島市	会津若松市	郡山市	いわき市	二本松市	南相馬市	川俣町	三春町	桑折町、大玉村、川内村ほか
430戸	100戸	570戸	1,760戸	340戸	900戸	170戸	220戸	400戸

進捗状況

(平成26年5月23日時点)


既に3,741戸の整備に着手。平成26年秋頃から順次入居予定。

市町村	予定戸数	事業主体
福島市	144戸	福島県営・飯館村営
会津若松市	100戸	福島県営
郡山市	570戸	福島県営
いわき市	1,562戸	福島県営
二本松市	270戸	福島県営
田村市	18戸	福島県営
南相馬市	564戸	福島県営
本宮市	61戸	本宮市営※1
桑折町	25戸	桑折町営※1
川俣町	118戸	福島県営・川俣町営※2
大玉村	67戸	大玉村営※1
三春町	217戸	福島県営・葛尾村営
川内村	25戸	川内村営※2


※1 避難元市町村との協定に基づくもの
※2 町村内の避難指示区域内からの避難者のための住宅

コミュニティ復活交付金(福島再生加速化交付金(長期避難者生活拠点形成))を活用して、復興公営住宅の整備を中心に、避難者受入れに伴う基盤整備、避難者支援のためのソフト施策を一体的に実施し、生活拠点を形成。

入居予定時期



復興公営住宅モデルルーム(いわき市小名浜)



復興公営住宅イメージ(県営桜ヶ丘団地(喜多方市))

子どもの運動機会の確保に向けて

平成25年度に創設した「子ども元気復活交付金」の活用により

- ・ 原発事故の影響により減少した子どもの運動機会を確保するため、地域の運動施設、遊具の更新等を実施。
- ・ 運動施設等のハード整備と一体的なソフト事業(プレイリーダーの養成等)も実施可能。
- ・ 本宮市のスマイルキッズパークのリニューアルなど、運動施設36カ所、遊具の更新539カ所を採択。

(注)平成25年度補正予算より福島再生加速化交付金に統合

多様な運動機会の創出
【本宮市】

- ・ 子どもたちが安心して遊ぶことができる場所として、既存の屋内運動施設(スマイルキッズパーク)を増築し、平成25年11月にリニューアルオープン。
- ・ ハード整備に加えて、子どもがいきいきと遊ぶことのできる環境をつくる「プレイリーダー」を養成することで、子どもたちやその親たちが安心して活動できる空間を提供。
- ・ 屋内運動施設に併せて、隣接する「記念樹の杜」にて、屋外遊び場を整備することにより、多様な運動機会を提供予定。



リニューアルオープン時の様子 プレイリーダー養成研修 屋外遊び場の整備イメージ

体力向上に向けた遊具更新
【田村市など】

公園や小学校において、遊具の更新を行う際に、子どもたちが楽しみつつ、体力向上も期待できるクライミング遊具を設置。



2-7-2 個別課題への対応③

(避難指示解除準備区域等の公共インフラの本格的な復旧(工程表))

- 警戒区域等が見直された市町村を中心に、公共インフラ復旧の工程表を作成し、本格的な復旧に着手。
- 平成25年3月までに10市町村(広野町・田村市・川内村・南相馬市・楡葉町・飯舘村・富岡町・浪江町・葛尾村・川俣町)の工程表を段階的に作成し、関係各省、福島県、当該市町村ホームページにて公表。
- 事業の具体化に応じて対象事業を拡充し、節目節目で見直しも実施。
- 「早期帰還・定住プランの工程表」の策定に合わせ、被災施設の復旧のみならず、早期帰還に資する新たな整備事業も対象とした見直しを順次実施(平成25年11月より、広野町、楡葉町、川内村、田村市の見直し)。

工程表の内容

- ① 国、県、市町村等の事業を対象に作成。
- ② 対象事業ごとに、復旧・復興に向けた基本的考え方を記載。
- ③ 上記の基本的考え方に即して、対象事業ごとに復旧・整備の目標を工程図で表示。
- ④ 事業の進捗をわかりやすく示すため「前年度の成果」と「当年度の目標」を記載。

工程表の作成趣旨

- ① 当面3か年の復旧・整備の見通しを「見える化」し、帰還を目指す住民の方々や地域の関係者とも共有化すること。
- ② 工程表は、各施設管理者における進捗管理の基礎となるものであることから、各施設管理者において作成する。
- ③ 早期帰還に向けての具体的な道筋を示す「早期帰還・定住プランの工程表」の基礎となる。

対象事業及び作成単位

- 市町村単位で作成する事業(例)
海岸、河川、上・下水道、農地・農業用施設、市町村道、海岸防災林の再生、医療施設、学校施設 等
- 路線、施設単位等で作成する事業(例)
し尿処理施設、下水汚泥処理施設、廃棄物処理施設、国道・県道・常磐道、鉄道、漁港等 等

工程表公表の履歴

- H24.8~H25.3 : 南相馬市、田村市、川内村、広野町、飯舘村、楡葉町、富岡町、浪江町、葛尾村、川俣町 公表
- H25.6 : 平成25年度予算成立を踏まえ 10市町村見直し
- H25.11 : 川内村、広野町、楡葉町の見直し
- H25.12 : 田村市の見直し

■ 工程表のイメージ


	整備主体	被災/稼働状況	H24年度に実施したこと(成果)	H25年度に実施すること(目標)	H25年度			H26年度			H27年度			H28年度以降	備考・ポイント等
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月		
○○事業					←調査	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
※※事業					←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
△△事業					←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	

2-7-2 個別課題への対応④

(原子力災害による風評被害を含む影響への対策パッケージの概要)

- 復興庁において、平成25年度当初予算を中心に各省庁における取組(予算以外の取組を含む)を取りまとめ。(平成25年4月2日公表)
- 被災地域産の食品・農林水産物等の安全と消費者の信頼を確保するとともに、風評被害等の影響を受けている地域産業における新たな需要創出に向けた支援等を行う。

＜平成25年度上半期フォローアップ公表(平成25年11月22日)＞
 ○上半期の取組において、消費者の福島県産の農産物等の購入意欲の増加、東北地方の観光入込客数の低減傾向の鈍化や回復、さらに12か国で輸入規制を完全解除する等、国内外において風評被害対策に一定の効果が現れていることが確認できた。
 ○福島県では、県全体で米の全袋検査を実施(25年産米については、約933万袋を検査。99.9999%が基準値以内(平成25年11月20日現在))。
 ○水産物については、原発事故以降、40,989検体の検査を実施(平成25年10月31日現在)福島県において、98.3%が基準値以内(平成25年10月期)。

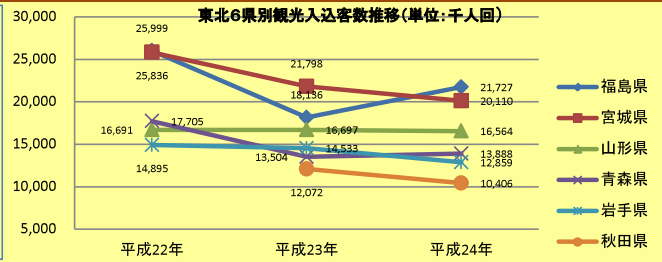

1. 放射性物質の確実な把握とコミュニケーションの強化

- (1)被災地産品の放射性物質検査の実施**
 - ・食品中の放射性物質の基準値の設定
 - ・被災地産品の放射性物質検査体制整備と検査実施
- (2)空間線量等の環境放射線量の把握と公表**
 - ・福島県内を中心とした放射線モニタリング体制整備
 - ・汚染水問題を踏まえた海洋モニタリングの強化と国内外への情報提供
- (3)正確で分かりやすい情報提供等コミュニケーションの強化**
 - ・食品中の放射性物質基準値、放射性物質による健康影響等に関する情報提供(シンポジウム、ミニ集会の開催、ポスター等の配布)
 - ・生産現場における放射性物質の吸収抑制対策(例:カリ施肥による放射性セシウムの吸収抑制)等に関する情報提供

2. 風評被害を受けた産業への支援

- (1)被災地産品の販路拡大、新商品開発等**
 - ・福島産農産物等のブランド力回復のためのPR事業(メディアを活用した広報、全国キャラバン等)
 - ・全国的な被災地産品消費拡大に向けた「食べて応援しよう!」キャンペーン等の推進(一環として全府省庁の食堂、自衛隊用糧食等における被災地産食材積極利用、民間企業の社内マルシェでの販売促進等)
 - ・被災地産業(農業、商工業等)による新製品開発等支援
 - ・被災地産品等に対する諸外国の輸入規制緩和に向けた働きかけ
- (2)国内外から被災地への誘客促進等**
 - ・福島県をはじめとする東北地方等への旅行需要喚起のためのPR事業(メディアとタイアップした広報、震災語り部・ガイドの育成、復興イベント開催等)



2-7-2 個別課題への対応⑤ (除染の取組)

平成24年1月1日に全面施行した放射性物質汚染対処特措法及び同法に基づく基本方針にのっとり、環境省を中心に除染を推進。人の健康の保護の観点から必要な地域について優先的に除染を実施。除染に伴い発生した土壌等は、安全に収集・運搬、仮置き、処分する。

除染特別地域(国直轄地域)

- 国が直接除染を行う地域。警戒区域又は計画的避難区域であったことのある福島県内の11市町村(※)を指定。
- 各市町村の意向を踏まえつつ、それぞれの特別地域内除染実施計画を策定し、それに沿って取り組む。

※檜葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯館村の全域。田村市、南相馬市、川俣町、川内村で警戒区域又は計画的避難区域であったことのある地域。


汚染状況重点調査地域(市町村除染地域)

- 市町村が中心となって除染を行う地域。平均的な放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む8県(※)100市町村を汚染状況重点調査地域として指定。
- 各市町村が行った調査測定の結果などを踏まえて策定した除染実施計画に基づき除染を推進。
- 国は、財政的措置や技術的措置を講ずる。

※岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県

賠償総額: 約3兆7,701億円(5月2日現在)

仮払い: 1,502億円
本賠償: 3兆6,199億円

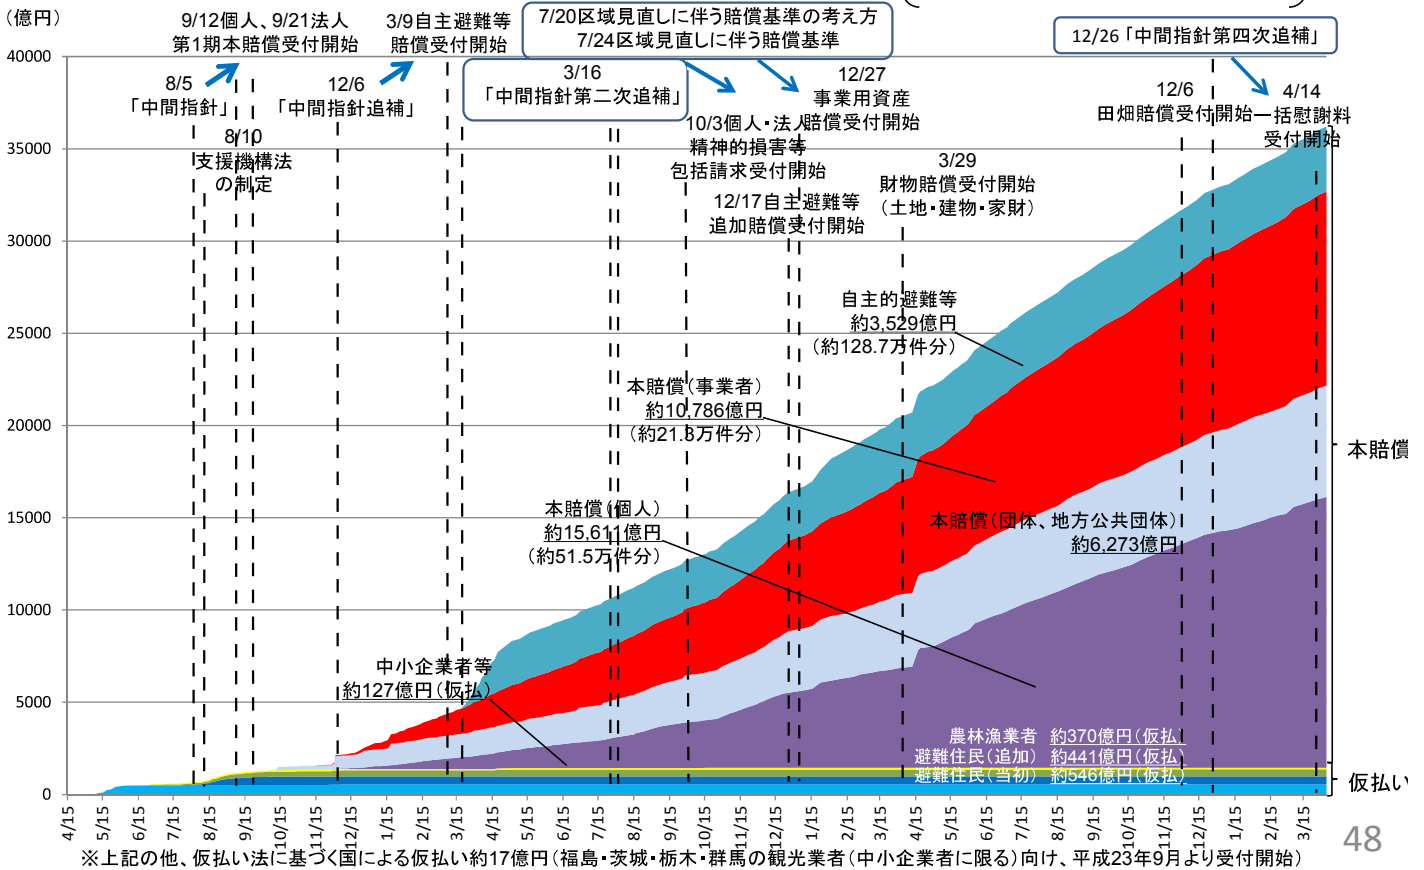


中間指針第二次追補を踏まえ、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方」について、経済産業省が平成24年7月20日に取りまとめ。この考え方に基づき、東京電力が同7月24日、「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について」を公表。

【避難指示区域】

(1) 不動産(住宅・宅地)に対する賠償

- ① 帰還困難区域においては、事故発生前の価値の全額を賠償し、居住制限区域・避難指示解除準備区域は、事故時点から6年で全損として、避難指示の解除までの期間に応じた割合分を賠償。
- ② 解除の見込み時期までの期間分を当初に一括払いをすることとし、実際の解除時期が見込み時期を超えた場合は、超過分について追加的に賠償。

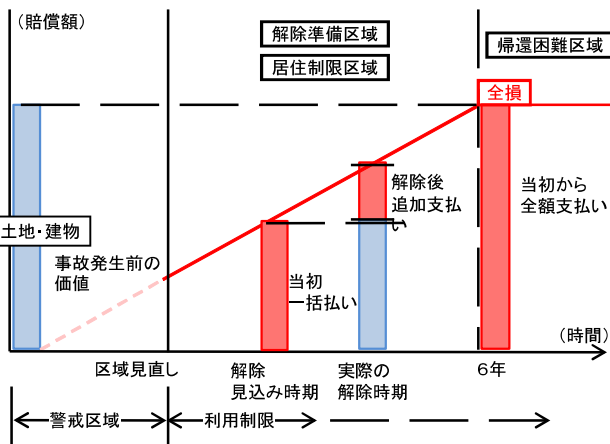

(2) 家財に対する賠償

- ① 家族構成に応じて算定した定額の賠償。
- ② 損害の総額が定額を上回る場合には個別評価による賠償も選択可能。

家財賠償額(定額) (単位: 万円)


家族構成	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人
帰還困難区域	325	595	635	655	675	715	735	775
居住制限区域 避難指示解除準備区域	245	445	475	490	505	535	550	580

※ 上記家族構成以外の場合も構成人数に応じて金額を算定。

(3) 精神的損害賠償

- ① 2012年6月以降の精神的損害について、帰還困難区域で600万円、居住制限区域で240万円(2年分)、避難指示解除準備区域で120万円(1年分)を標準とし、一括払い。
- ② 居住制限区域、避難指示解除準備区域について、解除の見込み時期が①の標準期間を超える場合には、解除見込み時期に応じた期間分の一括払い。その上で、実際の解除時期が標準の期間や解除の見込み時期を超えた場合は、超過分の期間について追加的に賠償を行う。

- 「集中復興期間」(平成23年度～平成27年度)における復旧・復興事業の規模と財源について、以下のとおり見直し(5年間19兆円程度を25兆円程度)を決定。
- 今後は、毎年度の予算編成において、被災地の復旧・復興に必要な施策・事業を見直したうえで、そのための財源の検討を行い、必要な予算を確保する。また、これを踏まえ、事業規模と財源の枠組みについて、必要に応じ、見直しを行う。

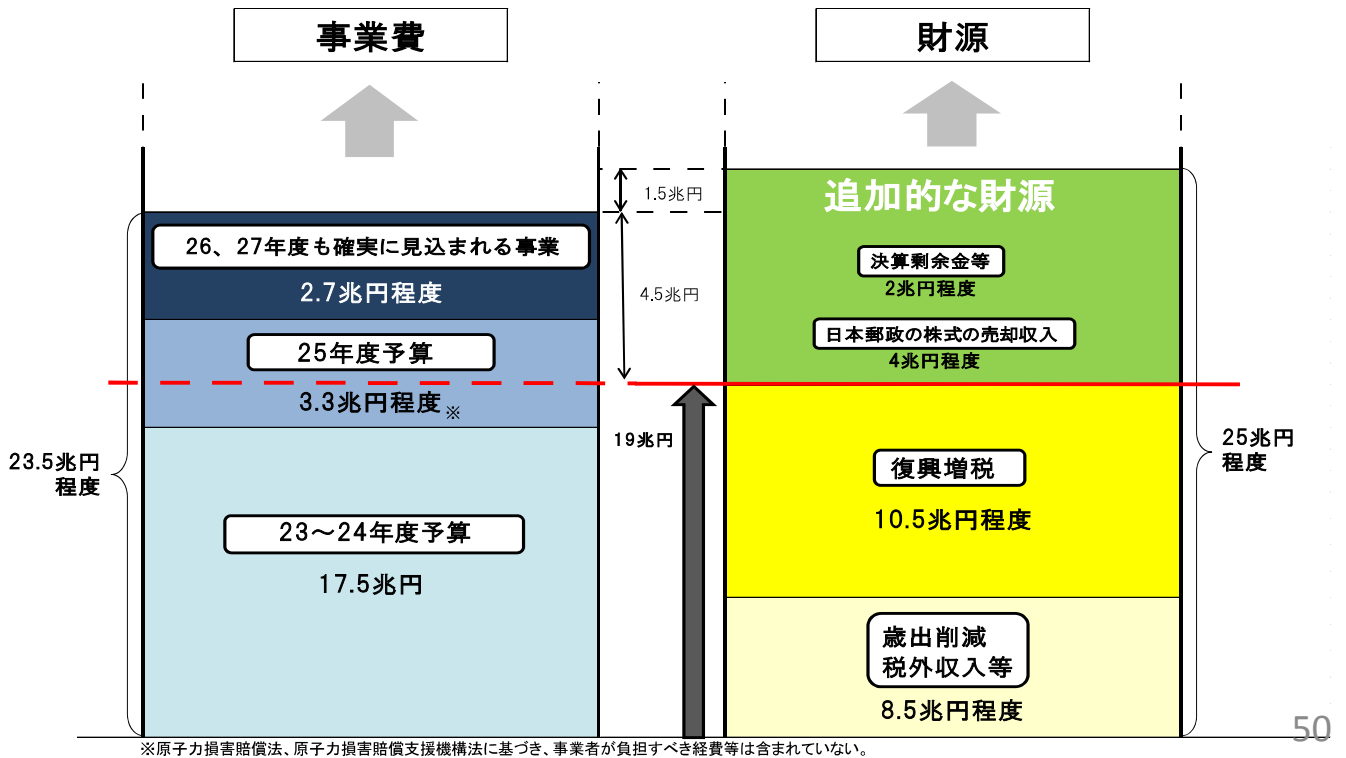

3-1 平成25年度復興特別会計予算

復興特別会計

(4兆3,840億円)

- <具体例> (1兆4,803億円)
- 震災復興特別交付税 6,053億円
 - 復興加速化・福島再生予備費 6,000億円
 - 全国防災 1,274億円
 - 復興債費 662億円
 - その他 815億円

復興庁所管

(2兆9,037億円)

- <具体例>
- 復興交付金 5,918億円
 - 復興推進調整費 100億円
 - 福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業 48億円
 - 長期避難者生活拠点形成交付金 503億円
 - 福島定住等緊急支援交付金 100億円 等


復興関係事業費の一括計上

(2兆2,289億円)

- <具体例>
- 被災者支援 1,883億円
 - まちの復旧・復興 10,753億円
 - 産業の振興・雇用の確保 3,063億円
 - 原子力災害からの復興・再生 6,590億円

○ **東日本大震災復興関係経費 5,638億円**

<p>(1) 福島再生 1,719億円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 福島再生加速化交付金 512億円 ○ 再エネ・IT等の実証研究・拠点整備事業 378億円 ○ 農業の復興 22億円 ○ 除染の加速 804億円 <p style="text-align: right;">等</p>
<p>(2) 復興まちづくり 1,606億円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 東日本大震災復興交付金 611億円 ○ 災害復旧 650億円 ○ 復興道路等の整備 259億円 ○ 農林水産基盤の整備 87億円
<p>(3) 産業の復興 1,329億円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 330億円 ○ 中小企業組合等共同施設等災害復旧事業 204億円 ○ 中小企業・小規模事業者の資金繰り支援事業 325億円 ○ 水産業共同利用施設等の整備 22億円 ○ 産業政策と一体となった被災地の雇用支援 448億円
<p>(4) 被災者支援 298億円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 被災者の住宅再建に係る給付措置(「住まいの復興給付金」) 250億円 ○ 災害援護貸付金・災害弔慰金等負担金 43億円 <p style="text-align: right;">等</p>
<p><各府省所管> 685億円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 学校の耐震化(文部科学省) 676億円 <p style="text-align: right;">等</p>
<p><復興財源の補填></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 復興特別法人税の前倒し廃止に伴う復興財源の補填 8,000億円

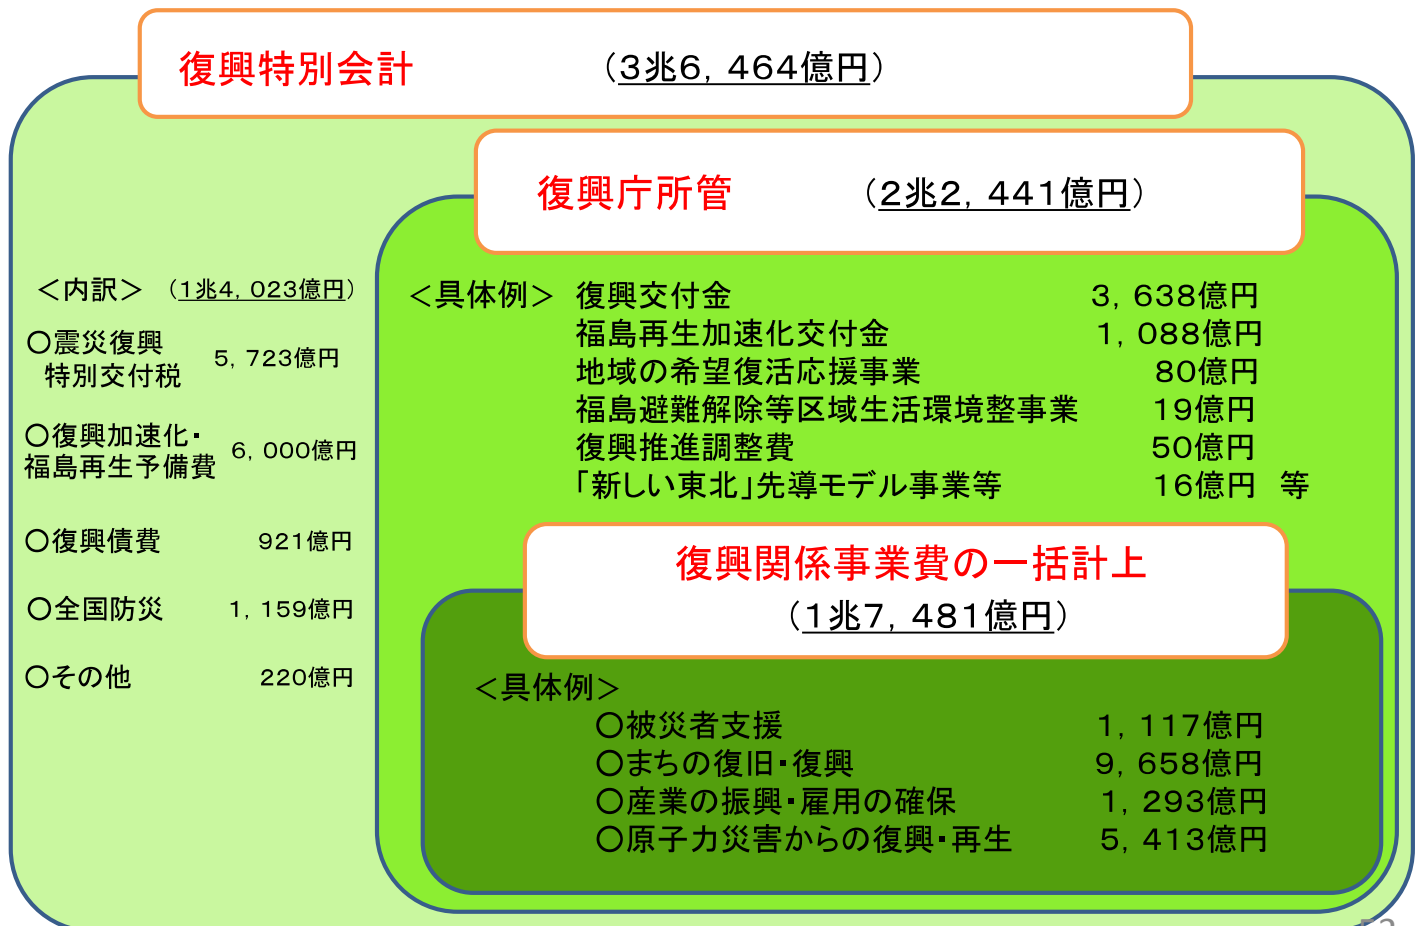

3-1 復興関係予算①

区分	平成22年度		平成23年度		
	予備費(億円)	予備費(億円)	1次補正予算(億円)	2次補正予算(億円)	3次補正予算(億円)
被災者支援	678	503	8,760	3,011	3,517
生活支援	603	503	5,237	3,011	481
教育・医療・福祉	-	-	1,473	-	1,835
救助活動	59	-	2,009	-	770
その他	17	-	40	-	431
インフラ等復旧、まちづくり	-	-	21,223	-	39,117
災害廃棄物等処理	-	-	3,519	-	3,860
公共事業(災害復旧)	-	-	10,441	-	8,706
施設等の災害復旧等	-	-	5,041	-	4,358
復興に向けた公共事業等	-	-	546	-	2,161
住宅	-	-	1,676	-	4,421
その他	-	-	-	-	-
東日本大震災復興交付金	-	-	-	-	15,612
産業の振興・雇用の確保	-	-	8,581	2,223	21,129
産業振興	-	-	7,875	2,223	16,662
災害関連融資	-	-	5,672	680	6,861
中小企業への支援・立地補助事業等	-	-	213	1,349	3,677
農林水産業の復興支援	-	-	1,990	194	3,182
研究開発・再生エネルギー等	-	-	-	-	2,943
雇用の確保	-	-	514	-	3,819
その他	-	-	192	-	648
原子力災害からの復興・再生	-	-	49	6,202	6,160
風評被害対策・食の安全確保等	-	-	42	2,925	551
除染等	-	-	-	3,274	2,520
研究開発拠点整備等	-	-	-	-	3,037
ふるさとの復活	-	-	-	-	-
その他	-	-	8	2	52
東日本大震災復興推進調整費	-	-	-	-	50
「新しい東北」先導モデル事業等	-	-	-	-	-
地方交付税交付金	-	-	1,200	3,573	16,635
全国防災対策費	-	-	340	-	5,752
その他	-	-	-	3,098	79
合計	678	503	40,153	18,106	92,438

※1 財務省公表資料(一・三次補正歳出額)に記載されている、既定経費に減額、年金臨時財源の補てん及びB型肝炎関係経費等は計に含めず。

※2 23年度4次補正予算の一般会計予算算総則において、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の借入れ及び社債に係る債務について、政府保証枠5,000億円を設定。

54

3-1 復興関係予算②

区分	平成24年度		平成25年度		平成26年度
	当初予算額(億円)	補正予算額(億円)	当初予算額(億円)	補正予算額(億円)	当初予算額(億円)
被災者支援	2,788	-	1,883	295	1,117
生活支援	1,289	-	1,373	43	574
教育・医療・福祉	816	-	451	250	492
救助活動	616	-	24	2	12
その他	66	-	34	-	39
インフラ等復旧、まちづくり	12,364	103	16,670	1,630	13,296
災害廃棄物等処理	3,442	-	1,266	-	236
公共事業(災害復旧)	2,152	-	5,415	553	5,154
施設等の災害復旧等	939	2	1,197	120	701
復興に向けた公共事業等	2,413	101	2,869	346	3,561
住宅	550	-	7	-	4
その他	-	-	-	-	2
東日本大震災復興交付金	2,868	-	5,918	611	3,638
産業の振興・雇用の確保	3,915	502	3,075	1,308	1,306
産業振興	3,775	-	3,027	860	1,286
災害関連融資	1,562	-	963	325	221
中小企業への支援・立地補助事業等	1,369	-	1,599	534	594
農林水産業の復興支援	427	-	319	1	306
研究開発・再生エネルギー等	417	-	145	-	165
雇用の確保	118	500	26	448	6
その他	21	2	22	-	13
原子力災害からの復興・再生	5,804	706	7,264	1,716	6,600
風評被害対策・食の安全確保等	139	13	173	16	154
除染等	4,579	109	6,220	805	5,104
研究開発拠点整備等	1,013	113	32	101	65
ふるさとの復活	-	208	675	512	1,186
その他	73	262	165	282	91
東日本大震災復興推進調整費	50	-	100	-	50
「新しい東北」先導モデル事業等	-	-	-	-	16
地方交付税交付金	5,490	1,214	6,053	-	5,723
全国防災対策費	5,407	653	2,088	685	1,379
その他	1,936	-	6,706	3	6,978
合計	37,754	3,177	43,840	5,638	36,464

※1 24年度当初予算及び25年度当初予算のそれぞれの一般会計予算算総則において、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の借入れ及び社債に係る債務について、政府保証枠5,000億円を設定。

※2 23年度1次補正から26年度当初予算までの「計」の単純な合計は約27.8兆円であるが、「集中復興期間」(23年度~27年度)における復旧・復興事業の財源(25兆円程度)との関係では、除染費用など東京電力への求償が想定される経費等を除くことから、23兆円程度となる。

55

3-1 復興関係予算の執行状況（23年度末現在）

(単位:億円、%)

区分	歳出 予算現額 (A)	支出済 歳出額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (D)=(A-B-C)	執行率 (B)/(A)	繰越率 (C)/(A)	不用率 (D)/(A)
被災者支援	15,496	12,244	2,323	928	79.0%	15.0%	6.0%
生活支援	9,232	7,119	1,920	193	77.1%	20.8%	2.1%
教育・医療・福祉	3,307	3,112	99	96	94.1%	3.0%	2.9%
救助活動	2,486	1,683	199	603	67.7%	8.0%	24.3%
その他	469	329	104	35	70.2%	22.2%	7.6%
インフラ等復旧、まちづくり	60,083	17,425	34,907	7,751	29.0%	58.1%	12.9%
災害廃棄物等処理	7,378	3,186	3,941	250	43.2%	53.4%	3.4%
公共事業(災害復旧)	19,146	2,895	11,857	4,392	15.1%	61.9%	22.9%
施設等の災害復旧等	9,093	3,090	4,105	1,896	34.0%	45.2%	20.9%
復興に向けた公共事業等	2,706	872	1,770	63	32.2%	65.4%	2.3%
住宅	6,096	4,870	111	1,113	79.9%	1.8%	18.3%
東日本大震災復興交付金等	15,661	2,508	13,119	33	16.0%	83.8%	0.2%
産業の振興・雇用の確保	31,918	27,204	3,768	945	85.2%	11.8%	3.0%
産業振興	26,745	22,389	3,455	900	83.7%	12.9%	3.4%
災害関連融資	13,205	13,056	25	122	98.9%	0.2%	0.9%
中小企業への支援・立地補助事業等	5,238	3,870	1,350	17	73.9%	25.8%	0.3%
農林水産業の復興支援	5,358	3,670	996	691	68.5%	18.6%	12.9%
研究開発・再生エネルギー等	2,942	1,791	1,082	69	60.9%	36.8%	2.4%
雇用の確保	4,332	4,308	-	23	99.4%	0.0%	0.6%
その他	840	505	313	21	60.2%	37.3%	2.5%
原子力災害からの復興・再生	12,410	9,775	2,176	458	78.8%	17.5%	3.7%
風評被害対策・食の安全確保等	3,517	3,028	87	401	86.1%	2.5%	11.4%
除染等	5,793	3,870	1,878	44	66.8%	32.4%	0.8%
研究開発拠点整備等	3,037	2,830	205	1	93.2%	6.8%	0.0%
その他	62	45	5	10	73.8%	9.2%	17.0%
地方交付税交付金	22,408	22,408	-	-	100.0%	0.0%	0.0%
全国防災対策費	6,092	1,376	4,519	196	22.6%	74.2%	3.2%
その他	833	78	-	754	9.5%	0.0%	90.5%
合計	149,243	90,513	47,695	11,034	60.6%	32.0%	7.4%

※1 計数は、今後変動があり得る。

※2 計数は、億円未満を切り捨てているため、合計とは一致しない。

56

3-1 復興関係予算の執行状況（24年度末現在）

(単位:億円、%)

区分	歳出 予算現額 (A)	支出済 歳出額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (D)=(A-B-C)	執行率 (B)/(A)	繰越率 (C)/(A)	不用率 (D)/(A)
被災者支援	5,092	3,523	51	1,517	69.2%	1.0%	29.8%
生活支援	3,205	1,795	-	1,410	56.0%	0.0%	44.0%
教育・医療・福祉	913	858	-	55	94.0%	0.0%	6.0%
救助活動	805	714	51	39	88.7%	6.4%	4.9%
その他	167	155	-	12	92.6%	0.0%	7.4%
インフラ等復旧、まちづくり	47,331	26,563	13,707	7,060	56.1%	29.0%	14.9%
災害廃棄物等処理	7,384	3,488	3,810	84	47.2%	51.6%	1.1%
公共事業(災害復旧)	14,009	5,016	4,498	4,494	35.8%	32.1%	32.1%
施設等の災害復旧等	4,963	2,108	1,026	1,828	42.5%	20.7%	36.8%
復興に向けた公共事業等	4,275	2,157	1,586	531	50.5%	37.1%	12.4%
住宅	661	578	5	78	87.4%	0.8%	11.8%
東日本大震災復興交付金等	16,036	13,213	2,780	43	82.4%	17.3%	0.3%
産業の振興・雇用の確保	8,133	5,415	1,919	799	66.6%	23.6%	9.8%
産業振興	7,182	4,592	1,914	675	63.9%	26.7%	9.4%
災害関連融資	1,567	1,531	-	36	97.7%	0.0%	2.3%
中小企業への支援・立地補助事業等	2,719	1,285	1,310	123	47.3%	48.2%	4.6%
農林水産業の復興支援	1,401	841	246	313	60.0%	17.6%	22.4%
研究開発・再生エネルギー等	1,493	934	357	201	62.6%	23.9%	13.5%
雇用の確保	618	528	-	89	85.5%	0.0%	14.5%
その他	333	294	4	34	88.3%	1.4%	10.3%
原子力災害からの復興・再生	8,659	3,690	3,386	1,582	42.6%	39.1%	18.3%
風評被害対策・食の安全確保等	228	172	7	47	75.8%	3.5%	20.7%
除染等	6,556	2,105	2,939	1,511	32.1%	44.8%	23.1%
研究開発拠点整備等	1,332	1,149	164	18	86.3%	12.3%	1.4%
ふるさとの復活	208	0	207	0	0.2%	99.8%	0.0%
その他	333	261	67	5	78.3%	20.1%	1.6%
地方交付税交付金	6,704	6,704	-	-	100.0%	0.0%	0.0%
全国防災対策費	10,458	6,911	2,965	581	66.1%	28.4%	5.6%
その他	11,023	10,323	-	700	93.6%	0.0%	6.4%
合計	97,402	63,131	22,030	12,240	64.8%	22.6%	12.6%

※1 計数は、今後変動があり得る。

※2 計数は、億円未満を切り捨てているため、合計とは一致しない。

※3 計数は、平成23年度一般会計予算措置(予備費・1次～3次補正)及び平成24年度東日本大震災復興特別会計の合計額である。

57

3-2 福島復興に向けた予算等① (概要)

23年度予算等	24年度予算等	25年度予算
(1) インフラ整備 ◎東日本大震災復興交付金 1兆5,612億円等	(1) インフラ整備 ◎東日本大震災復興交付金 2,868億円 ◎災害復旧事業 2,605億円 ◎復興関係公共事業 2,389億円	(1) インフラ整備 ◎東日本大震災復興交付金 5,918億円 ◎災害復旧事業 6,611億円 ◎復興関係公共事業 2,868億円
(2) 産業振興・雇用 ◎グループ補助金、仮設工場・店舗の整備 1504億円 ○福島県原子力災害等復興基金の創設【3,840億円程度】 ・国際的な医療センター・開発拠点等の整備及び地域医療の再生 690億円 ・産業復興企業立地補助 1,700億円 ・緊急雇用創出事業基金 800億円 ◎既存の制度等を活用した追加的予算措置による機動的対応(再生可能エネルギー導入促進等)【1,500億円程度】	(2) 産業振興・雇用 ◎グループ補助金、仮設工場・店舗の整備 550億円 ◎農林水産業への支援 422億円 ◎雇用の確保 118億円 ○避難解除等区域生活環境整備事業 42億円 ※補正予算での対応 ◎グループ補助金 801億円 ◎産業復興企業立地補助金 402億円 ◎医療機器開発・安全性評価センター整備 134億円 ○福島健康管理拠点の整備 60億円 ※補正予算での対応 ○福島県環境創造センター整備 113億円 ○福島県での営農再開支援等 246億円 ○福島産農産物等風評被害対策 13億円 ◎緊急雇用創出事業基金 500億円	(2) 産業振興・雇用 ◎グループ補助金、仮設工場・店舗の整備 280億円 ◎津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 1,100億円 ◎農林水産業への支援 319億円 ○避難解除等区域生活環境整備事業 24億円 ○再生可能エネルギー導入支援等(浮体式洋上風力発電の実証研究等) 103億円 ○福島産農産物等風評被害対策 3億円 ○福島県における観光関連復興支援 4億円
(3) 除染・健康管理等 ◎除染の緊急実施 2,179億円 ◎除染等の実施 1,997億円 ○中間貯蔵施設の設置に向けた取組 11億円 ○福島原子力被災者・子ども健康管理基金の創設(健康管理事業・除染) 962億円 ・全県民を対象とした放射線影響の推定調査 など ○福島県原子力被災応急対策基金 404億円 ・子供の自然体験活動、学校給食の検査	(3) 除染・健康管理等 ◎放射性物質により汚染された土壌等の除染 3,721億円 ○中間貯蔵施設の設置に向けた取組 20億円 (4) 新たな課題への対応 ※補正予算での対応 【福島ふるさと復活プロジェクト】 ○帰還加速・区域の荒廃抑制 208億円	(3) 除染・健康管理等 ◎放射性物質により汚染された土壌の除染 4,978億円 ○中間貯蔵施設の設置に向けた取組 146億円 (4) 新たな課題への対応 【福島ふるさと復活プロジェクト】 ○帰還加速・区域の荒廃抑制 48億円 ○長期避難者支援 503億円 ○定住にむけた環境整備 100億円

(注)◎についての事業費は被災県の合計であり、その一部分が福島県で実施される。

3-2 福島復興に向けた予算等② (概要)

25年度補正予算	26年度予算
(1) インフラ整備 ◎東日本大震災復興交付金 611億円 ◎災害復旧事業 650億円 ◎復興関係公共事業 346億円	(1) インフラ整備 ◎東日本大震災復興交付金 3,638億円 ◎災害復旧事業 5,855億円 ◎復興関係公共事業 3,561億円
(2) 産業振興・雇用 ◎津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 330億円 ◎グループ補助金 204億円 ◎中小企業・小規模事業者の資金繰り支援事業 325億円 ◎水産業共同利用施設等の整備 22億円 ◎事業復興型雇用創出事業の基金増し・実施期間延長 448億円 ○浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業 280億円 ○福島産農産物等戦略的情報発信事業 16億円	(2) 産業振興・雇用 ◎津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 300億円 ◎グループ補助金 221億円 ◎災害関連融資 221億円 ◎東日本大震災農業生産対策交付金 75億円 ◎復興特区支援利子補給金 13億円 ○避難解除等区域生活環境整備事業 19億円 ○再生可能エネルギー導入支援(福島県市民交流型再生可能エネルギー導入促進事業等) 17億円 ○再生可能エネルギー関係研究開発等 29億円 ◎農産物等消費応援事業 1億円 ○福島県における観光関連復興支援 4億円
(3) 除染・健康管理等 ◎放射性物質により汚染された土壌等の除染 804億円	(3) 除染・健康管理等 ◎放射性物質により汚染された土壌等の除染 2,582億円 ◎放射性物質汚染廃棄物処理事業 1,330億円 ○中間貯蔵施設の整備 1,012億円
(4) 新たな課題への対応 ○福島再生加速化交付金 512億円 「長期避難者への支援から早期帰還への対応まで」を一括する、より使い勝手の良い新たな交付金を新設。 ○生活環境向上対策 ○社会福祉施設整備 ○健康管理・健康不安対策 ○農林水産業支援 ○生活拠点整備 ○商工業支援	(4) 新たな課題への対応 ○福島再生加速化交付金 1,088億円 「長期避難者への支援から早期帰還への対応まで」を一括する、より使い勝手の良い新たな交付金による取組を強化。 ○生活環境向上対策 ○社会福祉施設整備 ○健康管理・健康不安対策 ○農林水産業支援 ○生活拠点整備 ○商工業支援

(注)◎についての事業費は被災県の合計であり、その一部分が福島県で実施される。

○ 福島の復興・再生について、除染・放射性物質汚染廃棄物処理を加速するとともに、本年8月の避難指示区域の見直し完了を受け、長期避難者のための支援策、早期帰還支援策等を引き続き推進する。また、福島県等からの要望にも配慮する形で予算案を決定。

<p>1. 福島の復興・再生の加速 【1,186億円(675億円)】</p> <p>○ 福島再生加速化交付金 【1,088億円(新規)】 (25補正512億円) 「長期避難者への支援から早期帰還への対応まで」を一括する本交付金により、福島の再生を加速。 ○生活環境向上対策 ○健康管理・健康不安対策 ○生活拠点整備 ○社会福祉施設整備 ○農林水産業支援 ○商工業支援</p> <p>・ 長期避難者生活拠点形成交付金 【476億円(503億円)】 (25補正112億円) ※新設交付金内に再編 長期避難者を受け入れている市町村において、災害公営住宅を中心に、受け入れ自治体の基盤整備等の推進、避難者支援のためのソフト施策を一体的に実施。</p> <p>・ 福島定住等緊急支援交付金 【91億円(100億円)】 (25補正10億円) ※新設交付金内に再編 公的な賃貸住宅の整備や子どもの運動機会の確保のための施設整備の早急な実施を支援し、子育て世帯が安心して定住できる環境整備を推進。</p> <p>・ 福島原災避難区域等帰還・再生加速事業 【20億円 (48億円)】 ※「住民の安心安全」事業等の一部を新設交付金内に再編 帰還加速のための取組として「住民の安心安全」事業(放射線リスクなどに関する対話集会等への支援)等を実施。</p> <p>○ 福島原災避難区域等帰還・再生加速事業 【80億円 (48億円)】 喪失した生活基盤施設の代替や地域コミュニティ機能の維持等といった帰還加速の取組や荒廃抑制・保全対策等を実施。</p>	<p>3. 安全・安心な生活環境の実現 【5,323億円(6,442億円)】</p> <p>① 除染・放射性物質汚染廃棄物処理等 【5,104億円(6,220億円)】 ・放射性物質により汚染された土壌等の除染【2,582(4,978)】(25補正804) ・放射性物質汚染廃棄物処理事業【1,330(971)】※ ・中間貯蔵施設の整備【1,012(146)】等</p> <p>② 放射線モニタリング・リスクコミュニケーション等 【50億円(62億円)】 ・原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金【13(13)】 ・地方消費者行政活性化事業【7(7)】※等</p>
<p>2. 地域社会の再生(被災者支援、まちの復旧・復興) 【14,413億円の内数】</p> <p>・被災者生活再建支援金補助金【96(840)】※</p> <p>・東日本大震災復興交付金【3,638(5,918)】※(25補正611)</p> <p>・災害復旧事業【5,855(6,611)】※(25補正658)等</p>	<p>4. 地域経済の再生等 【91億円(①+②)、1,306億円(③)の内数】</p> <p>① 再エネ・医療等の支援・研究・拠点整備等 【82億円(135億円)】 ・福島県再生可能エネルギー次世代技術開発事業【8(3)】 ・福島県市民交流型再生可能エネルギー導入促進事業【9(5)】 ・革新的エネルギー研究開発拠点形成【13(13)】 (産総研の拠点(郡山)での研究開発等) ・福島再生可能エネルギー研究開発拠点機能強化事業【16(9)】 ・福島医療・福祉機器等開発・事業化支援事業【25(新規)】等 (参考)浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業【-(95)】(25補正280) (参考)福島県における先端ICT実証研究拠点整備事業(25補正8)</p> <p>② 風評被害対策・農業振興 【9億円(13億円)】 ・福島県における観光関連復興支援事業【4(4)】 ・農産物等消費応援事業【1(1)】等 (参考)福島県農産物等戦略的情報発信事業【-(3)】(25補正16) (参考)福島県浜地域農業再生研究拠点整備事業(25補正3)</p> <p>③ 産業振興・雇用の確保 【1,306億円(3,075億円)の内数】 ・津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金【300(1,100)】※(25補正330) ・中小企業組合等共同施設等災害復旧事業【221(250)】※(25補正204) ・再生可能エネルギー発電設備等導入促進復興支援事業【50(新規)】※等</p>

(注)各項目の合計額は、復興庁一括計上予算のうち「原子力災害からの復興・再生」の合計額。総額は、6,000億円(25年度予算:7,264億円)となる。

(備考)※の予算額は被災県等の合計であり、その一部が福島県に関連するもの。斜体の事業は「原子力災害からの復興・再生」予算以外に区分される事業。アンダーラインは新規事業。

25年度予算案 25年度当初 60
【100(〇〇)】億円

3-3 被災自治体に対する東日本大震災に係る復旧・復興事業における主な財政的支援について

復旧事業	
<p style="text-align: center;">国庫補助</p> <p>➢ 補助率のかさ上げ (例)公共土木施設等・・・8～9割(阪神・淡路大震災時は8割)</p> <p>➢ 補助の算定方法の特例 公共土木施設等は総合負担軽減方式で算定(プール方式:各施設の災害復旧事業費を合算し補助率算出)</p> <p>➢ 補助対象施設の拡大 市町村仮庁舎、介護老人保健施設等も補助(阪神・淡路大震災では対象外)</p>	<p style="text-align: center;">地方負担</p> <p>➢ 地方負担は、原則、全額を震災復興特別交付税で措置(通常の災害では地方債を発行)</p>
復興事業	
<p style="text-align: center;">国庫補助</p> <p>【復興交付金】</p> <p>➢ 復興地域づくりに必要なハード事業(5省40事業)を一括化(地方負担分の5割を追加的に国庫補助)</p> <p>➢ 基幹事業に関連し実施する用途の自由度の高い効果促進事業等により、ハード・ソフト事業ニーズに対応(補助率8割)</p> <p>【福島の復興・再生に向けた交付金】</p> <p>➢ 帰還を加速するための支援事業、復興公営住宅整備等長期避難者のコミュニティ維持のための事業、中通り等の子どものための全天候型運動施設整備等の事業</p> <p>【その他】</p> <p>➢ 社会資本整備総合交付金、農山漁村地域整備交付金等の復興枠による支援</p> <p>➢ 地域経済の核となる中小企業等グループの施設の復旧等のためグループ補助金を創設</p> <p>➢ 既存の制度・予算での対応が困難な「制度の隙間」に対応するための復興推進調整費の創設</p>	<p style="text-align: center;">地方負担</p> <p>➢ 地方負担は、原則、全額を震災復興特別交付税で措置(通常の災害では地方債を発行する等により対応)</p>

<p style="text-align: center;">その他</p> <p>➢ 中長期職員派遣、職員採用等の単独事業、地方税等の減収に対する震災復興特別交付税措置</p> <p>➢ 取崩し型復興基金の創設(23年度2次補正(特別交付税の増額))、津波被災地域の住民の定着促進のため基金の積み増し等(24年度補正(震災復興特別交付税の増額))</p>	<p style="text-align: right;">61</p>
---	--------------------------------------

○ 地方公共団体が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた復興推進計画に基づき、税・金融上の特例、規制・手続の特例が講じられ、企業の新規立地や投資をはじめとする復興のための取組を促進。

特例措置の概要

税制上の特例

事業者の税負担の軽減

- ・取得する機械等に係る特別償却又は税額控除
- ・被災雇用者に対する給与等支給額の10%の税額控除
- ・新規立地新設企業を5年間無税 等

金融上の特例

事業者への低利融資


- ・指定金融機関に対する利子補給金の支給

規制・手続等の特例

土地の有効活用等、事業活動への負担軽減

- ・工場立地地上の緑地面積等の比率に係る要件の緩和
- ・都市計画で定められた土地用途に係る規制の緩和
- ・医療機器製造販売業の許可基準の緩和 等

対象区域

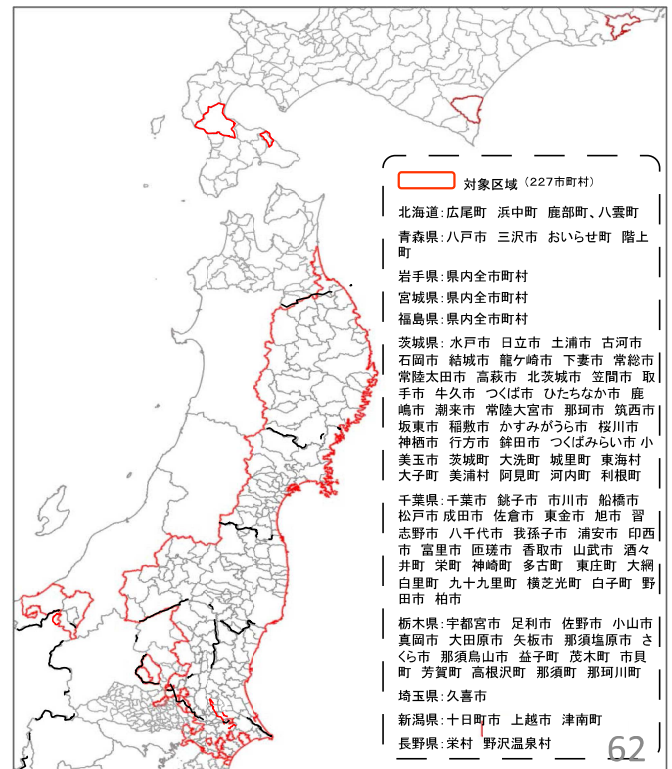

3-4 復興特区制度② 税制上・金融上の特例の活用事例

岩手県

＜例＞有限会社グランパファーム
（陸前高田市、農業）

- ・地域経済産業活性化対策費補助金及び復興特区の課税の特例を活用。
- ・平成24年7月にドーム式の太陽光型植物工場を建設。また、平成26年4月に同地に植物工場を増設予定。
- ・設備投資は総額約5.6億円、新規に18人を雇用。



宮城県

＜例＞株式会社メイコー
（石巻市、電子回路製造業）

- ・中小企業等グループ補助金及び復興特区支援 利子補給金を活用。
- ・平成25年2月に、同市内の重吉町に研究開発及び生産拠点を再整備。
- ・設備投資は総額11億円、30人を雇用。



福島県

＜例＞株式会社新つた
（いわき市、宿泊業）

- ・グループ補助金及び復興特区の課税の特例を活用。
- ・平成25年6月に宿泊用建物をリニューアル。
- ・設備投資は約4,100万円、指定期間中の設備投資計画は総額約7,600万円。






活用が見込まれる者	項目	内容	活用状況
事業者	工場緑地規制の緩和	工場立地法上の緑地面積等の比率に係る要件の緩和。	【活用実績】33件 【活用事例】A社(青森県)が、工場増設時に緑地面積率の緩和分(25%から6%に緩和)を駐車場等に活用。
事業者	土地用途規制の緩和	都市計画で定められた土地用途に係る規制の緩和。	【活用実績】4市町 【活用事例】宮城県女川町の二種住居地域等において、準工業地域における工場の建設が可能。
事業者	医療機器製造販売業の特例	医療機器製造販売業の許可基準の緩和	【活用実績】81名 【活用事例】岩手県、宮城県、福島県において講習が行われ、受講したうちの81名が資格を獲得。
会社法人、地方公共団体、学校法人等	応急仮設建築物の特例	最長2年3カ月である仮設建築物の存続期間の要件を緩和。	【活用実績】5県50市町村 【活用事例】南相馬市(福島県)において、事務所・商店等の仮設建築物につき、存続期間を3年間延長。
会社法人等	訪問リハビリ事業所等の特例	訪問リハビリテーション事業主体に係る要件を緩和。	【活用実績】8件 【活用事例】岩手県において、会社法人によるC訪問リハビリテーション事業所が開設。
医療法人等 (医療機関、福祉施設等)	地域医療確保の特例	病院において配置すべき医師等の数に係る基準を緩和。	【活用実績】10件 【活用事例】B病院(宮城県)において、通常の90%相当に緩和された医師配置基準を適用。
地域住民 地方公共団体	災害公営住宅入居要件等の特例	公営住宅への入居に係る収入等の要件を緩和する特別法の適用期間(3年)の延長等を可能とする。	【活用実績】5県148市町村 【活用事例】千葉県旭市において、建設される公営住宅(33戸)と既存の公営住宅につき、入居要件緩和の適用期間(平成26年3月まで)を1年延長。
地域住民	確定拠出年金の特例	確定拠出年金の脱退要件を緩和し、住環境の再建や事業再開等への資金活用を可能とする。	【活用実績】16名 【活用事例】福島県、宮城県、岩手県、及び茨城県の一部の市町で緩和。住宅再建資金等に活用。

注:活用実績及び事例は、平成26年2月末現在のもの。

3-4 復興特区制度④ 規制の特例の活用状況

既存の土地利用計画(都市、農地、森林等)の枠組みを超えて、迅速な土地利用再編を行う特例措置を創設し、地域の実情に応じた復興まちづくりを速やかに実現

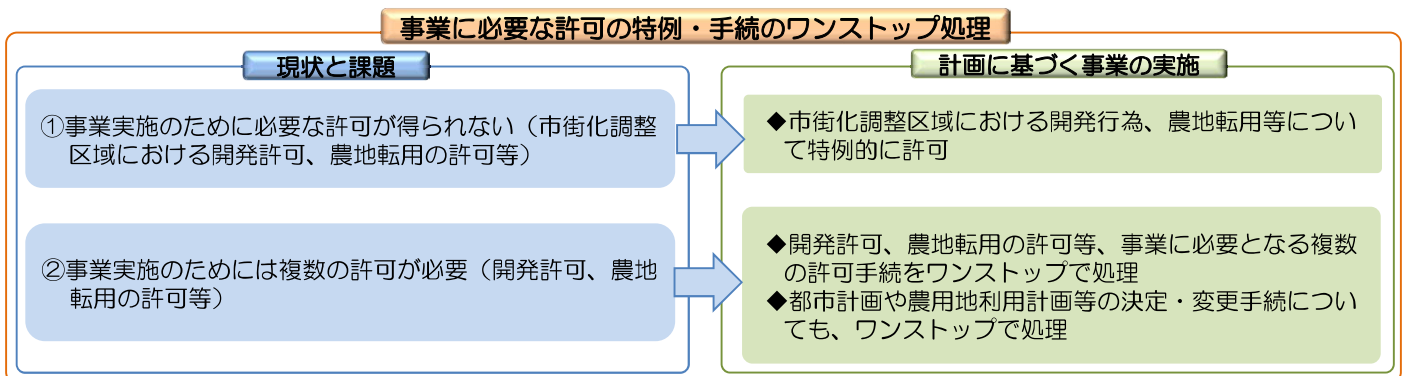

(平成26年4月1日現在)

地域	対象市町村	事業施行地区	復興整備事業の内容	主な許認可等の特例
岩手	○計10市町村 (宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、山田町、大槌町、岩泉町、田野畑村、野田村)	計133地区	<ul style="list-style-type: none"> 市街地開発事業 (宮古市等の計20地区) 集団移転促進事業 (宮古市等の計39地区) 都市施設の整備に関する事業 (宮古市等の計50地区) 土地改良事業 (釜石市の計1地区) その他施設(例:サケふ化場)の整備に関する事業 (宮古市等の計47地区) 	<ul style="list-style-type: none"> 農地法の転用許可みなし (宮古市等の計49地区)
宮城	○計14市町 (仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亶理町、山元町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町)	計300地区	<ul style="list-style-type: none"> 市街地開発事業 (石巻市等の計27地区) 集団移転促進事業 (仙台市等の計193地区) 都市施設の整備に関する事業 (石巻市等の計39地区) その他施設(例:太陽光発電)の整備に関する事業 (仙台市等の計75地区) 	<ul style="list-style-type: none"> 農地法の転用許可みなし (仙台市等の計179地区) 都市計画法の開発許可みなし (石巻市等の計124地区) 自然公園法の建設許可等みなし (石巻市等の計33地区)
福島	○計6市町 (いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楡葉町、新地町)	計155地区	<ul style="list-style-type: none"> 市街地開発事業 (いわき市等の計7地区) 集団移転促進事業 (いわき市等の計51地区) 都市施設の整備に関する事業 (いわき市等の計60地区) 土地改良事業 (相馬市等の計6地区) 造成宅地滑動崩落対策事業 (楡葉町の計1地区) その他施設(例:植物工場)の整備に関する事業 (いわき市等の計40地区) 	<ul style="list-style-type: none"> 農地法の転用許可みなし (いわき市等の計65地区) 都市計画法の開発許可みなし (いわき市等の計15地区)

※ 1つの地区で複数の事業を実施している場合があるため、「事業施行地区」欄の地区数と「復興整備事業の内容」欄の地区数の合計とは、必ずしも一致しない。

66

3-5 復興交付金①

- 東日本大震災により、著しい被害を受けた地域において、災害復旧だけでは対応が困難な市街地の再生等の復興地域づくりを、一つの事業計画の提出により一括で支援。
- 復興地域づくりに必要な事業の幅広い一括化、自由度の高い効果促進事業、全ての地方負担への手当て、基金による執行の弾力化等、既存の交付金等を超えた極めて柔軟な制度。

参考：東日本大震災復興特別区域法（抄）
第七十七条 特定地方公共団体である市町村（以下この章において「特定市町村」という。）は単独で、又は、特定市町村と当該特定市町村の存する都道府県（次節において「特定都道府県」という。）は共同して、東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために実施する必要がある事業に関する計画（以下この章において「復興交付金事業計画」という。）を作成することができる。

基幹事業

- 被災自治体の復興地域づくりに必要なハード事業を幅広く一括化(5省40事業→右表参照)。

効果促進事業等(関連事業)

- 基幹事業に関連して自主的かつ主体的に実施する事業
- 用途の自由度の高い資金により、ハード・ソフト事業ニーズに対応(補助率80%、基幹事業費の35%を上限)

地方負担の軽減

- ①及び②により地方の負担は全て国が手当て
 - ① 基幹事業に係る地方負担分の50%を追加的に国庫補助
 - ② 地方負担分は地方交付税の加算により全て手当て

執行の弾力化・手続の簡素化

- 市町村の復興交付金事業計画全体(関連する県事業を含む)をパッケージで復興局、支所等に提出
- 事業間流用、基金の設置、交付・繰越・変更等の諸手続の簡素化

文部科学省
1 公立学校施設整備費国庫負担事業(公立小中学校等の新増築・統合)
2 学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化等)
3 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業
4 理蔵文化財発掘調査事業
厚生労働省
5 医療施設耐震化事業
6 介護施設復興まちづくり整備事業(定期巡回・随時対応サービス)や「訪問看護ステーション」の整備等
7 保育所等の複合化・多機能化推進事業
農林水産省
8 農山村地域復興基盤総合整備事業(集落排水等の集落基盤、農地等の生産基盤整備等)
9 農山村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業(被災した生産施設、生活環境施設、地域間交流拠点整備等)
10 震災対策・戦略作物生産基盤整備事業(米・大豆等の生産に必要となる水利施設整備等)
11 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)
12 漁業集落防災機能強化事業(漁業集落地盤嵩上げ、生活基盤整備等)
13 漁港施設機能強化事業(漁港施設用地嵩上げ、排水対策等)
14 水産業共同利用施設復興整備事業(水産業共同利用施設、漁港施設、放流用種苗生産施設整備等)
15 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業
16 木質バイオマス施設等緊急整備事業
国土交通省
17 道路事業(市街地相互の接続道路等)
18 道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))
19 道路事業(道路の防災・震災対策等)
20 災害公営住宅整備事業等(災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造成等)
21 災害公営住宅家賃負担軽減事業
22 東日本大震災特別修繕員派遣事業
23 公営住宅等ストック総合改善事業(耐震改修、エレベーター改修)
24 住宅地区改良事業(不良住宅除却、改良住宅の建設等)
25 小規模住宅地区改良事業(不良住宅除却、小規模改良住宅の建設等)
26 住宅市街地総合整備事業(住宅市街地の再生・整備)
27 優良建築物等整備事業
28 住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物耐震改修事業)
29 住宅・建築物安全ストック形成事業(げけ地近接等危険住宅移転事業)
30 造成宅地滑動崩落緊急対策事業
31 津波復興拠点整備事業
32 市街地再開発事業
33 都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地地区画整理事業等)
34 都市再生区画整理事業(市街地液状化対策事業)
35 都市防災推進事業(市街地液状化対策事業)
36 都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)
37 下水道事業
38 都市公園事業
39 防災集団移転促進事業
環境省
40 低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業

67

復興交付金の予算規模

○ 事業費 3兆5,599億円 国費 2兆8,646億円

うち、平成23年度第3次補正予算	事業費 1兆9,307億円	国費 1兆5,612億円
平成24年度予算	事業費 3,584億円	国費 2,868億円
平成25年度予算	事業費 7,397億円	国費 5,918億円
平成25年度第1次補正予算	事業費 763億円	国費 611億円
平成26年度予算	事業費 4,547億円	国費 3,638億円

復興交付金のこれまでの配分額

【第1回から第8回までの合計額】（申請額を上回る額を配分）

	事業費	国費
申請額	2兆2,733億円	1兆7,845億円
配分額	2兆4,953億円	2兆203億円

【第1回から8回までの各回の申請額及び配分額】

	申請額		配分額	
	事業費	国費	事業費	国費
第1回（24年3月2日）	4,991億円	3,899億円	3,055億円	2,510億円
第2回（24年5月25日）	2,139億円	1,696億円	3,165億円	2,612億円
第3回（24年8月24日）	1,423億円	1,110億円	1,806億円	1,435億円
第4回（24年11月30日）	7,222億円	5,689億円	8,803億円	7,148億円
第5回（25年3月8日）	2,139億円	1,625億円	2,540億円	1,998億円
第6回（25年6月25日）	545億円	442億円	632億円	527億円
第7回（25年11月29日）	2,254億円	1,755億円	2,338億円	1,832億円
第8回（26年3月7日）	2,020億円	1,629億円	2,616億円	2,142億円

68

3-5 復興交付金③

復興交付金の主な使途と取組(1)

基幹事業

○ 生業の再建、住まいの確保等復興まちづくりに必要な事業を幅広く支援。

- ・防災集団移転促進事業(28市町村(約1.2万戸(移転先住宅団地)、約5,076億円)
- ・災害公営住宅整備事業(58市町村(約2.3万戸)、約6,126億円)
- ・道路事業(49市町村、約2,817億円)
- ・水産・漁港関連施設整備事業(34市町村、約1,927億円)
- ・都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業等)(21市町村、約1,901億円)
- ・農地整備、農業用施設等整備事業(35市町村、約1,396億円)

(事業費ベース)

○ それに加えて、住宅、生業の再建にとどまらないまちづくりの新たな課題に対応するため、以下のような事業にも対応。

- 津波復興拠点における施設整備
 - ・公益施設(地域交流センター)
 - ・防災拠点施設(津波避難デッキ、防災センター)
 - ・その他便益施設(駐車場、広場)
- 防集跡地の利用方策
 - ・産業用地の整備
 - ・大規模な農地整備
 - ・津波防災緑地、公園整備
 - ・漁業集落の嵩上げ
- 将来を見据えた農業・水産業関連機械・施設整備
 - ・将来の営農再開に対応する農業用機械(トラクター、コンバイン等)導入
 - ・水産業の関連施設(残渣処理施設、排水処理施設等)整備
- 観光・交流施設整備
 - ・自治会館、コミュニティーセンター
 - ・キャンプ場復旧、農林水産物販売施設

69

復興交付金の主な使途と取組(2)

効果促進事業等

- 基幹事業に関連して市町村等が自主的かつ主体的に実施する復興事業を支援。ネガティブリスト(※)に該当しないものには基本的に対応するとの方針の下、幅広い事業ニーズに対応。

(※)①市町村等の経常的な経費に充当を目的とする事業、②二重補助となる事業、③専ら個人・法人の負担軽減や資産形成のための事業

復興まちづくりの構想づくり

- ・市町村の復興まちづくりに向けて、市民や専門家等を交えた協議会の開催(石巻市、東松島市等)

新たな市街地形成等の促進

- ・住民合意形成や権利調整のための説明会の開催、専門家の活用(石巻市等)
- ・盛土材確保のためのストックヤードの整備(気仙沼市)
- ・復興作業用住居(南相馬市)

地域のニーズに合わせたまちづくりの推進

- ・災害公営住宅に併設する売店・診療所等の小規模店舗ペース(陸前高田市)
- ・災害公営住宅団地内の障害児親子通園施設(仙台市)
- ・内水排除のための仮設ポンプ等の設置(石巻市)
- ・区画整理地区内の信号(岩手県)、消防水利施設(いわき市)
- ・津波避難監視カメラ、燃油備蓄施設、防災備蓄倉庫等の防災安全施設(洋野町、神栖市、北茨城市等)
- ・慰霊碑を設置する震災交流広場の整備(相馬市)

産業、観光業等のにぎわいの再生

- ・地元農産品のブランド化のため、新たな加工品の開発や旅館・観光業とタイアップした販路開拓(いわき市)
- ・地元水産物の復興PRによる販路開拓や他産業との連携強化(宮古市)
- ・防集跡地を含む進出見込みのある産業用地の整備(石巻市、東松島市、亘理町)
- ・観光案内や交流機能を備えた観光交流拠点の整備(相馬市)

復興まちづくりに関連する被災者の生活再建支援

- ・被災者に対する巡回保健指導による健康相談、健康相談に必要な検査機器の整備、保健指導のためのデータ管理(相馬市)

- また、事業実施主体に関する運用を弾力化し、**県は市町村の、市町村は県の基幹事業に関連し、効果促進事業等を実施することを可能に。**

例：県の農地圃場整備に関連して市町村が効果促進事業としてPR事業実施が可能

70

3-5 復興交付金⑤

復興交付金の主な使途と取組(3)

効果促進事業等の一括配分の実施

- 復興まちづくりの根幹をなす5事業(※)には、幅広い関連事業が存在。交付手続の簡素化のため、県及び市町村に、効果促進事業等の予算の一定割合を先渡し。内訳書の提出により、自治体の判断による迅速な事業実施が可能。

- 第5回配分において、県への一括配分を創設。また、一括配分で実施可能な対象事業を限定列挙したポジティブリストを廃止。

(※)漁業集落防災機能強化事業、津波復興拠点整備事業、市街地再開発事業、都市再生区画整理事業、防災集団移転促進事業の5事業

被災地の要望への対応

- そのほか、被災地の負担軽減のため、要望を踏まえて以下の対応を実施。

復興交付金基金の活用

7県と89市町村において復興交付金の受け皿となる基金を設置(26年2月現在)。繰越等の手続なく予算執行が可能。

交付決定前の事業着手

特例的に交付決定前の事業着手が可能(これまで60件活用(26年2月現在))。

事務手続の簡素化

制度創設より申請書類の1/3を廃止するなど、事務手続を大幅に簡素化。

復興交付金の運用の柔軟化

- 復興交付金第5回配分（2013年3月8日）にあわせ、被災地の要望を総点検し、復興のステージの高まりに応じた復興交付金の運用の柔軟化を実施。
 - ① 基幹事業及び効果促進事業等の採択対象の拡大
 - ② 効果促進事業等の使い勝手の向上（例）効果促進事業等の予算額の一定割合を先渡しする一括配分に関し、使途の限定を廃止。


復興交付金の活用実績

○ 住まいの再建への着実な対応


災害公営住宅の整備…累計で2.3万戸分の完成までの事業費を配分(岩手県・宮城県では、供給計画の約9割に対応)
 防災集団移転促進事業…累計で1.2万戸分(※)の移転先団地の事業費を配分(計画されている事業の全ての事業化に対応)
 (※ 一部でも事業費を配分した地区を含む。)

○ 復興のステージの高まりに合わせた多様なニーズへの対応

- ① 商業店舗、宿泊施設等の再建による復興の拠点となる市街地の整備（岩手県大船渡市）
- ② 災害公営住宅団地における小規模店舗スペースや保育施設の整備（岩手県陸前高田市、宮城県多賀城市）
- ③ 防集跡地を含む産業用地の整備（岩手県山田町、宮城県石巻市、東松島市、亶理町）
- ④ 防集事業と農地整備事業の一体的な実施（宮城県山元町）
- ⑤ 震災遺構の保存（岩手県宮古市）



- ④ 防集事業と農地整備事業の一体的な実施（宮城県山元町）



主な市町村におけるこれまでの復興交付金の活用事例(1)

① 岩手県

陸前高田市(配分額:事業費1,479億円)

- 土地区画整理事業(2地区:423億円)
- 防災集団移転促進事業(325億円)
- 災害公営住宅の整備(215億円)
- 復興まちづくりと一体となった道路整備(17事業、93億円)
- 津波復興拠点整備事業(2地区、72億円)
- 水産加工団地等における民間の水産加工場の整備(55億円)
- 園地整備事業(2地区、38億円)
- (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応)
- 土砂仮置き場整備事業(9.1億円)
- 災害公営住宅の下層階への生活利便施設の整備(1.5億円)
- 自治会館の整備(0.7億円)等

大槌町(配分額:事業費923億円)

- 防災集団移転促進事業(263億円)
- 災害公営住宅の整備(250億円)
- 水産加工団地及び民間水産加工場の整備(76億円)
- 復興まちづくりと一体となった道路整備(12事業、35億円)
- (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応)
- 町所有のさけますふ化場等の整備(7億円)
- 災害公営住宅のピロティ部分を駐車場等に整備(0.5億円)
- 中学校仮設運動場の整備(0.2億円)
- 公営住宅長寿命化計画策定(0.1億円)等

釜石市(配分額:事業費1,179億円)

- 災害公営住宅の整備(392億円)
- 土地区画整理事業(4地区、148億円)
- 津波復興拠点整備事業(2地区、98億円)
- 水産加工団地及び民間水産加工場の整備(71億円)
- 復興まちづくりと一体となった道路整備(14事業、60億円)
- (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応)
- 復興拠点における駐車場の整備(6億円)
- 仮設警察署・免許センターの駐車場の整備(2億円)
- 障がい者就労支援施設用地整備(0.7億円)
- 鶴住居地区の復興広場整備(0.6億円)
- 市宮墓地の整備(0.2億円)等

大船渡市(配分額:事業費757億円)

- 災害公営住宅の整備(208億円)
- 防災集団移転促進事業(172億円)
- 復興まちづくりと一体となった道路整備(26事業、97億円)
- 民間の水産加工場整備、製氷施設整備、船揚場の嵩上げ(90億円)
- 津波復興拠点整備事業(42億円)
- 土地区画整理事業(21億円)
- 学校施設関連(公立学校の新増築・統合、保育園の多機能化等、16億円)
- (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応)
- 菌床しいたけ生産施設等の整備(2億円)
- 地盤沈下地域の内水排除のための地盤嵩上げ(2億円)
- 魚市場共用施設(トイレ、シャワー室等)の整備(0.3億円)等

山田町(配分額:事業費964億円)

- 防災集団移転促進事業(350億円)
- 災害公営住宅の整備(120億円)
- 復興まちづくりと一体となった道路整備(19事業、87億円)
- 土地区画整理事業(4地区、80億円)
- 漁業集落防災機能強化事業(2地区、58億円)
- 津波復興拠点整備事業(58億円)
- 民間の水産加工場の整備(29億円)
- (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応)
- 水産加工施設再建に伴う設備導入支援(4億円)
- ボランティア等向けの簡易宿泊施設(トレーラーハウス)整備(0.3億円)
- 流出した砂浜再生に向けた調査(0.1億円)等

宮古市(配分額:事業費720億円)

- 災害公営住宅の整備(184億円)
- 防災集団移転促進事業(161億円)
- 民間の水産加工場の整備、水産物卸売市場の整備(96億円)
- 土地区画整理事業(2地区、54億円)
- 復興まちづくりと一体となった道路整備(16事業、53億円)
- 津波復興拠点整備事業(2地区、20億円)
- (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応)
- 津波遺構保存整備事業(たろう観光ホテル保存)(2億円)
- キャンプ場の復旧整備(5百万円)等

3-5 復興交付金⑧

主な市町村におけるこれまでの復興交付金の活用事例(2)

②宮城県

石巻市(配分額:事業費2,908億円) ○ 災害公営住宅の整備(995億円) ○ 防災集団移転促進事業(563億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(46事業、513億円) ○ 水産加工団地における民間の水産加工場の整備、水産物卸売市場の整備(174億円) ○ 土地区画整理事業(144億円) ○ 下水道事業(16地区、69億円) ○ 漁業集落防災機能強化事業(24地区、5億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 津波被災企業等のための企業用地の整備(24億円) ○ 不登校の児童生徒を対象とした適応指導教室の復旧(0.9億円) ○ 消防署の新築(6億円)等	東松島市(配分額:事業費1,237億円) ○ 防災集団移転促進事業(270億円) ○ 災害公営住宅の整備(199億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(11事業、191億円) ○ 土地区画整理事業(都市計画決定:111.8ha、180億円) ○ 農地の圃場整備や農業用施設等の整備(81億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 防集跡地における企業用地整備(9億円) ○ 埋蔵文化財収蔵庫整備(0.6億円) ○ 排水機場整備完了までの間のポンプ車等借上げ支援(0.2億円)等	山元町(配分額:事業費772億円) ○ 災害公営住宅の整備(149億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(7事業、126億円) ○ 津波復興拠点整備事業(2地区、113億円) ○ 圃場整備(106億円) ○ 防災集団移転促進事業(99億円) ○ いちご栽培用ハウス、関連機械の再建整備(77億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 中浜小学校の遺構としての保存に向けた調査(0.1億円) ○ 子育て拠点関連施設の再建整備(4百万円)等
気仙沼市(配分額:事業費2,300億円) ○ 災害公営住宅の整備(670億円) ○ 防災集団移転促進事業(499億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(42事業、295億円) ○ 水産加工団地における民間の水産加工場整備(230億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 地盤沈下地域の内水排除のための嵩上げ(25億円) ○ 造船関係施設の集約のための用地の整備(15億円) ○ 水産試験場の復旧整備(11億円) ○ 地盤嵩上げのための土砂の仮置場設置(9億円)等	南三陸町(配分額:事業費977億円) ○ 防災集団移転促進事業(345億円) ○ 災害公営住宅の整備(181億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(18事業、112億円) ○ 水産物卸売市場及び民間の水産加工場の整備(71億円) ○ 津波復興拠点整備事業(2地区、70億円) ○ 土地区画整理事業(都市計画決定:60.2ha、26億円) ○ 漁業集落防災機能強化事業(16地区、2億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 漁港施設用地の嵩上げ(15漁港、3億円) ○ シロサケふ化場整備(0.3億円) ○ 子育て支援(保育所等)拠点整備(0.3億円) ○ 水産加工場用地塩水取配水施設整備(0.1億円)等	亶理町(配分額:事業費706億円) ○ 圃場整備(173億円) ○ 災害公営住宅の整備(148億円) ○ いちご栽培用ハウス、関連機械の再建整備(114億円) ○ 防災集団移転促進事業(103億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(8事業、62億円) ○ 農業用施設・機械の整備事業(19億円) ○ 民間の水産加工場の整備(15億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ いちご選果場整備(10億円) ○ 漁具倉庫の整備(2億円) ○ 防集跡地における企業用地整備(0.3億円)等
仙台市(配分額:事業費1,911億円) ○ 災害公営住宅の整備(708億円) ○ 防災集団移転促進事業(554億円) ○ 造成宅地の滑動崩落への対策工事(309億円) ○ 地盤沈下地域の内水排除のための下水道(100億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(3事業、43億円) ○ 農業用施設・機械の整備事業(24億円) ○ 圃場整備(16億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 滑動崩落に起因する土地境界調整への専門家派遣(0.3億円)等	女川町(配分額:事業費976億円) ○ 土地区画整理事業(都市計画決定:226.4ha、244億円) ○ 防災集団移転促進事業(206億円) ○ 災害公営住宅の整備(121億円) ○ 水産加工団地における排水処理施設、水産物卸売市場及び民間の水産加工場の整備(110億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(13事業、107億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 区画整理事業予定地の既設構造物除却、撤去(4億円)等	岩沼市(配分額:事業費700億円) ○ 防災集団移転促進事業(157億円) ○ 排水路・排水機整備事業(3地区、143億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(9事業、142億円) ○ 圃場整備(2地区、84億円) ○ 災害公営住宅の整備(50億円) ○ 農業用施設・機械の整備事業(42億円) ○ 防災緑地などの都市公園整備事業(2地区、26億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 道路整備促進(工事監督支援)(0.5億円)等

3-5 復興交付金⑨

主な市町村におけるこれまでの復興交付金の活用事例(3)

③福島県

いわき市(配分額:事業費1,305億円) ○ 災害公営住宅の整備(476億円) ○ 土地区画整理事業(192億円) ○ 津波防災緑地等の都市公園事業(7地区、163億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(20事業、114億円) ○ 水産物卸売市場等の整備(66億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 水産調査船「いわき丸」の建造(13億円) ○ 被災した集会所の整備(9か所、3億円) ○ いちごのブランド化促進(施設整備、販路拡大等)(0.7億円)等	南相馬市(配分額:事業費529億円) ○ 防災集団移転促進事業(194億円) ○ 災害公営住宅の整備(102億円) ○ 圃場整備(94億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(5事業、32億円) ○ 被災した園芸施設の整備(20億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 復興作業用住居の建設補助(3億円) ○ 新たな農産特産品・加工品の開発、販路開拓等(1億円) ○ 埋蔵文化財収蔵庫整備(1.4億円) ○ 木造の市民交流センターの整備(0.5億円)等
相馬市(配分額:事業費579億円) ○ 防災集団移転促進事業(179億円) ○ 災害公営住宅の整備(83億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(28事業、60億円) ○ 共同利用の水産加工施設等の再建(49億円) ○ 津波防災緑地の整備(1地区、49億円) (その他、以下のようなきめ細かいニーズに対応) ○ 地盤沈下地区の内水排除のための嵩上げ(8億円) ○ 被災者への生活・健康相談支援(2億円)等	新地町(配分額:事業費332億円) ○ 防災集団移転促進事業(94億円) ○ 復興まちづくりと一体となった道路整備(7事業、52億円) ○ 津波防災緑地の整備(2地区、43億円) ○ 災害公営住宅の整備(35億円) ○ 土地区画整理事業(1地区、28億円) ○ 津波復興拠点整備事業(1地区、26億円) ○ 農業用施設・機械の整備事業(2億円)等

※ その他の市町村においても、地域の実情に応じ、以下のような用途にも復興交付金を活用

須賀川市(配分額:事業費82億円) ・災害公営住宅の整備(31億円) ・市街地再開発事業(20億円) ・地震により決壊した藤沼ダム周辺の被災した地域交流拠点の再建(5億円) ・地震により全壊した公益施設(ホール、市民サロン等)の整備(5億円)	白河市(配分額:事業費10億円) ・災害公営住宅の整備(4億円)	飯館村(配分額:事業費9億円) ・原発事故からの避難先での営農再開のための農業施設の整備(5億円) ・災害公営住宅の整備(2億円)
二本松市(配分額:事業費2億円) ・造成宅地の滑動崩落への対策工事(1億円) ・仮設住宅により使用できない運動場の代替施設への照明整備(0.5億円)	楢葉町(配分額:事業費25億円) ・防災集団移転促進事業(1地区、14億円) ・造成宅地の滑動崩落への対策工事(2億円)	川内村(配分額:事業費5億円) ・野菜工場の復興整備(3億円) ・被災した地域間交流施設の修復(2億円)
	川俣町(配分額:事業費0.9億円) ・原発事故により使用できない鶏飼育施設の代替施設の整備(0.6億円)	浪江町(配分額:事業費53億円) ・防災集団移転促進事業(1地区、34億円) ・津波により流失した共同墓地の移転整備(2億円)

※ 総務省まとめ

1 取崩し型復興基金の創設（平成23年度）

東日本大震災からの復興に向けて、被災団体が地域の実情に応じて、住民生活の安定やコミュニティの再生、地域経済の振興・雇用維持等について、単年度予算の枠に縛られずに弾力的かつきめ細かに対応できる資金として、復興基金を創設。

2 復興基金への特別交付税措置（基金の規模）

現在の低金利の状況では従来の運用型基金は有効ではないことから、取崩し型基金により対応することとして、特定被災地方公共団体である9県が基金を設置することとなる場合について、阪神・淡路大震災における措置等を踏まえ、2次補正により増額された既存の特別交付税により措置。

（単位：億円）

青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	栃木県	千葉県	新潟県	長野県	合計
80	420	660	570	140	40	30	10	10	1,960

※ 被災者生活再建支援制度等の阪神・淡路大震災後の制度改正や平成23年度補正予算等で国庫補助対象となったものを除き、措置対象を同レベルとした場合の阪神・淡路大震災復興基金の措置額 960億円程度

3 基金の使途・運用

基金を具体的にどのように使うのか、直営方式・財団方式等のような運用をするかについては、各県の判断に委ねられる。各県においては、きめ細かな事業を実施するという基金の趣旨から、市町村事業に十分に配慮した運用を実施。

4 交付時期

基金の設置について、12月分の特別交付税により措置(平成23年12月14日交付)。

76

※ 総務省まとめ

○東日本大震災に係る「取崩し型復興基金」の各県の活用状況について

（単位：百万円）

県名	基金名	基金規模	特別交付税措置額	復興基金活用額		活用累計額 （①+②）	うち市町村への交付金	備考
				平成23・24年度 （実績額）①	平成25年度 （当初予算）②			
青森県	青森県東日本大震災復興推進基金	8,000	8,000	4,429	1,032	5,461	(4,000)	
岩手県	東日本大震災津波復興基金	42,600	42,000	25,311	6,959	32,271	(21,000)	基金規模には、寄附金を含む
宮城県	東日本大震災復興基金	66,000	66,000	40,968	5,590	46,558	(33,000)	
福島県	福島県原子力災害復興基金	57,000	57,000	32,806	6,780	39,586	(28,500)	
茨城県	茨城県東日本大震災復興基金	15,733	14,000	9,298	1,621	10,919	(7,000)	基金規模には、寄附金を含む
栃木県	栃木県東日本大震災復興推進基金	4,000	4,000	2,520	725	3,245	(2,000)	
千葉県	千葉県東日本大震災市町村復興基金	3,000	3,000	2,000	0	2,000	(2,000)	H25.6月補正で市町村への交付金1,000百万円を計上予定
新潟県	（公財）新潟県中越地震復興基金	1,000	1,000	577	273	850	(500)	財団において特別会計を設置
長野県	長野県栄村復興基金	1,000	1,000	92	500	592	(592)	金額栄村に交付予定
合計		198,333	196,000	118,001	23,480	141,482	(98,592)	

○復興基金からの市町村交付金の活用状況について

（単位：百万円）

県名	交付金事業名	市町村交付金額 （既交付額）	交付金活用額		活用累計額 （①+②）	備考
			平成23・24年度 （実績額）①	平成25年度 （当初予算）②		
青森県	青森県東日本大震災復興推進交付金	4,000	404	726	1,130	活用額には一部寄附金等を含む
岩手県	東日本大震災津波復興基金市町村交付金	21,000	3,909	3,785	7,694	活用額には一部寄附金等を含む
宮城県	東日本大震災復興基金交付金	33,000	4,951	6,261	11,212	活用額には一部寄附金等を含む
福島県	福島県市町村復興支援交付金	28,500	4,475	7,714	12,189	
茨城県	市町村復興まちづくり支援事業費交付金	7,000	2,972	1,753	4,725	
栃木県	東日本大震災復興推進事業交付金	2,000	557	580	1,137	
千葉県	「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金	2,000	877	502	1,379	県のH25.6月補正に市町村への交付金1,000百万円を交付予定
新潟県	東日本大震災復興事業交付金	500	210	178	388	
長野県	長野県栄村復興交付金	592	92	146	238	
合計		98,592	18,447	21,645	40,091	

※ 復興基金を活用した市町村への交付金を受けて、市町村が基金を設けるなどしたうえで復興事業を執行。

※ 総務省まとめ

「取崩し型復興基金」を活用した主な事業（県）	
<p>【市町村向け交付金】（986億円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域の实情に応じた復興事業を実施するための市町村交付金 <p>【生活支援】（30億円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○被災者の心の健康の保持増進を図るための相談支援 ○仮設住宅における防犯ボランティアへの支援 ○仮設住宅の共同利用施設の維持管理費への補助 ○被災地域の集会所等のコミュニティ施設の再建支援 など <p>【住宅対策】（50億円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○災害救助法等の対象とされない被災住宅の補修等への支援 ○融資が困難な被災者の宅地復旧工事等への支援 など <p>【教育文化対策】（30億円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○私立学校・私立博物館等の災害復旧に対する支援 ○部活動に必要な備品の購入や施設の修繕等に対する支援 ○被災地における芸術・文化活動に対する支援 など 	<p>【産業復興・地域振興対策】（160億円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○被災商店街の復興支援や地域産業再生のための販路開拓支援 ○被災中小企業の早期復興のための経営相談等による支援 ○小規模農地や補助対象外の農林水産業施設の復旧に対する支援 ○早期の経営再開のために必要なウニ、アワビ等の種苗や代替家畜等の導入支援 ○被災農業者向けの農林業復興等に関する研修等への支援 ○被災者の就業支援や事業主の雇用維持に対する支援 ○被災地の観光振興に対する支援 など <p>【融資への利子補給】（110億円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○県の復興融資を利用した中小企業に対する利子補給 ○経営再建のための融資を活用した被災農林漁業者に対する利子補給 ○二重住宅ローンを抱える被災者に対する利子補給 など <p>【その他】（40億円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○被災者自らが主体となって実施する復興関連の地域づくり事業への支援 ○震災周年追悼・記念行事開催への支援 ○震災の記録・教訓の伝承や展示 など

復興基金からの市町村交付金を活用した事業例（市町村）	
<p>【生活支援における事業例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○被災した市民等に必要な生活支援等の情報を発信する災害情報誌の発行、避難住民に対する広報誌の郵送 ○仮設住宅や避難者居住地区周辺の安全確保のための防犯灯の設置 ○避難者受入自治体における交流会の開催 ○仮設住宅での見守り活動等を実施する災害ボランティアセンターの運営費補助 ○被災地域で新規に開業する診療所に対する開業費用の支援 ○地区集会施設の復旧等に対する支援 ○被災した私道の復旧に対する支援 	<p>【住宅対策における事業例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○一部損壊住宅の修繕、畳・襖・瓦の入替え等災害救助法適用外経費の支援 <p>【教育文化対策における事業例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○被災した児童福祉施設等における各種備品の整備 ○通学用のバス乗車券の購入補助 ○被災を受けた学校や仮設住宅を巡回する移動図書館の運営 ○青少年のスポーツの練習場所の確保のための移動費支援 <p>【産業復興・地域振興対策における事業例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○仮設店舗で開催される被災商店街の復興イベント等に対する助成 ○被災農業者向けの苗木の購入等の支援

津波被災地域の住民の定着促進（平成24年度補正予算により措置：1,047億円）

津波による被災地域において安定的な生活基盤(住まい)の形成に資する施策を通じて住民の定着を促し、復興まちづくりを推進する観点から、被災団体が、地域の实情に応じて弾力的かつきめ細かに対応することができるよう、被災県の復興基金の積立て等について、震災復興特別交付税の増額により措置。


- 対象住宅数：40,738棟
津波により被災（全壊）した持ち家住宅のうち防災集団移転促進事業等の対象とならないもの

- 対象経費：住宅再建支援に要する経費
 - ①土地区画整理事業等の対象外の住宅（32,184棟）分
：282万円（住宅建築に係る利子相当額、宅地の高上げ経費（1/2）、移転経費）
 - ②土地区画整理事業等の対象の住宅（8,554棟）分
：163万円（住宅建築に係る利子相当額、移転経費）

※ 被災者への具体的な支援内容については、被災団体が地域の实情に応じて決定

- 交付額

【再建パターンと支援策】

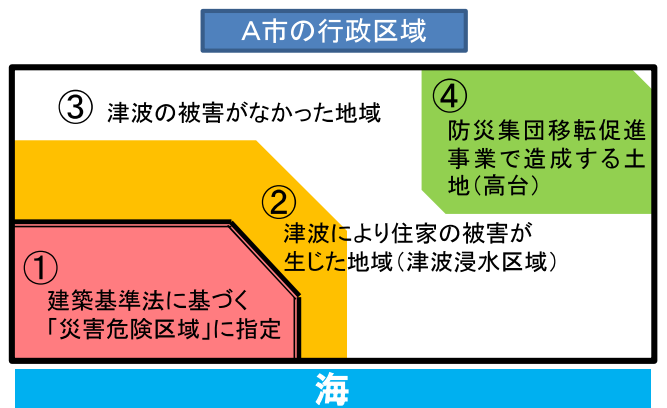

①→②～④の移転：防災集団移転促進事業等による支援あり（被災土地買上げ、住宅建築・土地購入利子補給、移転経費助成）

②における現地再建、②→③、④の移転：上記支援措置なし

（単位：億円）

青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	千葉県	合計
5	215	709	103	5	11	1,047

※ 平成24年度3月分の震災復興特別交付税により措置（平成25年3月25日交付）




（平成24年3月31日施行）（平成25年5月10日改正）

目的・基本理念・国の責務

- ・原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島復興・再生について、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ推進。
- ・基本理念として、安心して暮らし子どもを生み育てる環境の実現、多様な住民の意見の尊重、地域経済の活性化、福島の地域社会の絆の維持及び再生、住民一人一人が災害を乗り越え豊かな人生を送ること、福島の地方公共団体の自主性・自立性の尊重、地域コミュニティの維持、正確な情報の提供など。

福島復興再生基本方針（閣議決定）



福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置

避難者・帰還者に対する生活の安定を図るための措置、保健・医療・福祉にわたる総合的な措置、再生可能エネルギーの開発等のための財政上の措置、復興交付金その他財政上の措置の活用、住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置 など。

原子力災害からの福島復興再生協議会

復興大臣、福島県知事その他の関係者からなる協議会を組織

その他（見直しの検討）

施行後3年以内に、課税の特例を含め、法律の規定を見直し



（平成24年7月13日閣議決定）

＜第1部 原子力災害からの福島の復興及び再生＞

第1 原子力災害からの福島の復興及び再生の意義及び目標に関する事項

- 1 意義 ～「福島の再生なくして、日本の再生なし」～
- 2 目標
- 3 基本理念・基本姿勢

＜第2部 避難解除等区域の復興及び再生＞

第2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

- 1 避難解除等区域の復興及び再生の道すじ
- 2 政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
- 3 課税の特例
- 4 住居の安定確保
- 5 将来的な住民の帰還を目指す地域の復興及び再生に向けた準備のための取組
- 6 避難解除等区域復興再生計画の策定手続き

＜第3部 福島全域の復興及び再生＞

第3 安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

第4 産業の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

第5 産業復興再生計画の認定に関する基本的な事項

第6 先導的な施策への取組の重点的な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

第7 重点推進計画の認定に関する基本的な事項

第8 関連する東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関する基本的な事項

第9 その他福島の復興及び再生に関し必要な事項

福島復興再生特別措置法と各計画等の関係


福島復興再生特別措置法

(平成24年3月31日施行) (平成25年5月10日改正)


福島復興再生基本方針

(平成24年7月13日閣議決定)

即して作成

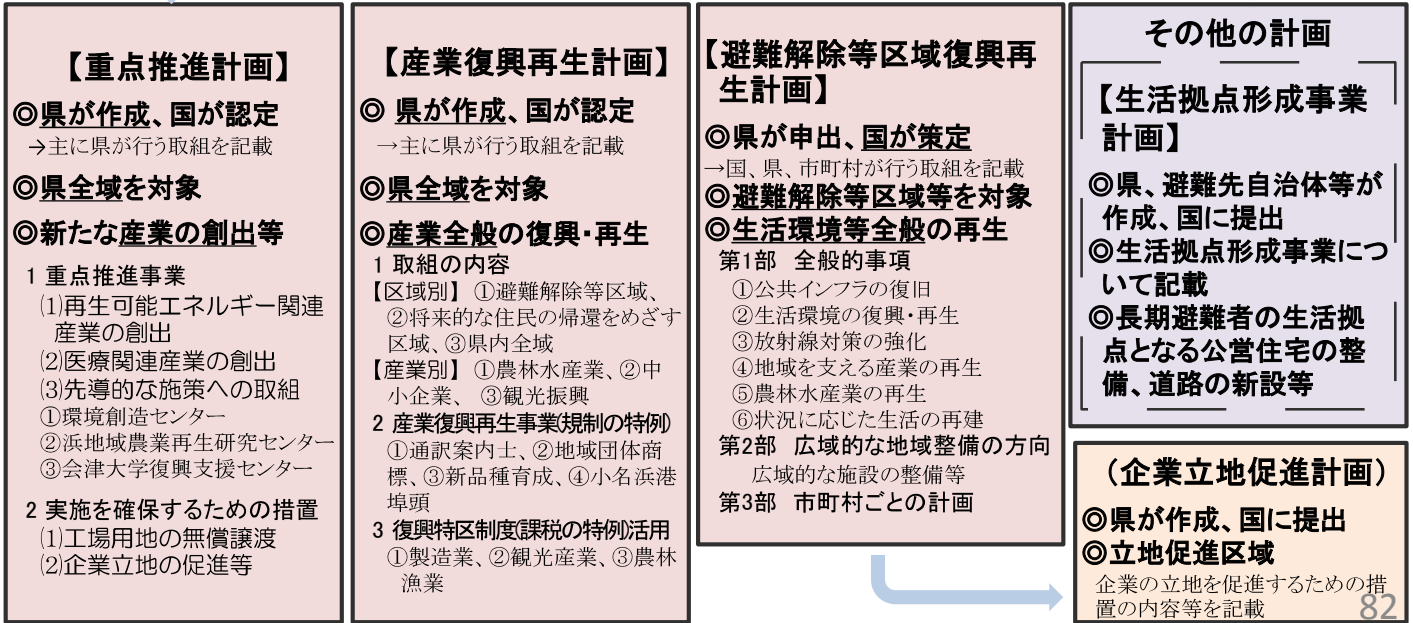

(平成24年6月27日施行)

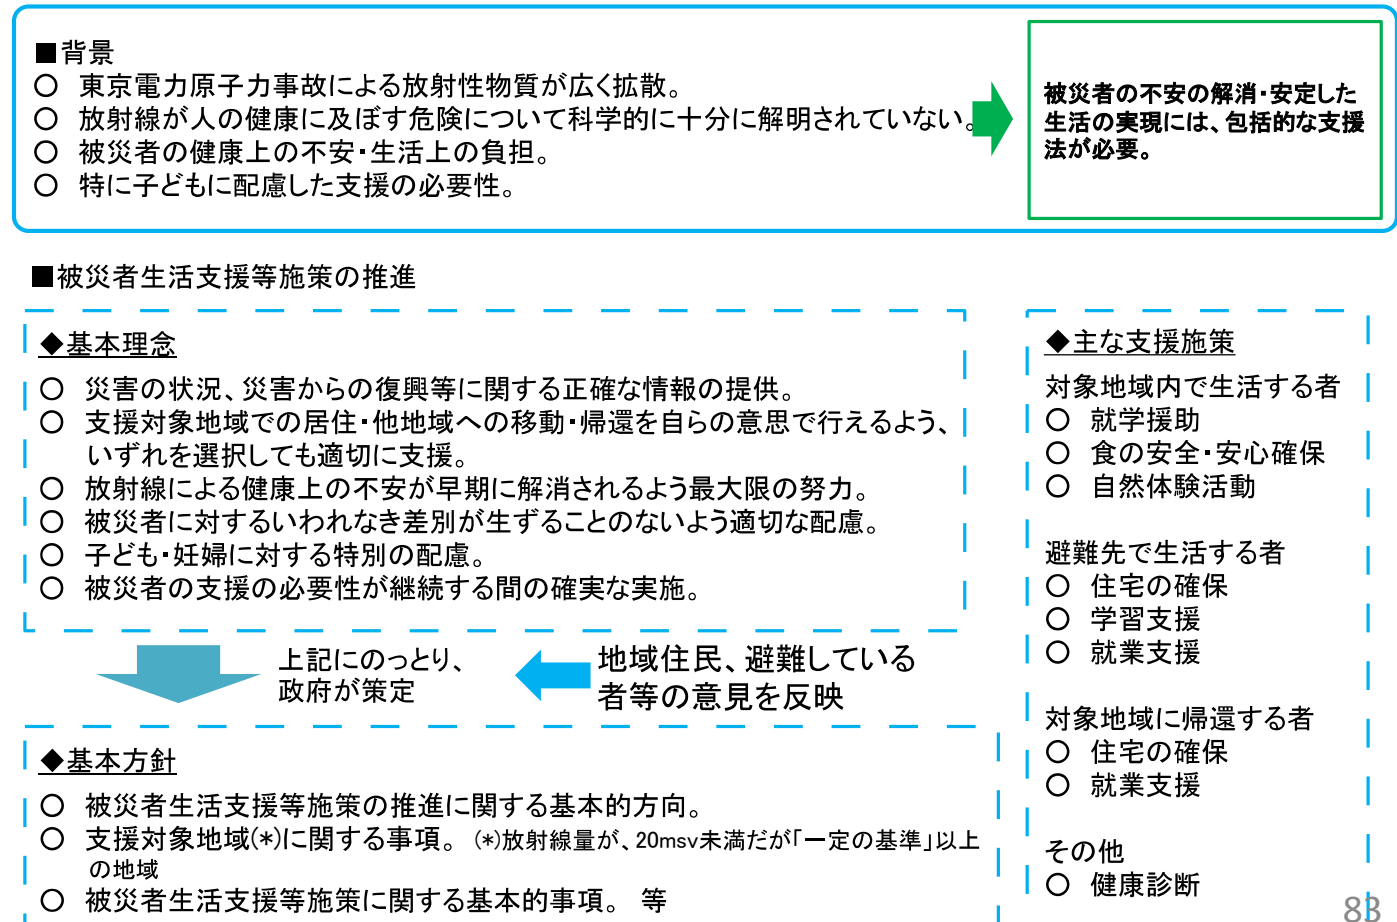

ポイント

支援の対象地域については、法第8条に基づく「支援対象地域」に加え、支援対象地域より広い地域で支援を実施するため、施策ごとの趣旨目的に応じて「準支援対象地域」を設定し、きめ細かな被災者支援を実施。

1 施策推進の基本的方向性

放射線による健康不安を感じている被災者や、それに伴い生活上の負担が生じている被災者に対し、基本方針に基づく支援により、被災者が安心して生活できるようにする。


2 支援の対象地域

(1) 支援対象地域

原発事故発生後、相当な線量が広がっていた福島県中通り・浜通り（避難指示区域等を除く）を法第8条に基づく「支援対象地域」とする。

(2) 準支援対象地域

支援対象地域以外の地域に、支援対象地域より広い地域で支援を実施するため、施策ごとの趣旨目的に応じて「準支援対象地域」を定める。

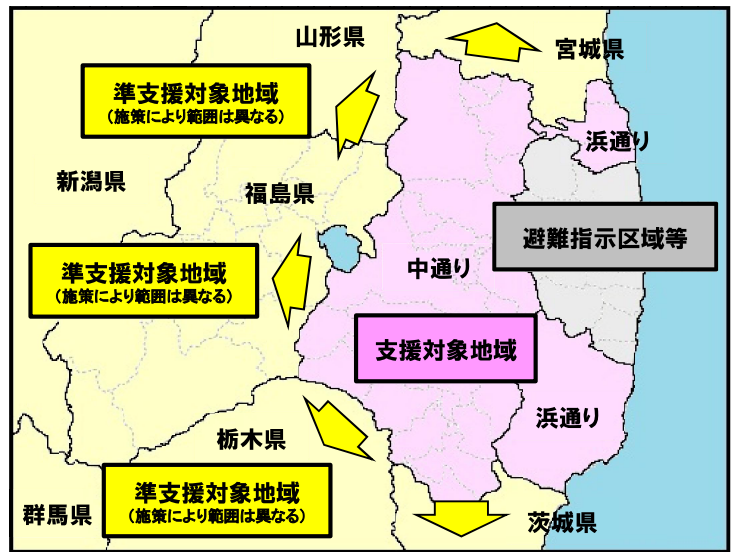

※「準支援対象地域」は、施策ごとに設定

3 施策の基本的事項

被災者支援施策パッケージ（平成25年3月15日発表）に盛り込んだ施策のほか、福島近隣県を含めた外部被ばく状況の把握、自然体験活動、民間団体を活用した被災者支援といった施策について拡充・検討予定。⁸⁴

3-8 これまでの主な動き

【平成23年】

- 3月11日 東日本大震災発災
 - ・緊急災害対策本部発足
- 3月17日 被災者生活支援特別対策本部（支援チーム）設置
- 5月2日 東日本大震災財特法成立
 - 第1次補正予算成立（復興経費4兆153億円）
- 6月24日 復興基本法施行
- 6月25日 東日本大震災復興構想会議「復興への提言」提出
- 6月28日 東日本大震災復興対策本部（第1回）開催
- 7月25日 第2次補正予算成立（復興経費1兆9,106億円）
- 7月29日 「復興基本方針」策定
- 8月5日 原発避難者特例法成立
- 8月26日 各府省の事業計画と工程表のとりまとめ（第1回）
- 8月27日 原子力災害からの福島復興再生協議会（第1回）開催
- 11月21日 第3次補正予算成立（復興経費9兆2,438億円）
- 11月30日 復興財源確保法成立
- 12月7日 復興特別区域法成立
- 12月9日 復興庁設置法成立

【平成24年】

- 2月9日 復興推進計画第1号認定（岩手、宮城）
- 2月10日 復興庁開庁
- 3月2日 復興交付金の交付可能額通知（第1回目）
- 3月5日 東日本大震災事業者再生支援機構始業開始
- 3月30日 福島復興再生特別措置法成立
- 4月5日 平成24年度当初予算成立（復興経費3兆7,754億円）
- 6月21日 子ども・被災者支援法成立
- 7月13日 福島復興再生基本方針閣議決定
- 9月24日 被災地域の原子力被災者・自治体に対する国の取組方針（グランドデザイン）の公表
- 11月22日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告

【平成25年】

- 1月29日 復旧・復興事業の規模と財源の見直し
 - ・19兆円を25兆円に見直し
- 2月1日 福島復興再生総局を設置
- 2月6日 復興推進委員会平成24年度審議報告
- 2月26日 平成24年度補正予算成立（復興経費3,177億円）
- 3月7日 「住まいの復興工程表」公表
- 3月15日 「原子力災害による被災者支援策パッケージ」公表
- 4月2日 「原子力災害による風評被害を含む影響への対策パッケージ」公表
- 5月10日 福島復興再生特別措置法の改正
- 5月15日 平成25年度当初予算成立（復興経費4兆3,840億円）
- 6月5日 復興推進委員会
 - 「新しい東北」の創造に向けて（中間とりまとめ）
- 8月7日 避難区域の見直しが完了
- 10月11日 子ども・被災者支援法基本方針 閣議決定・国会報告
- 11月12日 東日本大震災からの復興の状況に関する国会報告
- 12月20日 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」閣議決定
- 12月24日 平成26年度当初予算案閣議決定（復興経費3兆6,464億円）

【平成26年】

- 2月6日 平成25年度補正予算成立（復興経費5,638億円）
- 5月1日 東日本大震災復興特別区域法の改正
