


全国健康保険協会システム
基盤・ハードウェア開発業務一式
(間接業務システム関係)
仕様書 別紙

別 紙 目 次

- 別紙1 全国健康保険協会システム全体構成概要
- 別紙2 全国健康保険協会システム開発全体工程表
- 別紙3 全国健康保険協会システム開発作業体制表

全国健康保険協会システム全体構成概要

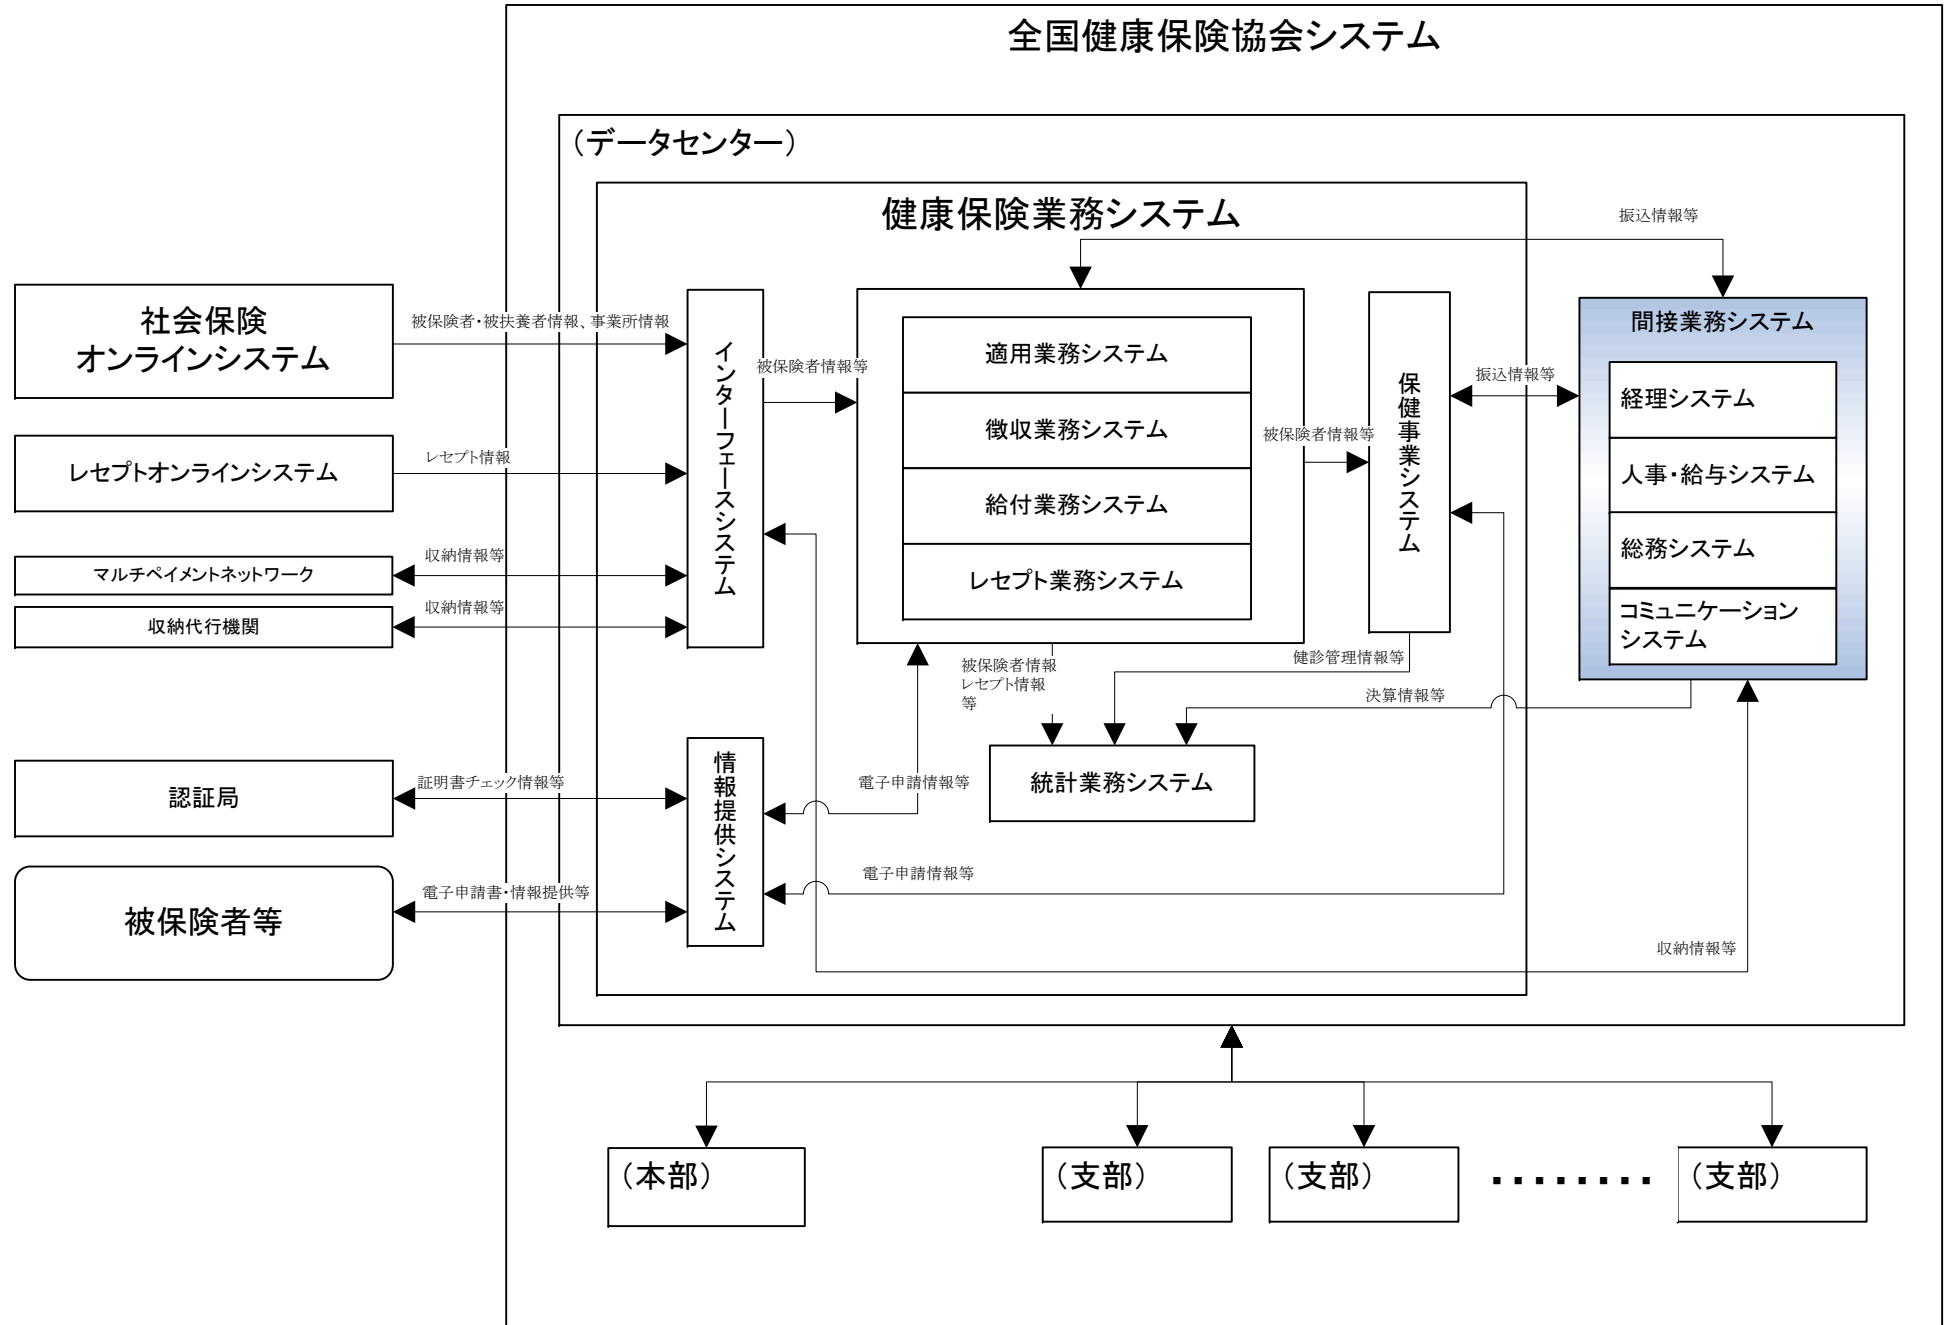

全国健康保険協会システム開発全体工程表

		平成18年度					平成19年度												平成20年度									
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
工程管理		工程管理																										
システム開発	健康保険業務システム ・適用業務システム ・徴収業務システム ・給付業務システム ・レセプト業務システム ・統計業務システム ・情報提供システム ・インタフェースシステム						基本設計 <small>ハードウェア/ソフトウェア要件定義</small>		詳細設計			開発/単体テスト						結合テスト			総合テスト 外部連携テスト			システム移行 <small>本番運用リハール</small>				
	・保健事業システム ※						基本設計		詳細設計			開発/単体テスト			結合テスト			総合テスト 外部連携テスト			システム移行 <small>本番運用リハール</small>							
	間接業務システム ・経理システム等						基本設計		詳細設計			開発/単体テスト			結合テスト			総合テスト 外部連携テスト			システム移行 <small>本番運用リハール</small>							
基盤・ハードウェア	健康保険業務システム関係						基本設計		詳細設計			環境構築			業務疎通													
	間接業務システム関係											基本設計			詳細設計			環境構築			業務疎通			総合テスト		システム移行		
	データセンタ								配線工事等			(ハード搬入・環境構築)																
	WAN回線																	回線準備			回線導入							
	端末機器																				端末納入準備			端末導入				
教育訓練												教育訓練計画策定			教育訓練準備 (インストラク養成等)			教育訓練実施(本部/支部)										
システム移行							システム移行計画策定		システム移行設計/システム移行手順策定/緊急時対応計画策定												システム移行							
移行	① 社会保険オンラインシステム						基本設計・詳細設計		移行プログラム開発/単体テスト			移行プログラム結合テスト			移行プログラム総合(外部連動)テスト			本番データ投入・検証		本番運用リハール		本番データ差分反映						
	② 現在システムで管理されていない紙管理データ						基本設計・詳細設計		移行プログラム開発/単体テスト			移行プログラム結合テスト			移行プログラム総合(外部連動)テスト			本番データ投入・検証		本番運用リハール		本番データ差分反映						

本番運用

本件の調達範囲

※ 保健事業システムの開発、移行等のスケジュールについては財団健診システムの状況を踏まえ、別途検討する。

全国健康保険協会システム開発作業体制表

◎:作業主体者として作業を実施するとともにその結果と品質に責任を負う者。
 ○の者に対しては、作業指示を行うとともに作業を監督する。
 ○:◎からの指示に従い、作業を実施する者。
 △:必要に応じて、◎に情報提供を行うか◎の作業結果を確認する者。

作業項目	SLOP-JCF98での規定アクティビティ	健康保険業務システム開発業者	間接業務システム開発業者	健康保険業務システム基盤・ハードウェア開発業者	間接業務システム基盤・ハードウェア開発業者	データセンター提供業者	WAN回線提供業者	端末機器導入業者	データ移行業者	社会保険庁・工程管理業者
工程管理										
プロジェクト管理										
システム全体監督	1.2.4-1.2.7									◎
個別管理	1.2.4-1.2.7.2.1.1-2.2.6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
進捗・品質管理										
システム全体監督	1.2.5-6.3.1.1-5									◎
個別管理・対応	2.3.1-2.6.3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
共通課題管理(インターフェースや運用・保守に関するもの等関係者をまたがる課題)										
管理	2.6.1-2.6.2									◎
対応案検討、対応	2.6.1-3.2.8.1-2	◎	○	○	○	○	○	○	○	
個別課題管理										
システム全体監督	2.6.1-2.6.2									◎
管理、対応案検討、対応	2.6.1-3.2.8.1-2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
本番運用リハーサル計画策定、実施管理	1.5.2	○	○	○	○				○	◎
システム開発										
健康保険業務										
基本設計、詳細設計、開発/単体テスト、結合テスト	1.3.4,1.4.1-10	◎								
総合テスト/外部連携テスト、本番運用リハーサル	1.4.11-14.1.5.1-2	◎		○						
開発・テスト環境構築	3.2.1-2	◎								
間接業務										
基本設計、詳細設計、開発/単体テスト、結合テスト	1.3.4,1.4.1-10		◎							
総合テスト/外部連携テスト、本番運用リハーサル	1.4.11-14.1.5.1-2		◎		○					
開発・テスト環境構築	3.2.1-2		◎							
健康保険業務-間接業務インターフェース										
要件定義(運用要件、性能要件、インターフェース方式)	1.3.4,1.4.2-3	◎	○							
基本設計、詳細設計、インターフェース開発/単体テスト、結合テスト										
健康保険業務	1.4.4-10	◎								
間接業務	1.4.4-10		◎							
総合テスト/外部連携テスト、本番運用リハーサル	1.4.11-14.1.5.1-2	◎	○	△	△					
運用・保守										
要件定義、運用・保守業務設計										
健康保険業務	1.4.2-3.1.4.5-6.3.2.1	◎								
間接業務	1.4.2-3.1.4.5-6.3.2.1		◎							
基盤、協会システム全体とりまとめ	1.4.2-3.1.4.5-6.3.2.1			◎	◎					
運用・保守作業										
基盤・ハードウェア等の保守				◎	◎				○	
基盤・ハードウェア										
データセンター										
健康保険業務										
要件定義(運用要件、性能要件)	1.4.2-3.1.4.5-6.3.2.1	◎								
基本設計、詳細設計(本番環境、保守環境)	3.2.1	△		◎						
環境構築・動作確認										
基盤	3.2.2,1.4.11-12.2.2.5			◎		△				
本番環境、保守環境	3.2.2,1.4.11-12.2.2.5	◎		◎		△				
間接業務										
要件定義(運用要件、性能要件)	1.4.2-3.1.4.5-6.3.2.1		◎							
基本設計、詳細設計(本番環境、保守環境)	3.2.1		△		◎					
環境構築・動作確認										
基盤	3.2.2,1.4.11-12.2.2.5			◎		△				
本番環境、保守環境	3.2.2,1.4.11-12.2.2.5		◎		◎	△				
基盤・ハードウェアの運用										
基本設計、詳細設計、環境構築・動作確認、業務疎通、総合テスト	1.4.5-14	○	○	◎	◎					
本番運用リハーサル	1.5.1-2			◎	◎					
ネットワーク、端末										
要件定義(運用要件、性能要件)										
健康保険業務	1.4.2-3.1.4.5-6.3.2.1	◎		△						
間接業務	1.4.2-3.1.4.5-6.3.2.1		◎		△					
基本設計、詳細設計、環境構築・動作確認、業務疎通、総合テスト	3.2.1-2,1.4.11-12			◎	△		○	○		
教育訓練										
教育訓練計画策定、マニュアル・研修教材作成、研修環境構築、インストラクタ養成、教育訓練実施支援										
健康保険業務	1.4.4,1.4.6,1.4.14,1.5.1,1.5.5,1.6.1,3.4.1-3.4.4	◎								
間接業務	1.4.4,1.4.6,1.4.14,1.5.1,1.5.5,1.6.1,3.4.1-3.4.4		◎							
基盤・運用	1.4.4,1.4.6,1.4.14,1.5.1,1.5.5,1.6.1,3.4.1-3.4.4			◎	◎					
システム移行										
システム移行計画、システム移行設計、システム移行手順策定(本番稼働準備)、緊急対応時計画策定										
健康保険業務	1.5.1,1.6.1	◎		○						
間接業務	1.5.1,1.6.1		◎		○					
基盤・運用	1.5.1,1.6.1			◎	◎					
システム移行実施(本番稼働準備、システム切り替え、業務切り替え)	1.5.3,1.6.5	◎	○	○	○					
データ移行										
移行対象データの識別										
健康保険業務	1.6.1	◎								
移行要件定義、データ移行方式設計、移行プログラム設計・開発・結合テスト・外部連携テスト、移行対象データ抽出・変換・加工・検証、本番データ投入・検証、本番データ差分反映	1.6.5	△	◎	△	△				◎	
