

別紙1

全体スケジュール


平成28年4月

厚生労働省年金局事業管理課システム室

別紙1 全体スケジュール(平成28年5月時点での想定)

留意事項: 下記に作業イメージを示すが、本受託者は、本調達における各成果物の納入期日及び履行期限に留意の上、実施計画書を作成し、日本年金機構との調整を経て実施スケジュールを確定するものとする。

なお、履行期限は本仕様書中の想定スケジュールに沿ったものであり、本受託者は、機構と協議のうえ、履行期限を超えて実施する場合がある。

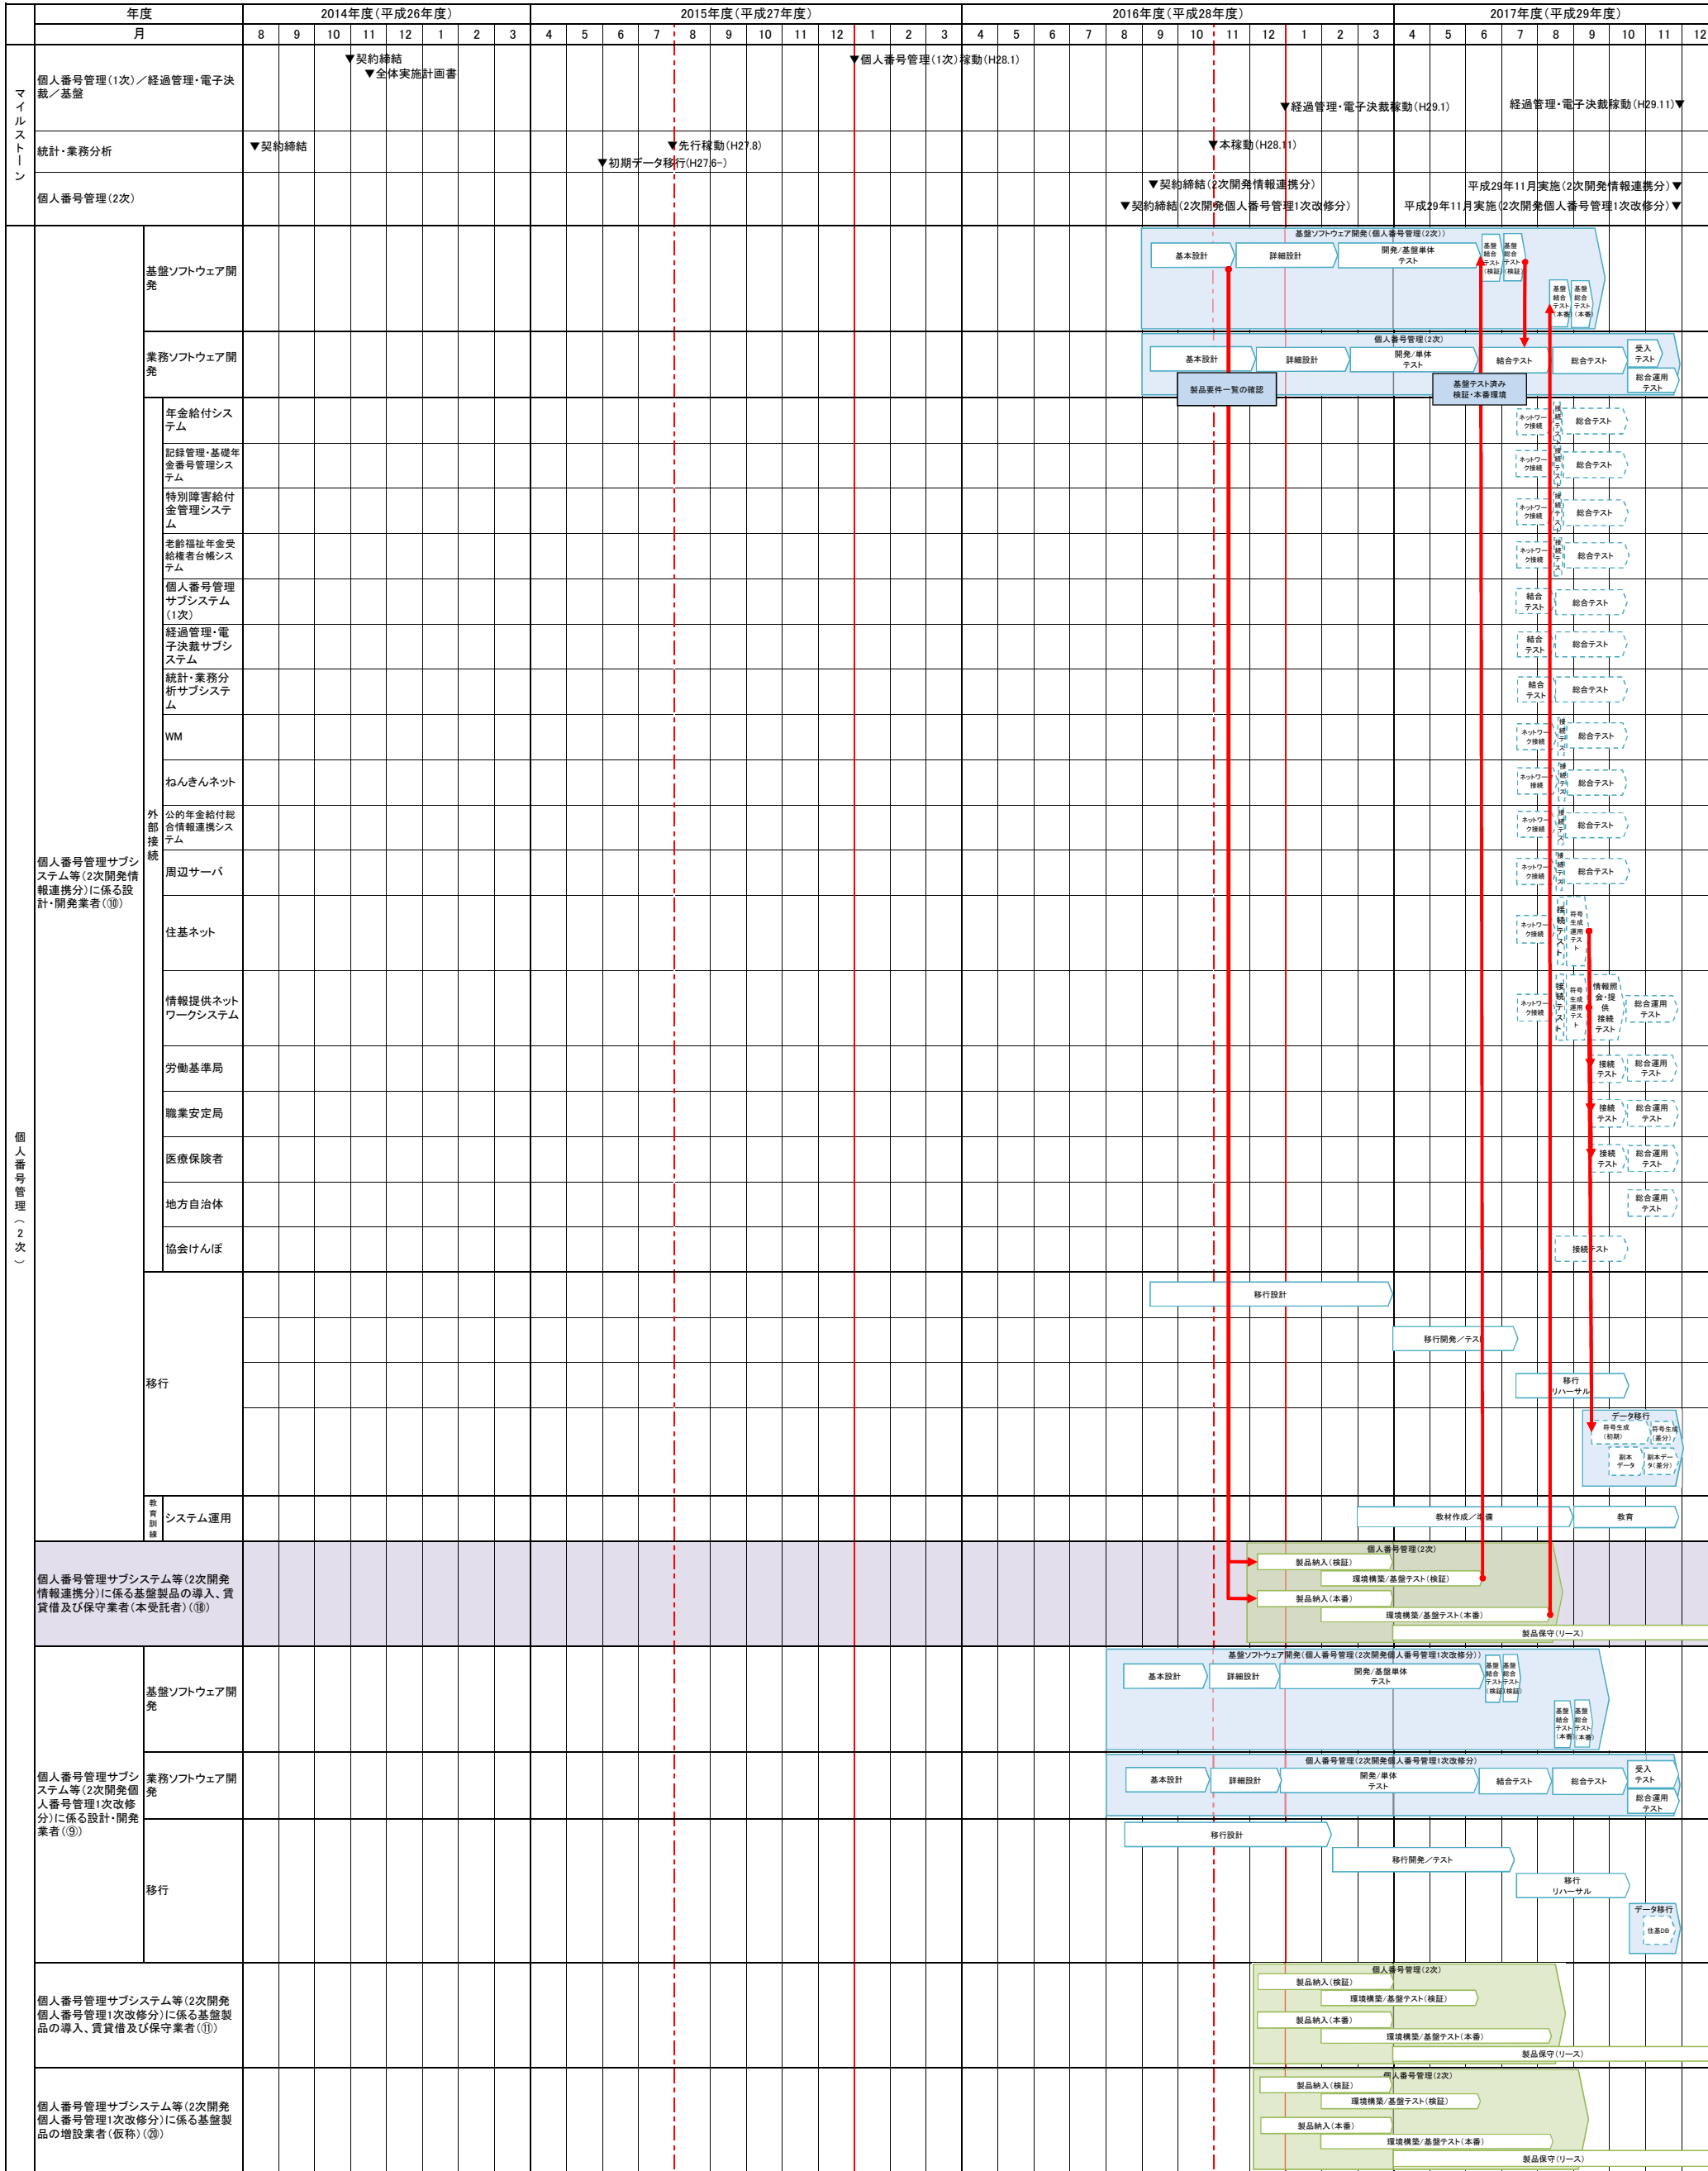

別紙1 全体スケジュール(平成28年5月時点での想定)

留意事項: 下記に作業イメージを示すが、本受託者は、本調達における各成果物の納入期日及び履行期限に留意の上、実施計画書を作成し、日本年金機構との調整を経て実施スケジュールを確定するものとする。
 なお、履行期限は本仕様書中の想定スケジュールに沿ったものであり、本受託者は、機構と協議のうえ、履行期限を超えて実施する場合があります。

年度	2014年度(平成26年度)				2015年度(平成27年度)								2016年度(平成28年度)				2017年度(平成29年度)											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
マイルストーン	個人番号管理(1次)／経過管理・電子決裁／基盤	▼契約締結				▼個人番号管理(1次)稼動(H28.1)								▼経過管理・電子決裁稼動(H29.1)				経過管理・電子決裁稼動(H29.11)▼										
	統計・業務分析	▼契約締結				▼先行稼動(H27.8)								▼本稼動(H28.11)														
	個人番号管理(2次)					▼初期データ移行(H27.6~)								▼契約締結(2次開発情報連携分)				▼契約締結(2次開発個人番号管理1次改修分)										
個人番号管理(1次)／経過管理・電子決裁／基盤	基盤ソフトウェア開発	基本設計				製品確定影響取込								基盤結合テスト				基盤結合テスト										
	業務ソフトウェア開発	基本設計				基盤ソフトウェア開発(経過管理・電子決裁)								基盤結合テスト				基盤結合テスト										
	経過管理・電子決裁、個人番号管理(1次)、基盤サブシステムに係る設計・開発等業者(②)	環境構築(検証)				環境構築/基盤テスト(検証)								環境構築/基盤テスト(検証)				環境構築/基盤テスト(検証)										
	環境構築(経過管理・電子決裁)	環境設計(本番)				環境設計(検証)								環境構築/基盤テスト(本番)				環境構築/基盤テスト(本番)										
	本番移行	移行計画(統計本稼働向け)				移行計画(個人番号管理1次)								移行計画(経過管理・電子決裁)				移行計画(経過管理・電子決裁)										
	保守	運用マニュアル作成・テスト(個人番号管理(1次))				個人番号管理(1次)保守								経過管理・電子決裁保守				個人番号管理(1次)、経過管理・電子決裁保守										
個人番号管理サブシステム(1次)及び基盤サブシステムに係る設計・開発等業者(⑦)	経過管理・電子決裁サブシステム(個人番号対応等)に係る設計・開発等業者(⑦)					基本設計								詳細設計				経過管理・電子決裁										
	業務ソフトウェア開発					基本設計(修正)								経過管理・電子決裁				結合テスト										
	個人番号管理サブシステム(1次)及び基盤サブシステムに係る基盤製品の導入、賃貸借及び保守業者(③)	環境設計				製品納入(検証)								環境構築/基盤テスト(検証)				環境構築/基盤テスト(検証)										
	経過管理・電子決裁サブシステムに係る基盤製品の導入、賃貸借及び保守業者(④)	環境設計				環境設計/製品納入(検証)								環境構築/基盤テスト(検証)				環境構築/基盤テスト(検証)										
既存システム	年金給付システム													基本設計				詳細設計										
	記録管理システム													基本設計/詳細設計/開発/単体テスト/結合テスト/総合テスト/受入テスト				基本設計/詳細設計/開発/単体テスト/結合テスト/総合テスト/受入テスト										
統計・業務分析	開発	要件定義書/基本設計書の確認				基本設計等								先行稼動				先行稼動										
	環境構築	基本設計等(製品の要求仕様確定に関するもの)				本稼動								詳細設計				本稼動										
	先行・本稼動	移行実施計画、移行手順、システム整備(開発、テスト、リハーサル)				移行実施計画、移行手順、システム整備(開発、テスト)								移行実施計画、移行手順、システム整備(開発、テスト)				移行実施計画、移行手順、システム整備(開発、テスト)										
	運用・保守	運用・保守(先行稼動)				運用・保守(先行稼動)								運用・保守(先行稼動)				運用・保守(先行稼動)										
	統計・業務分析サブシステムに係る基盤製品の導入、賃貸借及び保守業者(本稼働)(⑥)	製品納入(本稼働)				環境構築/基盤ソフト連携テスト(本稼働)								環境構築/基盤ソフト連携テスト(本稼働)				製品保守(リース)(本稼働)										
運用管理	共通運用管理業者	H28.1~H28.12(⑫)				引き継ぎ								共通運用管理(個人番号管理(1次)、統計・業務分析)				共通運用管理(個人番号管理(1次)、経過管理・電子決裁、統計・業務分析)										
	共通運用管理業者	H29.1~(⑬)												引き継ぎ				共通運用管理(個人番号管理(1次)、経過管理・電子決裁、統計・業務分析)										
保守	個人番号管理サブシステム(1次・2次)及び経過管理・電子決裁サブシステムに係る保守業者(⑧)	H30.1~																引き継ぎ										
	統計・業務分析サブシステムに係る保守業者	H28.1~H28.10(⑭)				引き継ぎ								統計・業務分析(先行稼動)保守				統計・業務分析(先行・本稼働)保守										
保守	統計・業務分析サブシステムに係る保守業者	H28.11~(⑮)												引き継ぎ				統計・業務分析(先行・本稼働)保守										

※各業者の末尾にある()内の番号は、調達仕様書「表 2.1-1 関連する調達の概要」の案件番号を参照のこと。
